

Descripción productos y casos de uso



INDICE

A. Descripción productos


B. Casos de uso



A. Descripción productos

Finalcad Activity Diary


Con




Finalcad Live



Finalcad Activity Diary Permite compartir información sobre las actividades diarias de la obra, de forma muy sencilla, en todo momento y en tiempo real, desde cualquier herramienta móvil como tablets o smartphones.

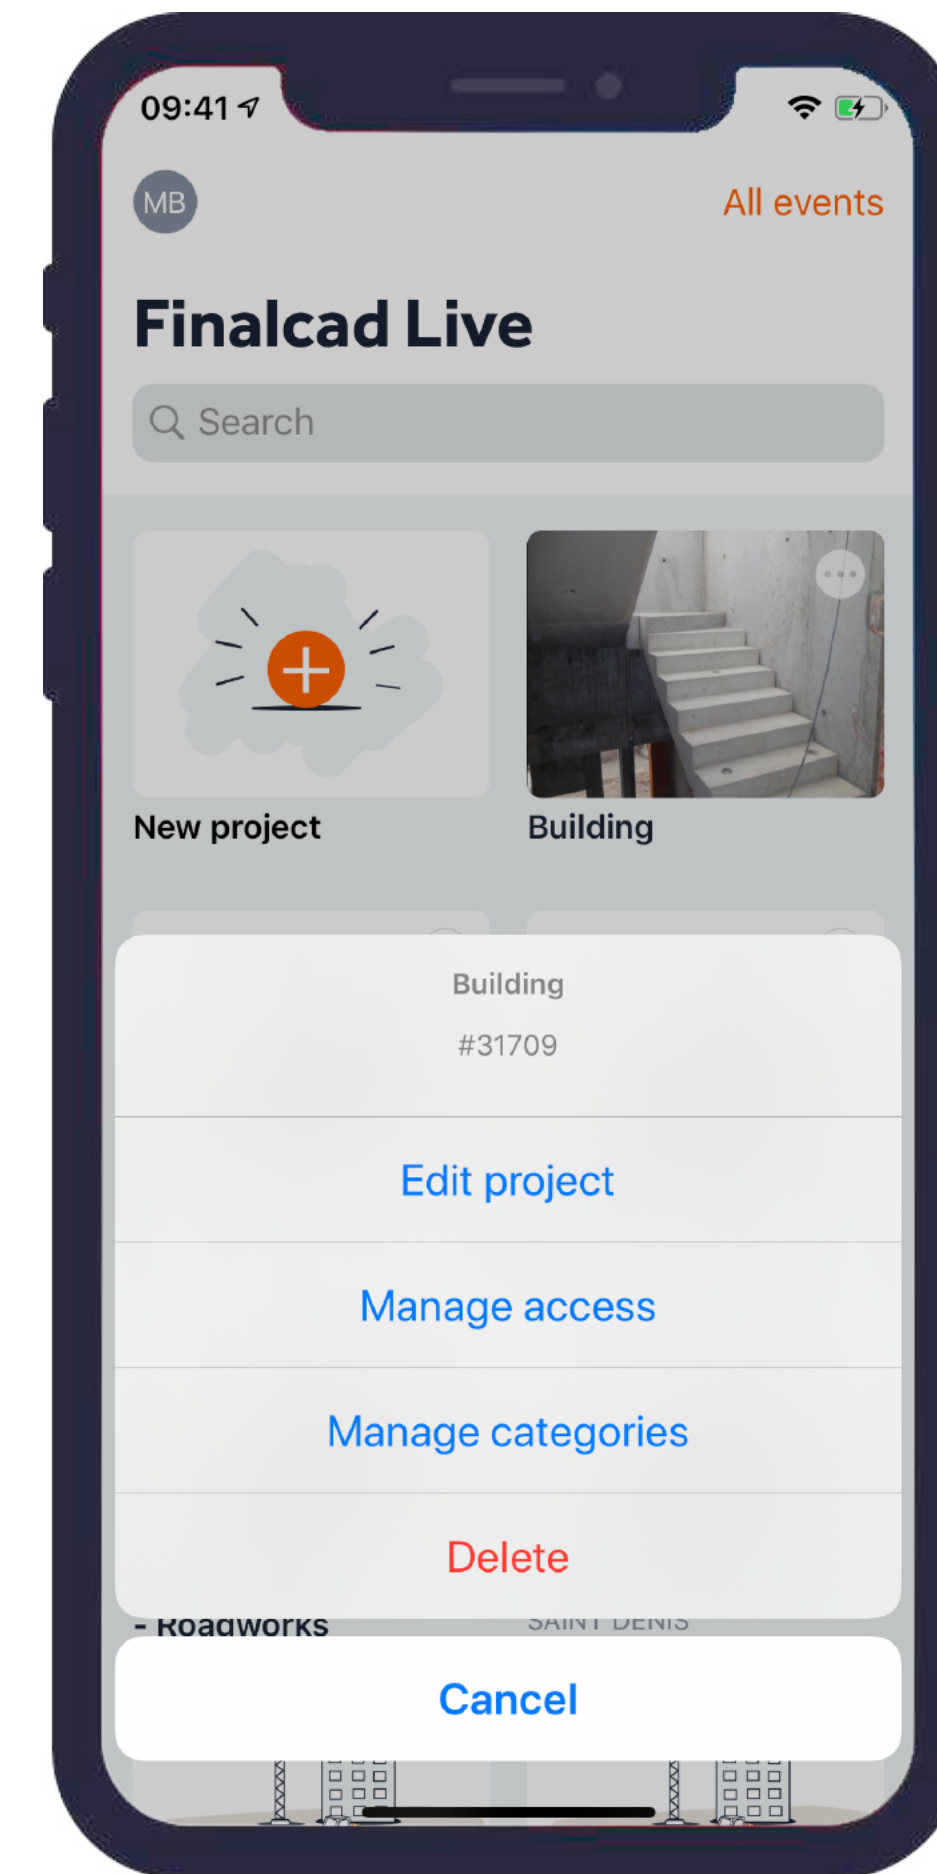

Activity Diary

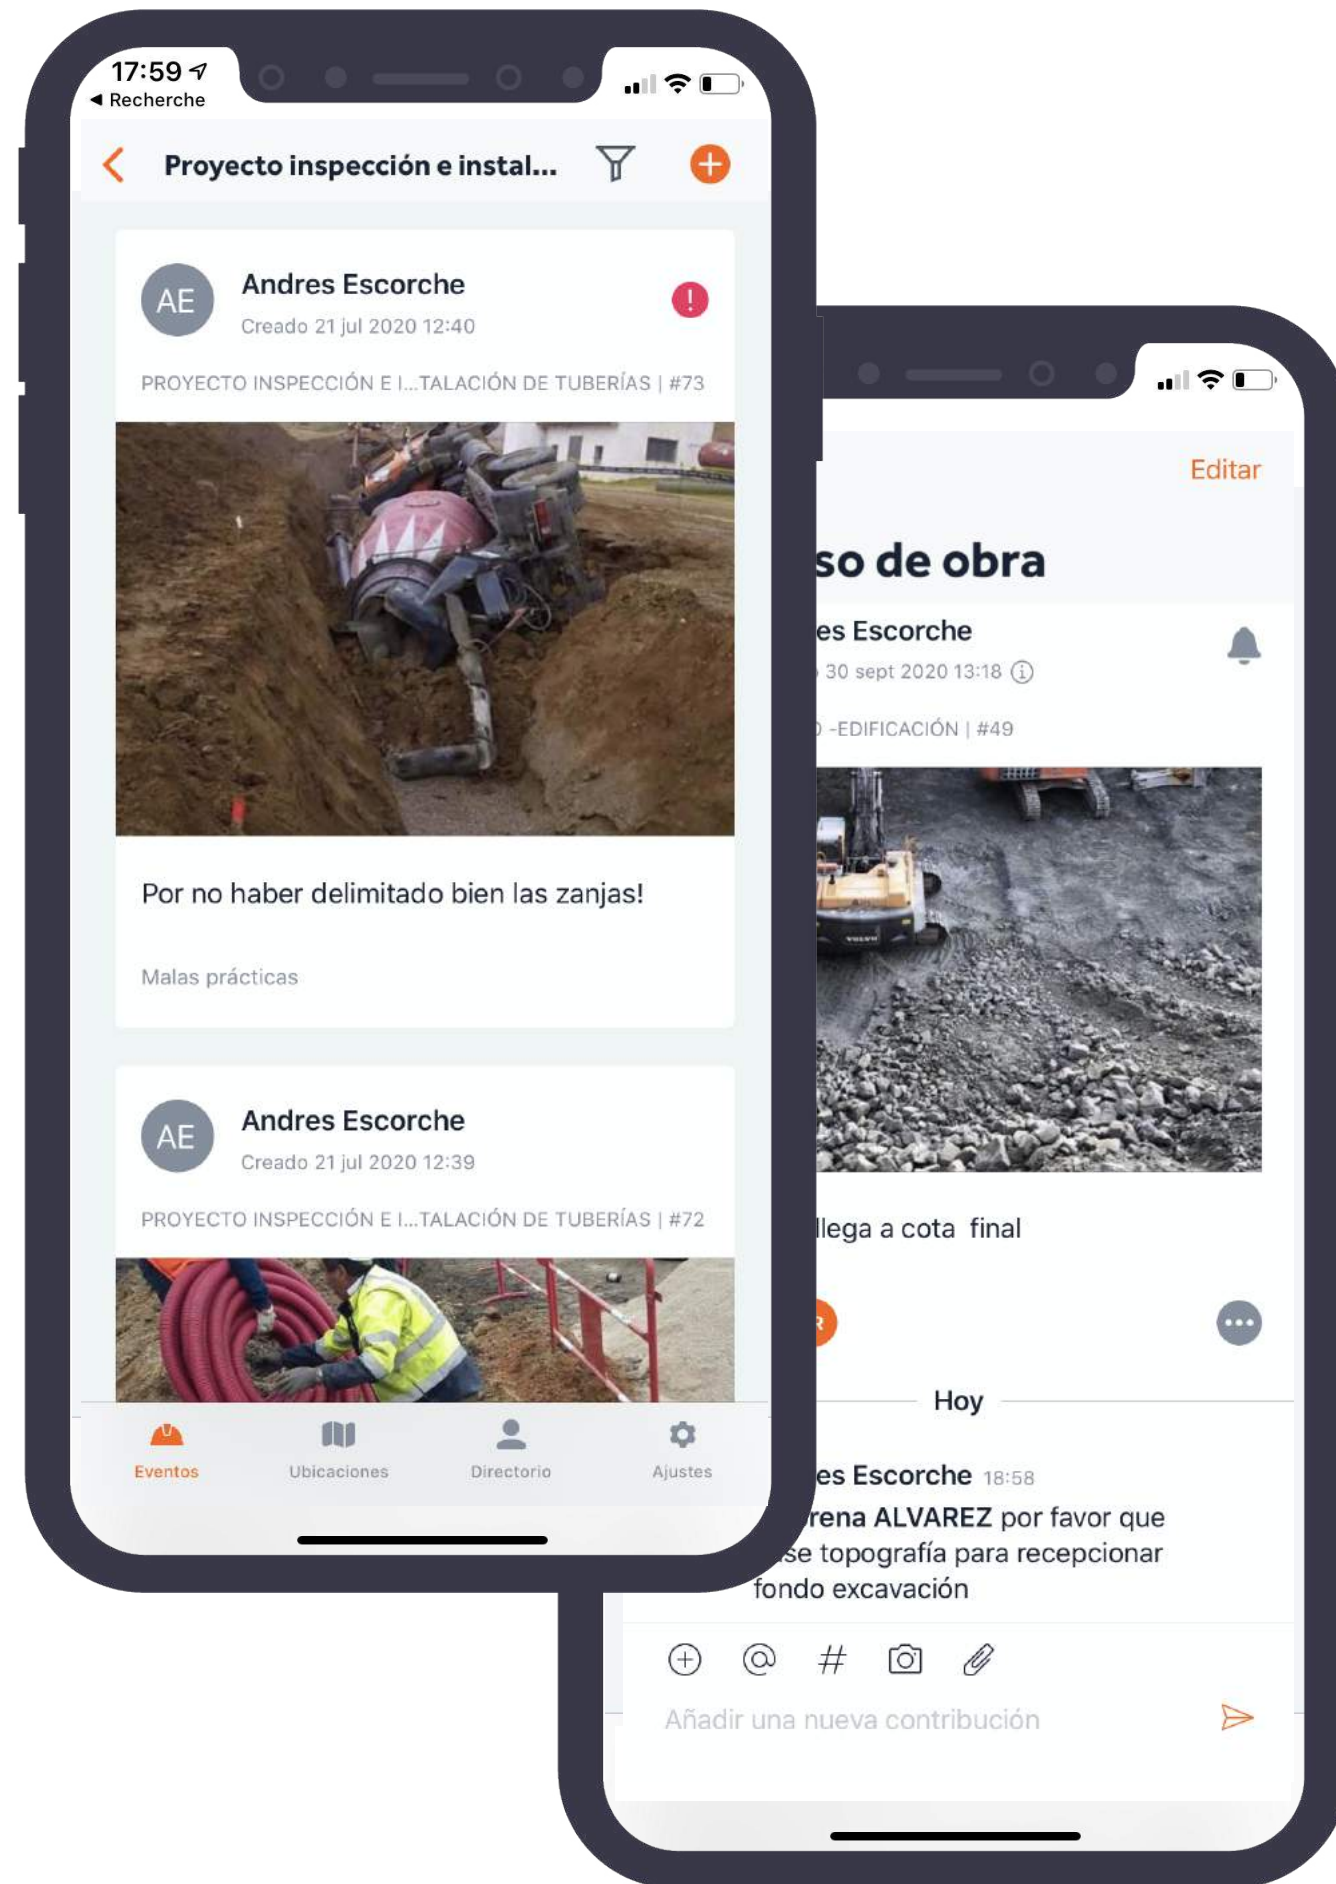

Registro de eventos



Informes

Registre cualquier evento en Finalcad Live en 2 toques

Comparta automáticamente fotos geolocalizadas y con fecha

Complemente su evento con una fotografia

Agregue una categoría para cada evento y familia

Comparta las condiciones climáticas

Notifique a sus compañeros de equipo y agregue hashtags

Invite a nuevos colaboradores y controle sus niveles de permiso de visualización

Genere informes PDF automáticos o bajo demanda



Transparencia

Único

canal de comunicación formalizado para informar a todos los equipos

Productividad

-1 hora

dedicada por día para informes y llamadas telefónicas

Visibilidad del avance

En tiempo real

Siga el avance de su proyecto ejecutado por la constructora

« Antes, nos faltaba tener un histórico. Creo que es importante guardar la información, y compartir la experiencia con la empresa. »

Fabien, Ingeniero de obra, Fayat


Finalcad

Forms: Quality, Safety & more

Con




Finalcad




Finalcad Live



Finalcad Forms permite digitalizar cualquier tipo de formulario de calidad, QSE o parte de trabajo propio a su proyecto para facilitar su ejecución insitu

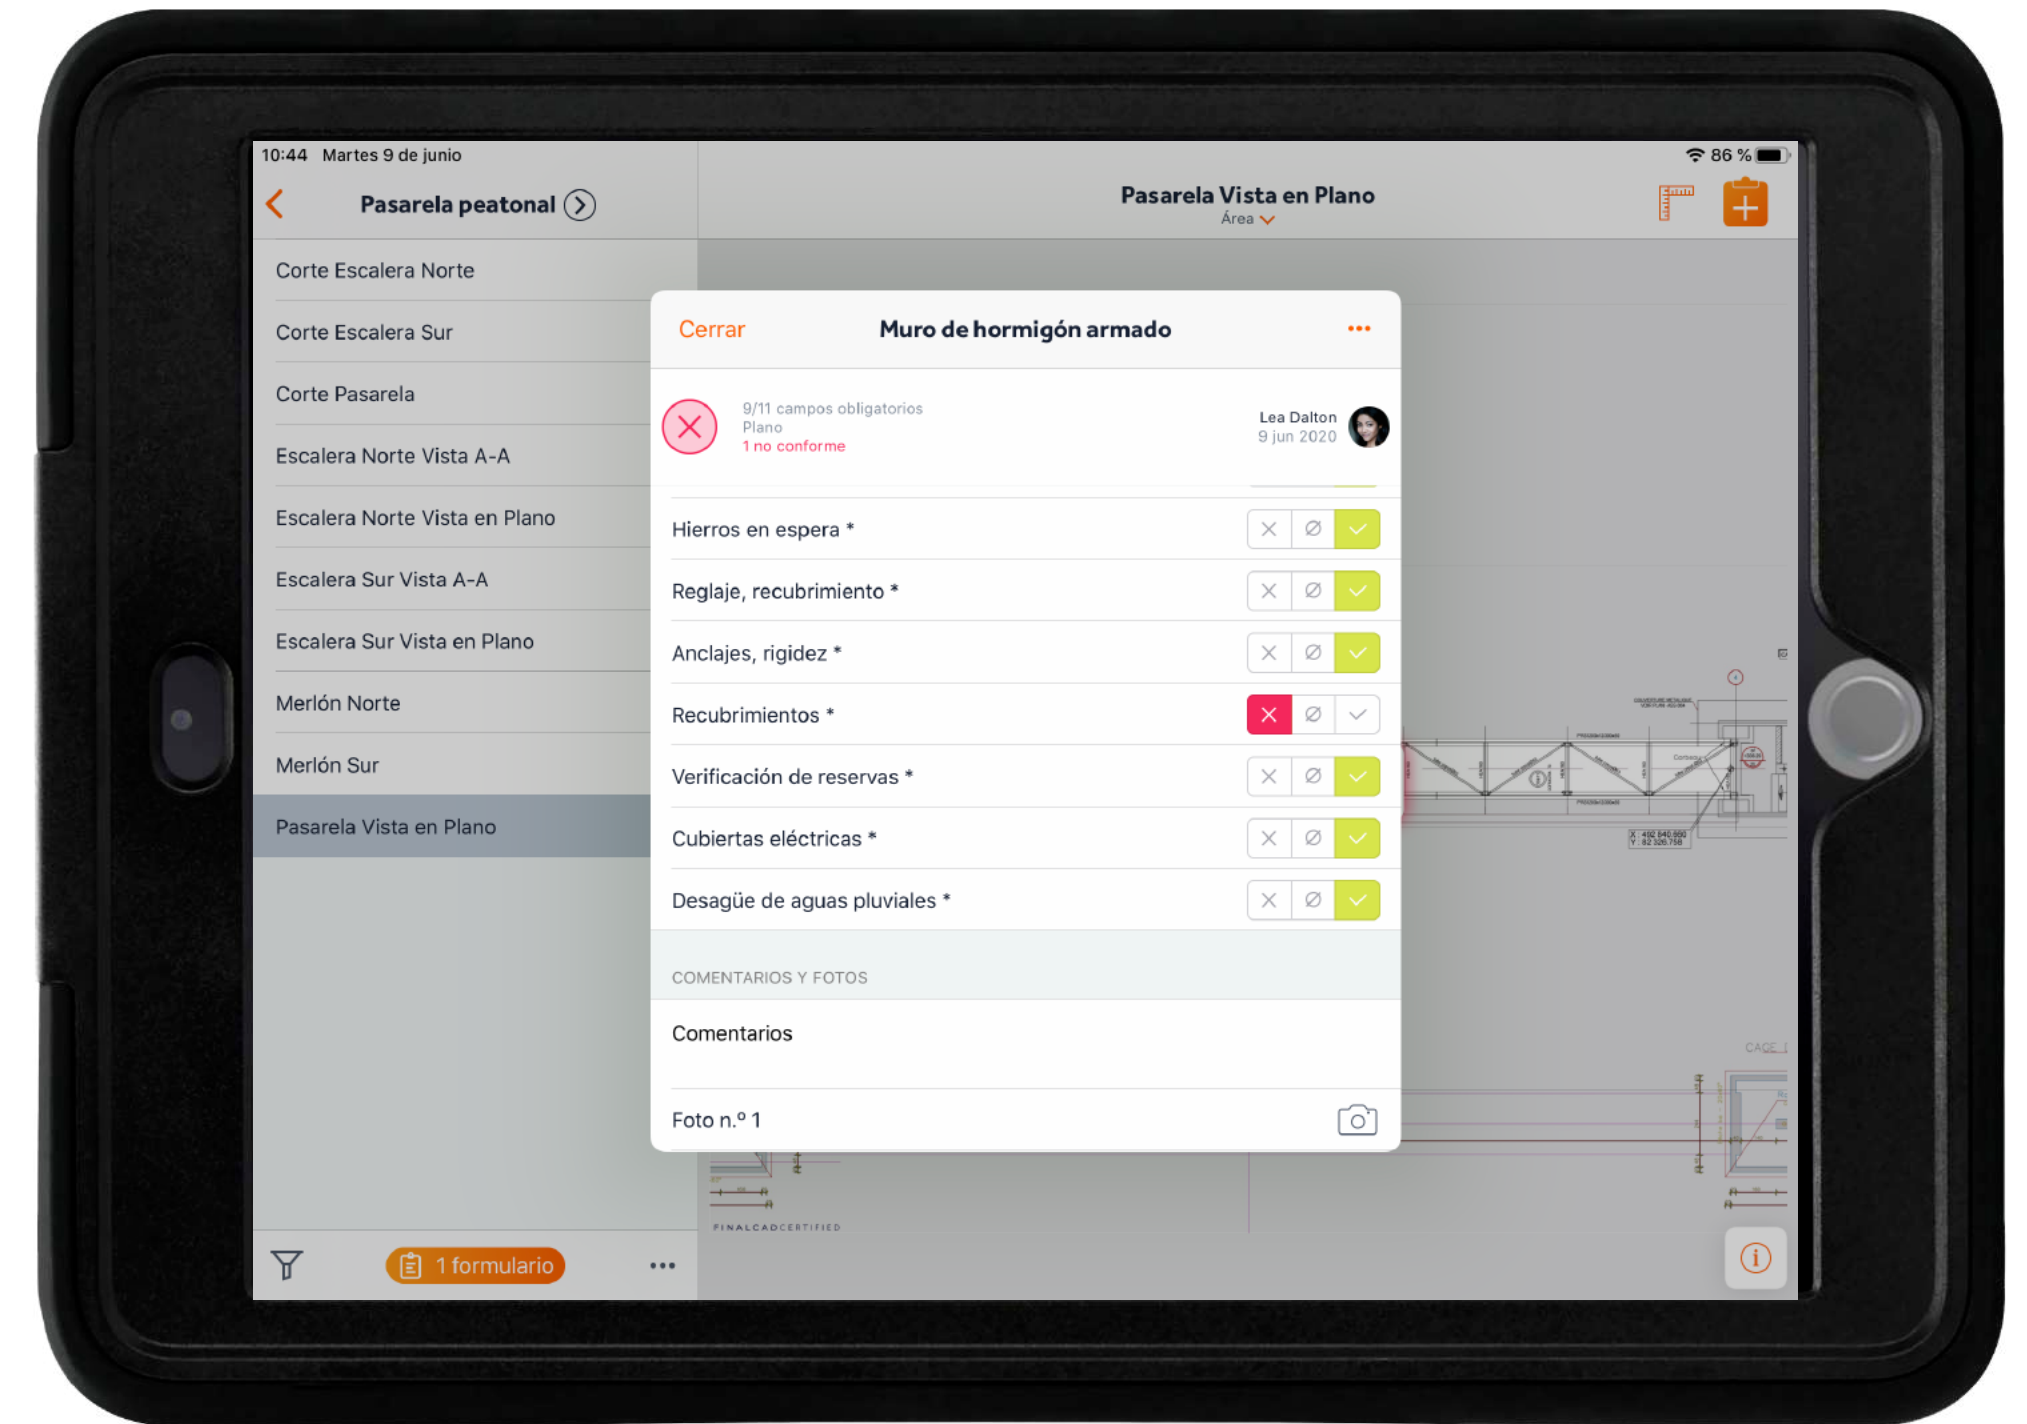

Forms

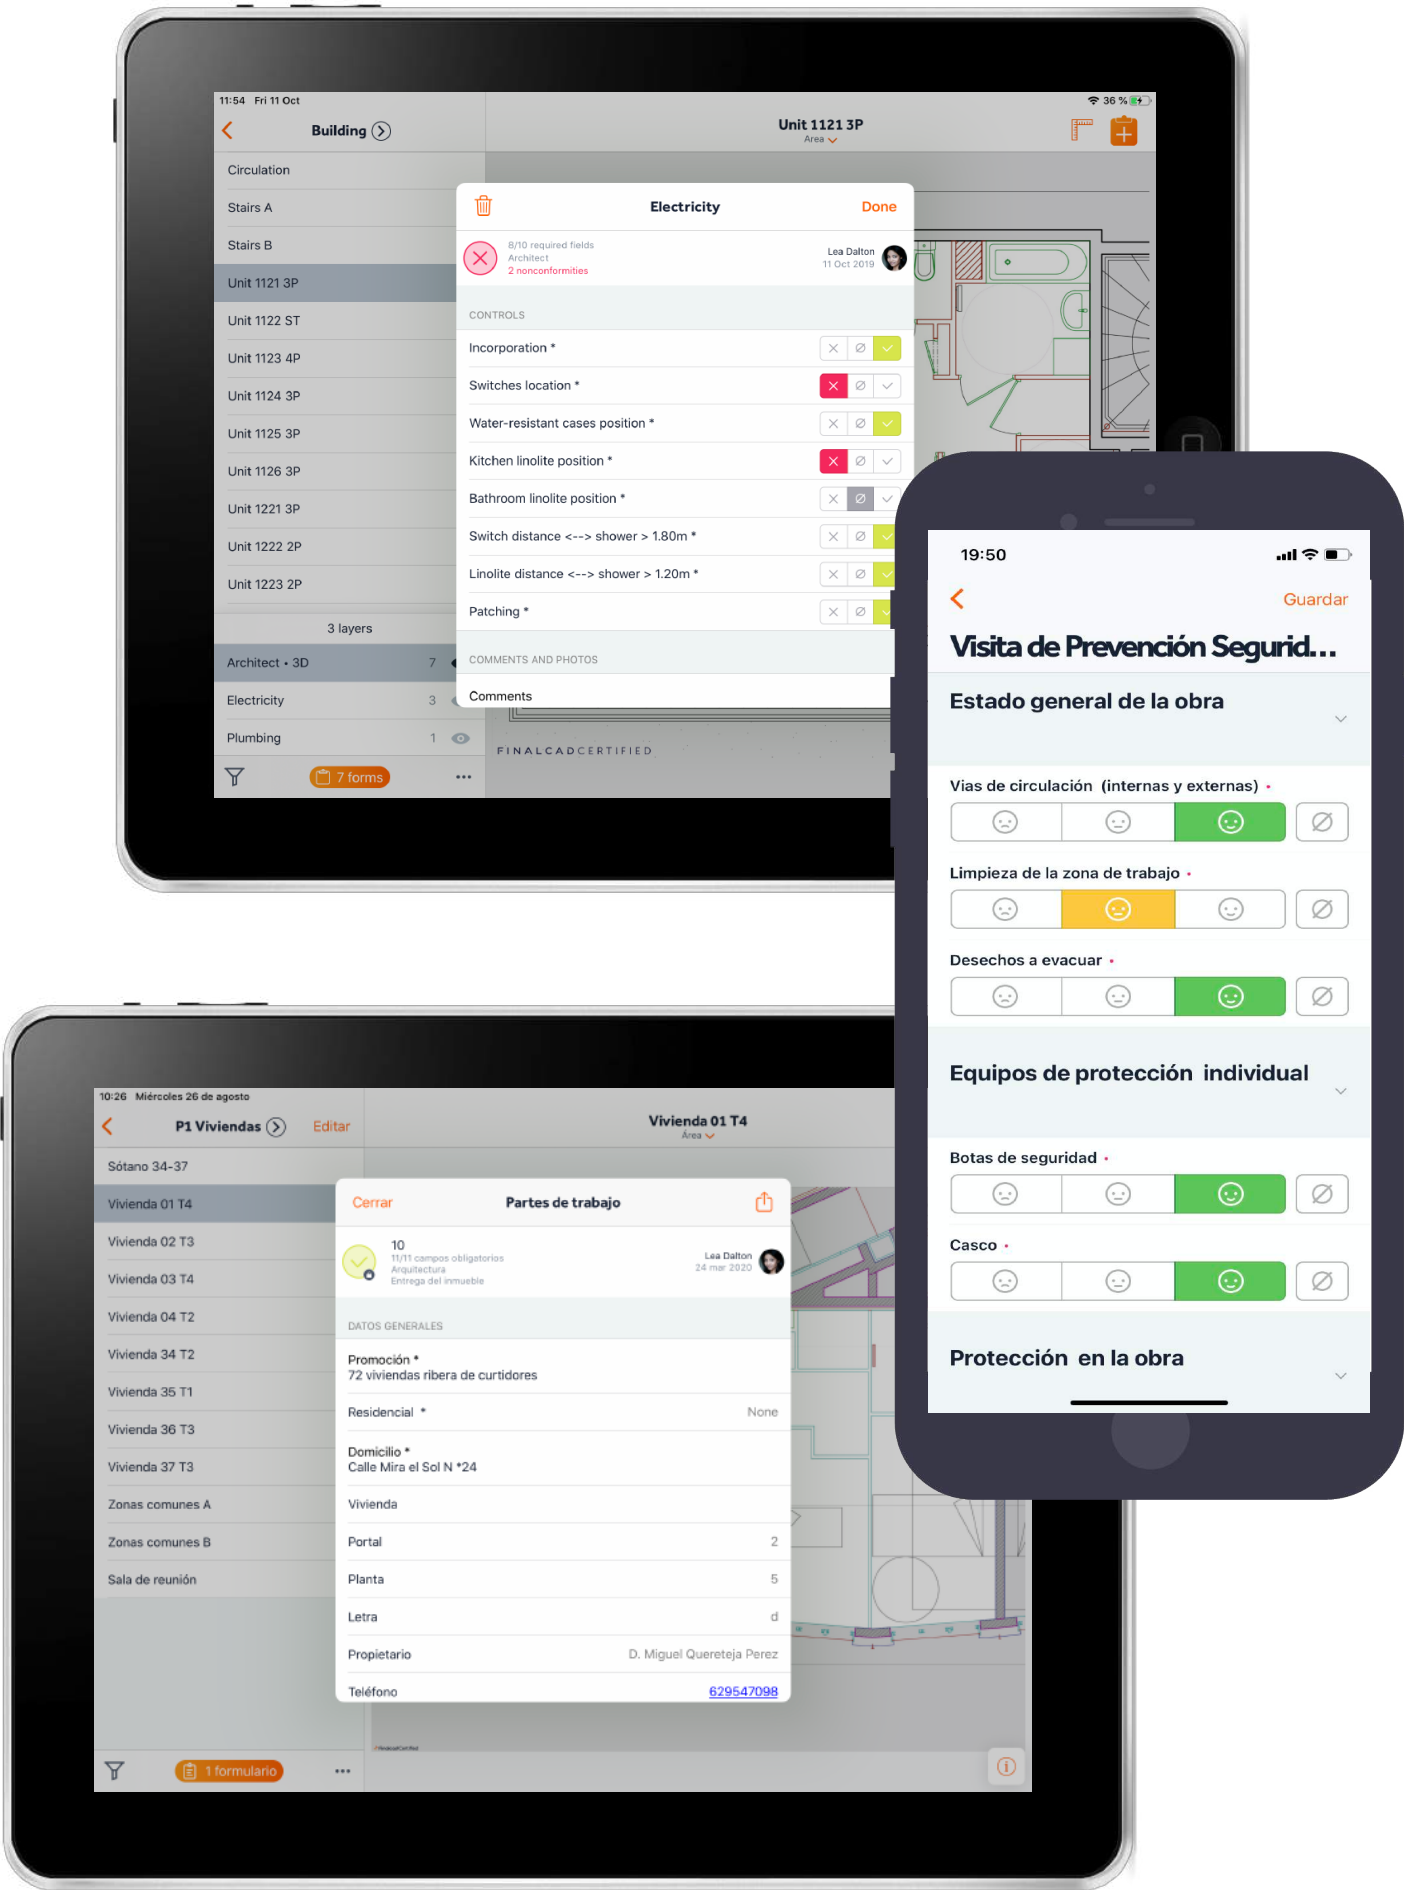

Sus formularios digitalizados

LOGO

Sales Demo Building SP
Finalcad

Finalcad

PARTES DE TRABAJO #10

CATEGORÍA::

13.PDT.00 - Parte de trabajo

CONFORMIDAD::

HECHO

INSPECTOR:

Lea Dalton

FECHA:

24/3/20

DATOS GENERALES

Promoción *

72 viviendas ribera de cortidores

Residencial *

None

Domicilio *

Calle Mira el Sol N *24

Vivienda

Portal

2

Planta

5

Letra

d

Propietario

D. Miguel Querejeta Perez

Teléfono

629547098

CONFORMIDAD PROPIETARIO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS

Presencia propietario *

SI

DNI *

31912739J

Fecha *

13/3/20

Firma Propietario *

Conformidad *

Conforme

No conforme

Irrelevante

Nota: La firma del responsable técnico verifica la revisión de los trabajos realizados en este documento según los requisitos y criterios de aceptación incluidos en el sistema de gestión interno de calidad de la organización.

CONFORMIDAD TÉCNICO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS

Fecha *

14/3/20

Firma del Técnico *

Conformidad *

Conforme

No conforme

Irrelevante

FINALCAD_Sales Demo Building SP_Partes de trabajo_08-26-2020_10-22-28-271.pdf

1 of 1

Informes

Importe sus plantillas de formulario en Finalcad o Finalcad Live

Complete sus formularios en la obra (listas de verificación, fotos, firmas...)

Obtenga la firma de cualquier actor profesional en el proyecto


Exporte informes PDF y Excel desde la aplicación móvil o desde la plataforma web

Rastree toda la lista de controles/formularios no-conformes o sin completar

Estadísticas on app

Forms con *processes*

Añada un circuito de validación personalizado en sus formularios

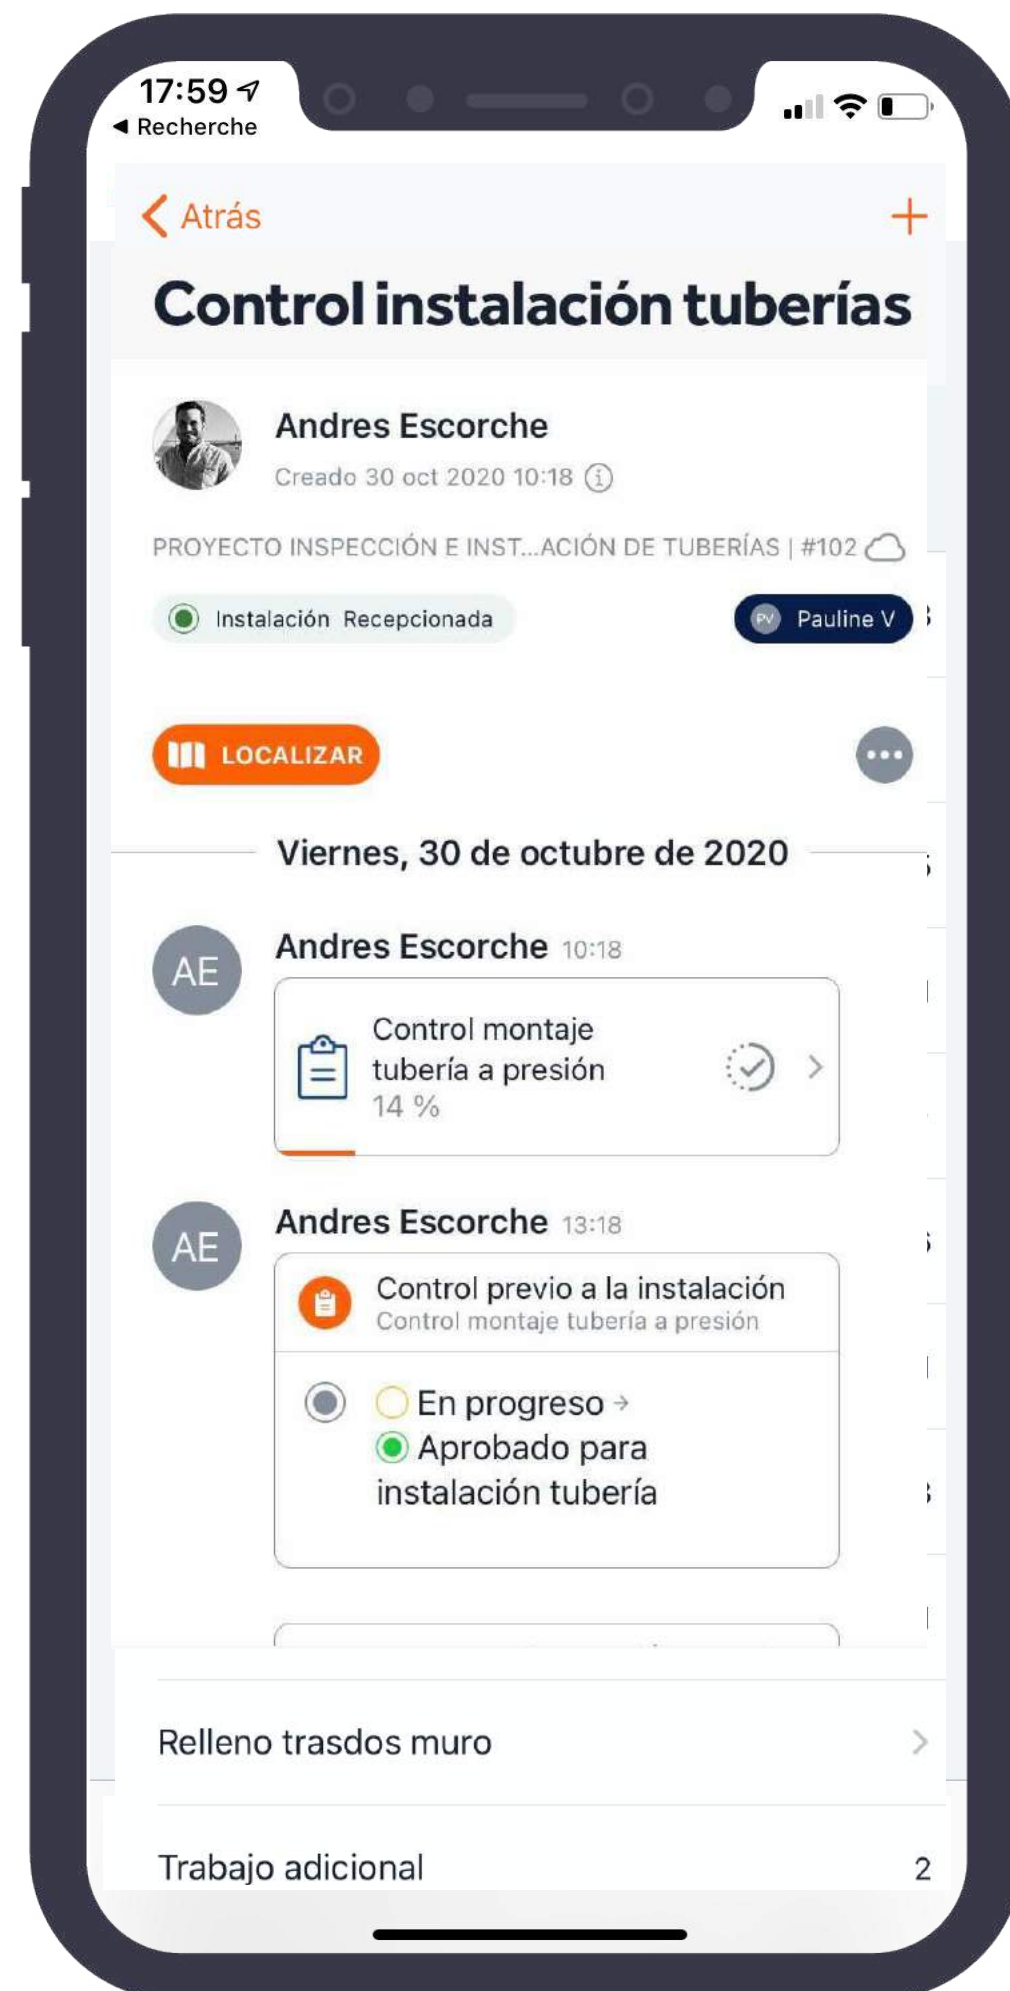

Integre secciones de validación en sus formularios

Siga en tiempo real el avance de los controles gracias a sus estados

Exporte informes PDF y/o Excel

Mejore de forma proactiva la calidad y la seguridad

Plazos

25%

de tiempo ahorrado
ejecutando sus check-lists

Calidad

50%

menos repasos al entrar en
preventa

Seguridad

Disminución

de accidentes humanos e
incidentes ambientales

Conformidad & trazabilidad

100%

de los controles / visitas se
pueden ejecutar y verificar
fácilmente en los informes

« Finalcad nos ayuda a alcanzar altos niveles de calidad en muy poco tiempo»

Mauricio, Responsable de Calidad , Moriarty

Finalcad Defect


Con




Finalcad




Finalcad Defect mejora la eficiencia de la gestión de observaciones & repasos y conecta en tiempo real a todas las partes involucradas gracias a un circuito de validación

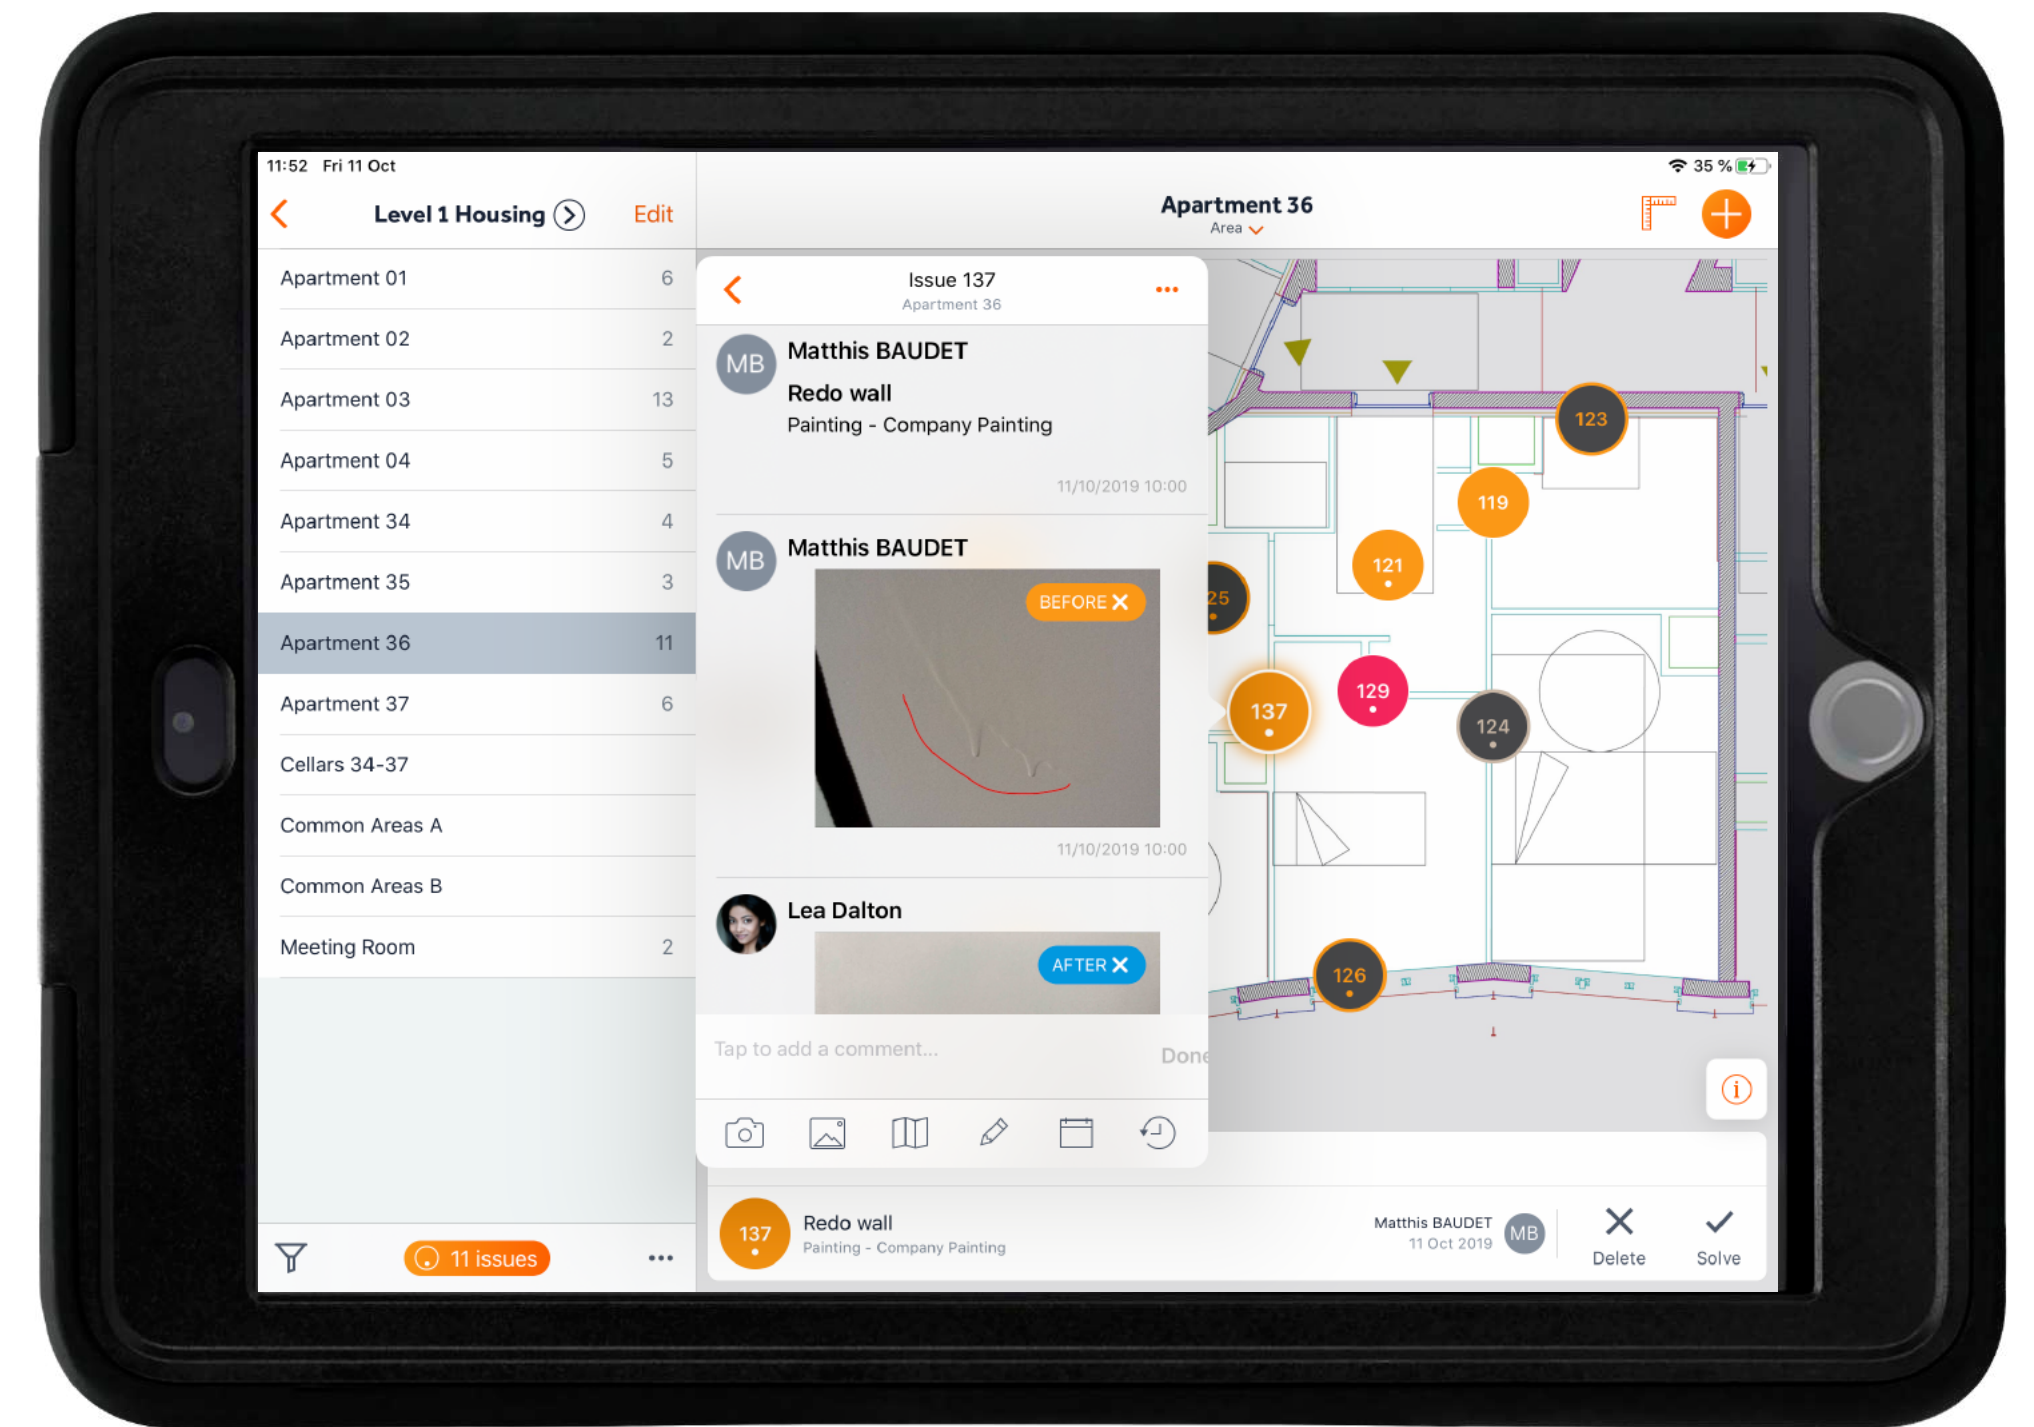

Defect

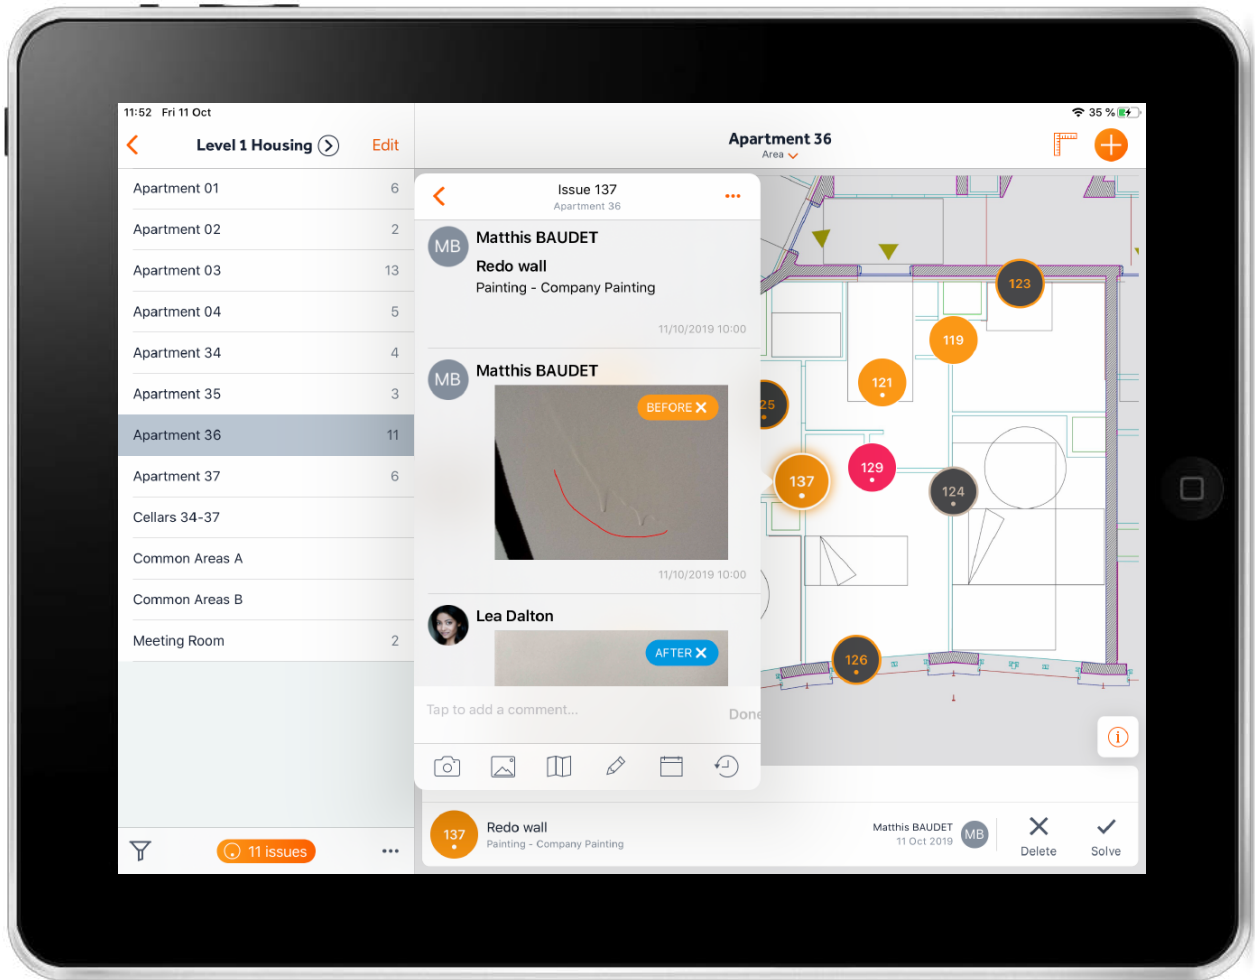

Gestione sus observaciones/repasos

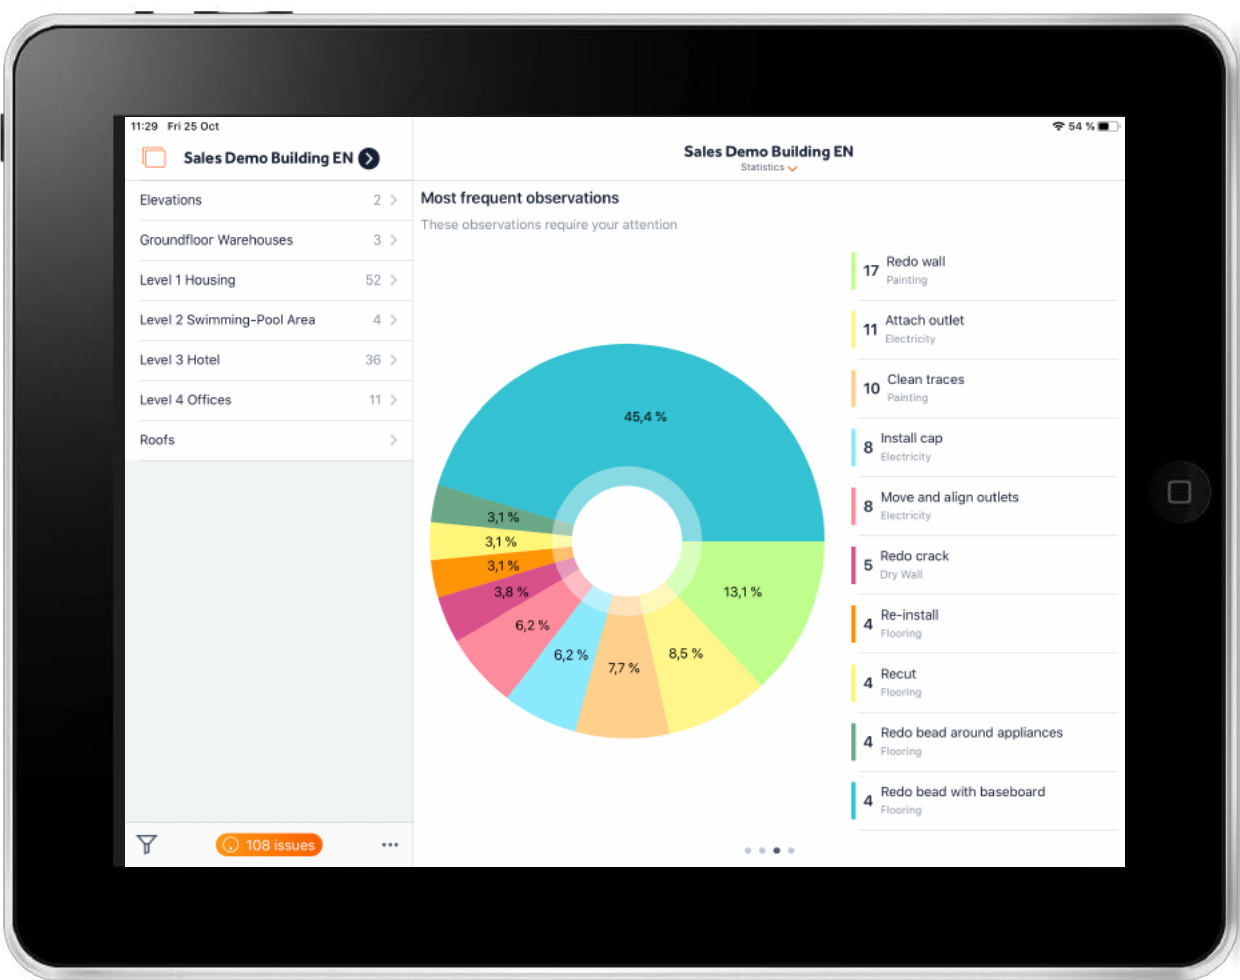

Estadísticas on app

Localice en el plano la observación/el repaso

Asígnela/lo a un grupo interno o externo (quien podrá reasignarlo a otro grupo si fuera necesario)


Clasifique el tipo de observación/repaso

Detalle cada observación/repaso (fotografía, comentarios, plazo para su tratamiento...)


Siga la resolución de las observaciones/los repasos directamente en la App

Genere y/o reciba informes en PDF y Excel con listados de observaciones o repasos y su estado para seguir su tratamiento y compartirlos con las personas deseadas

Acceda a una visión global de sus observaciones o repasos gracias a estadísticas en tiempo real

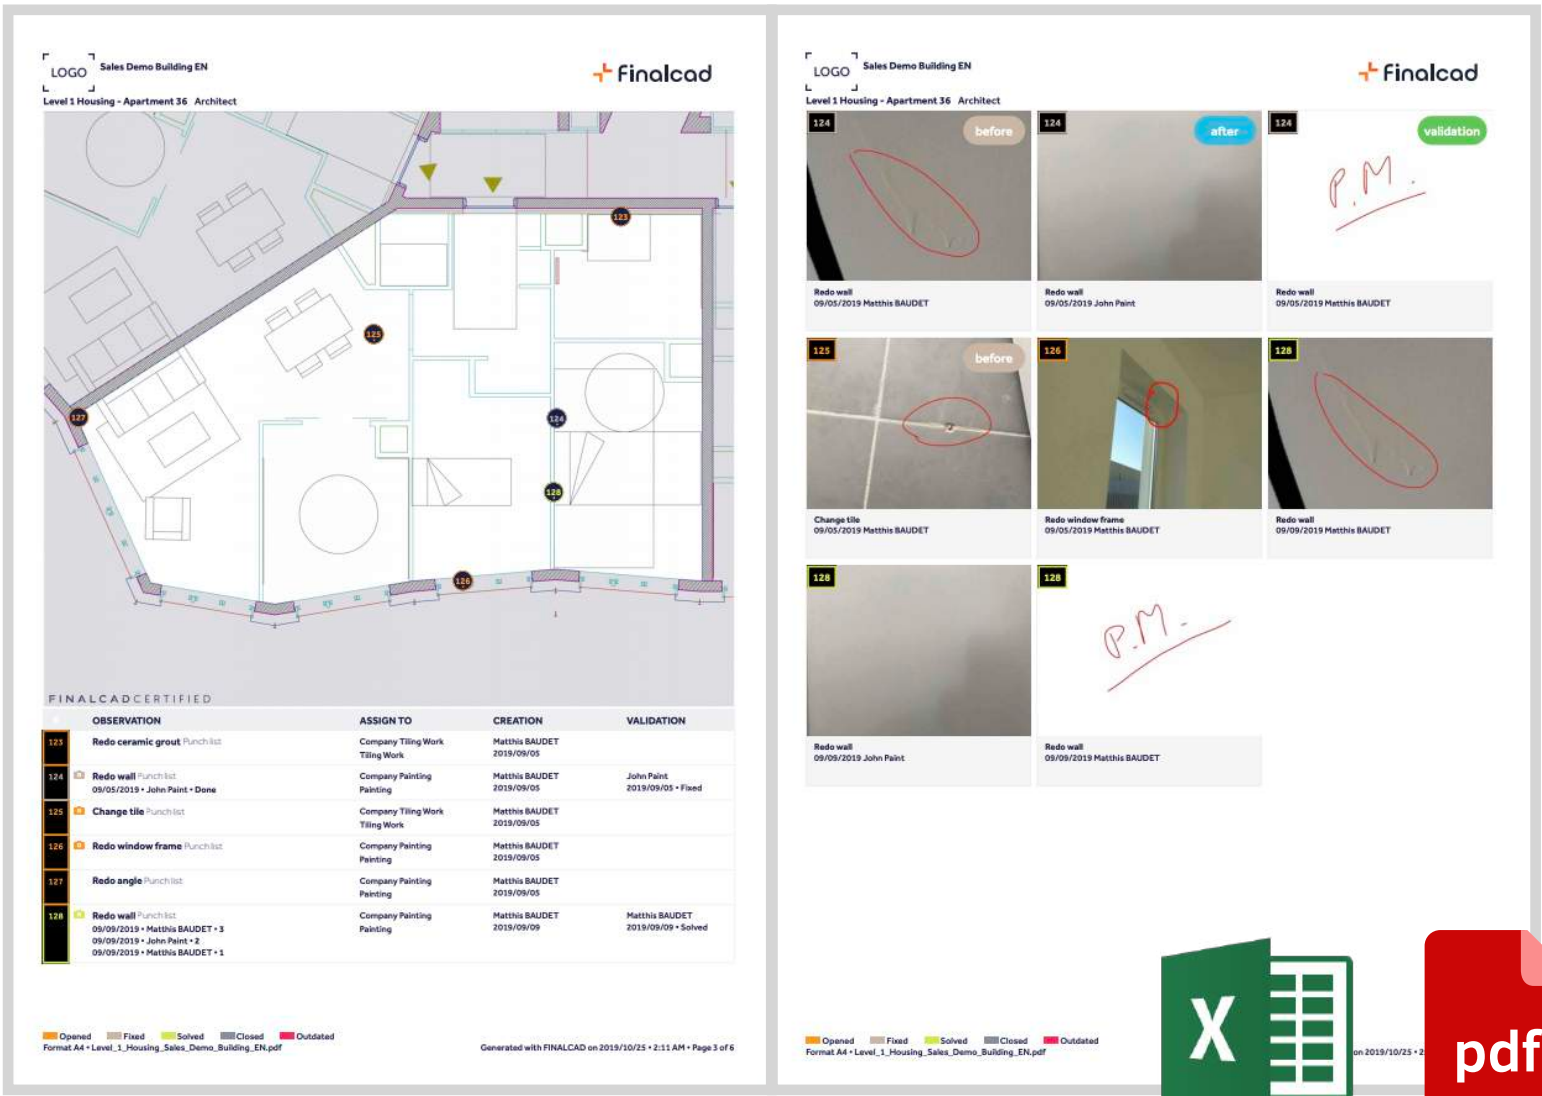

Informes



Gestión de proyecto

3 horas

Ahorradas por día usando Finalcad Defect en vez del método papel /Lápiz /Excel

Calidad

60%

De reducción de errores recurrentes y reducción del número de defectos en post venta

Comunicación

En tiempo real

Centralización de la información y distribución de los informes y reportes en tiempo real entre todas las partes

Trazabilidad

100%

De las actividades guardadas con su autor, fecha, localización

« Estas soluciones nos permitieron disminuir el número de repastos de 50% con un seguimiento diario de la obra. »

Xavier, Director de Proyecto, CBC


Finalcad

Progress monitoring


Con




Finalcad

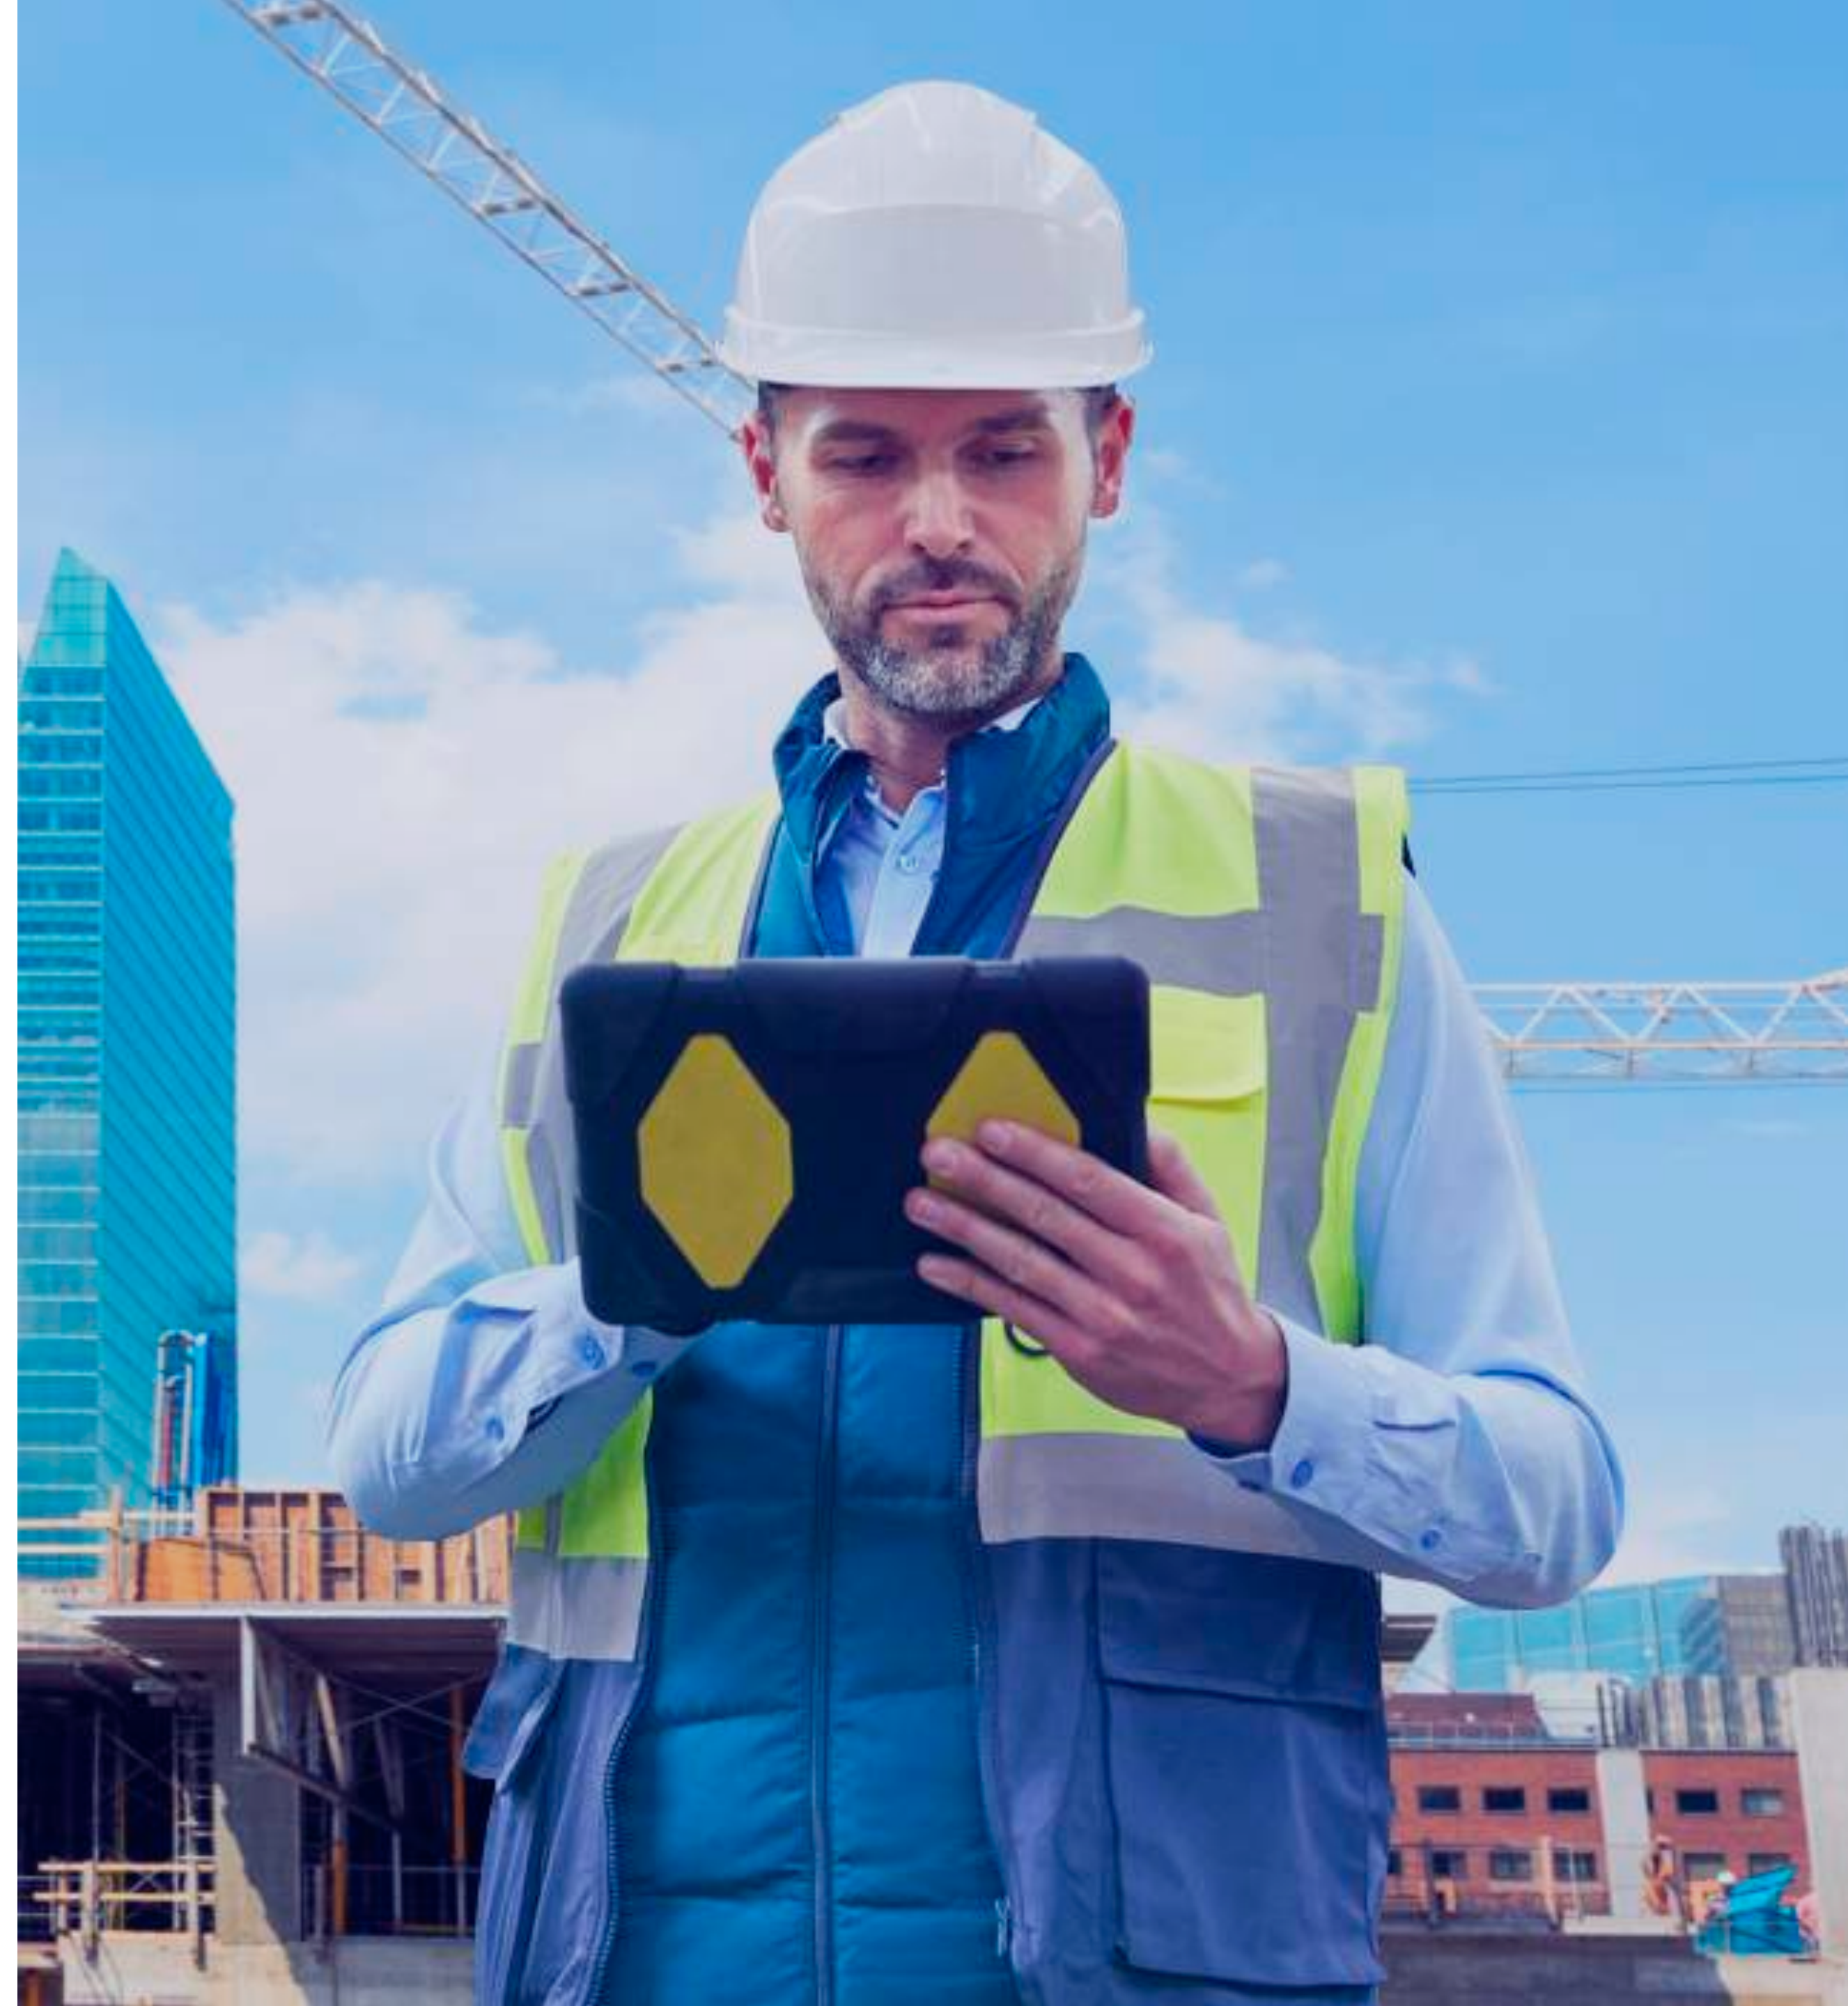

Finalcad Progress
Monitoring da una visibilidad
detallada y en tiempo real del
progreso de los hitos de su
proyecto

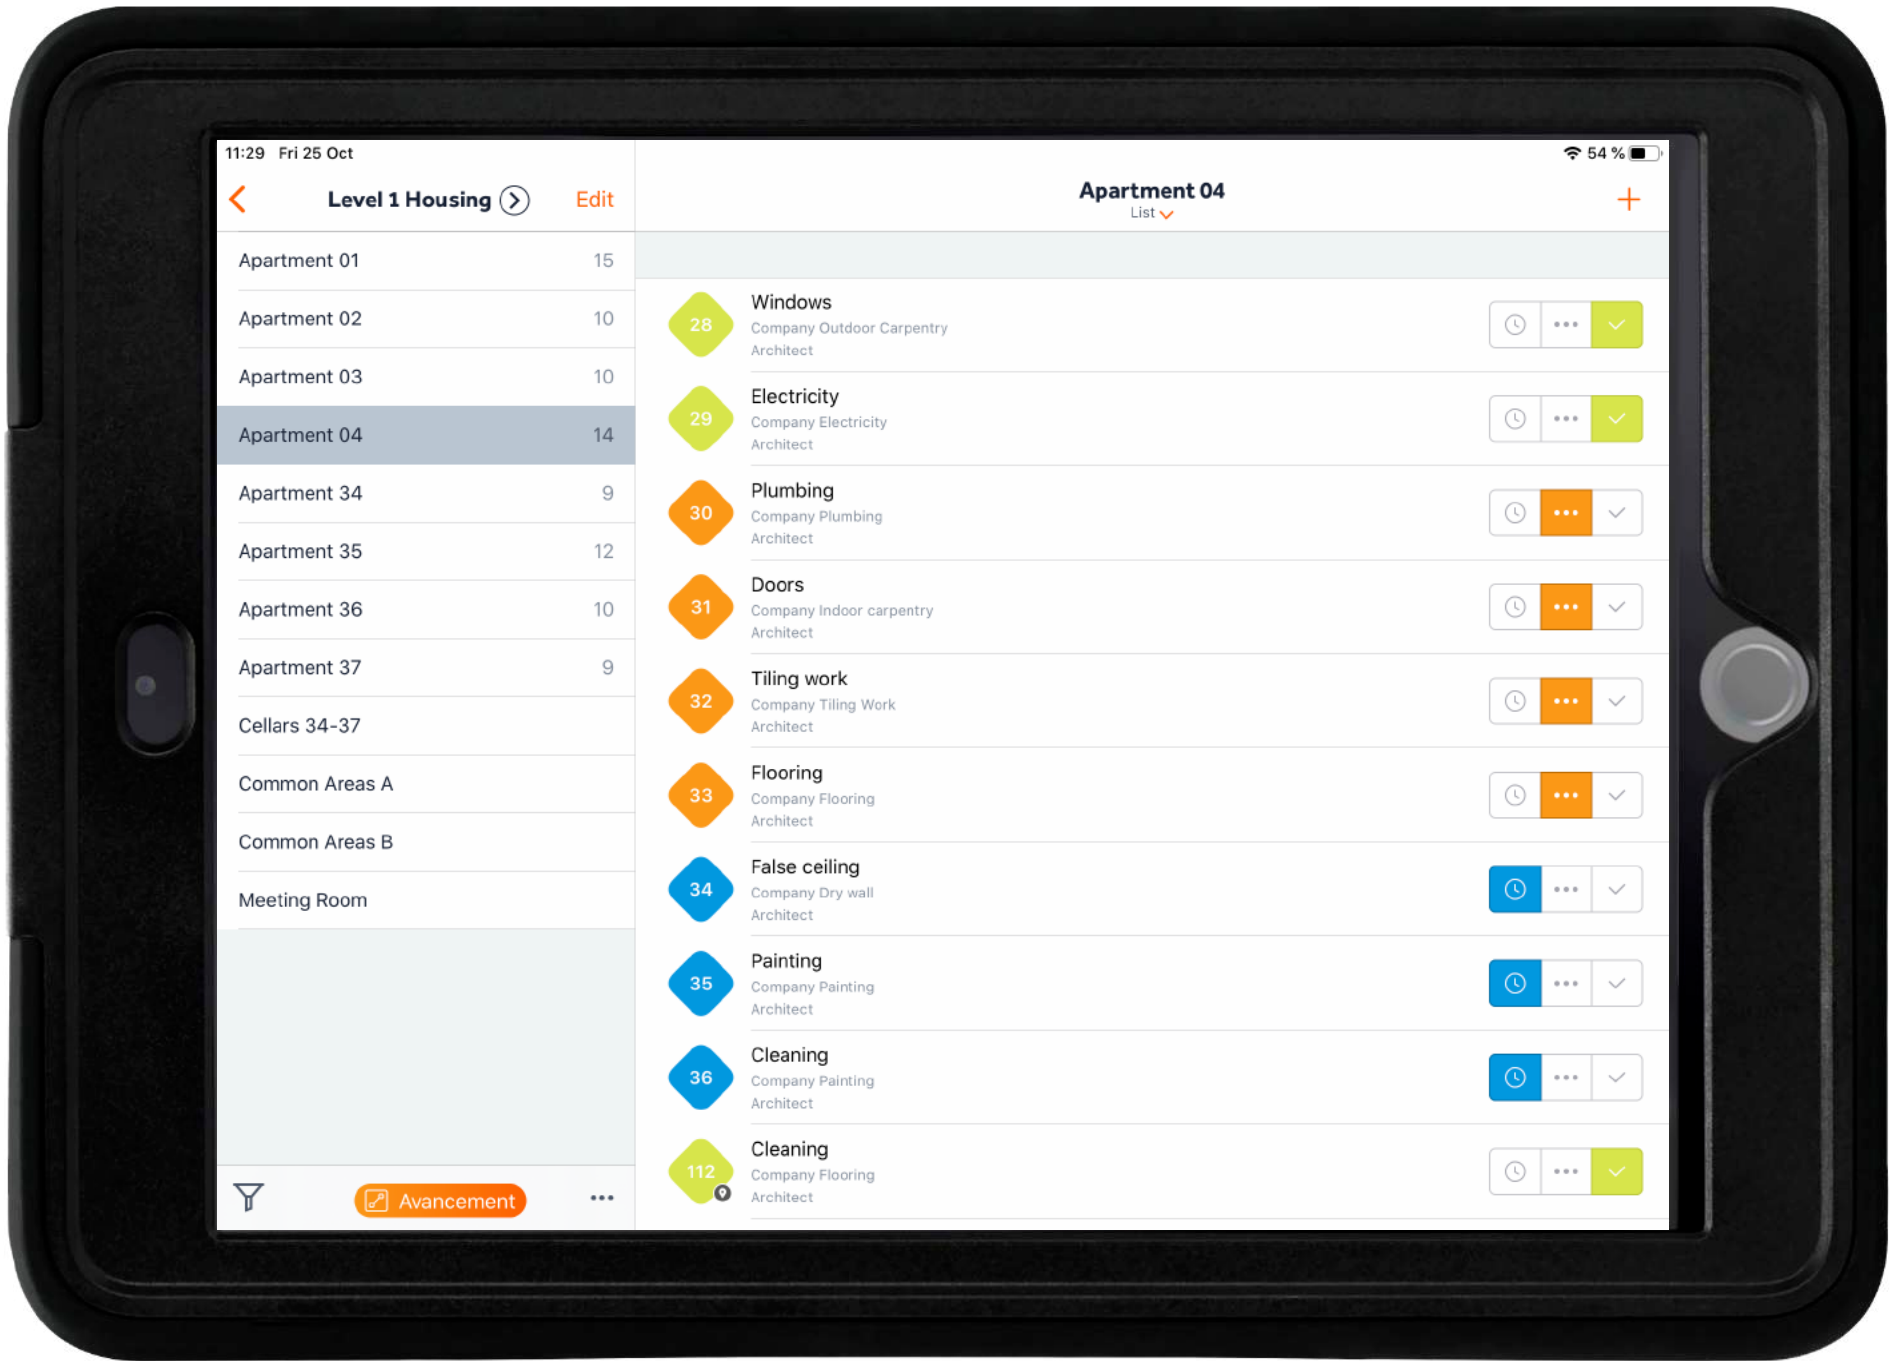

Progreso real de los hitos de obra

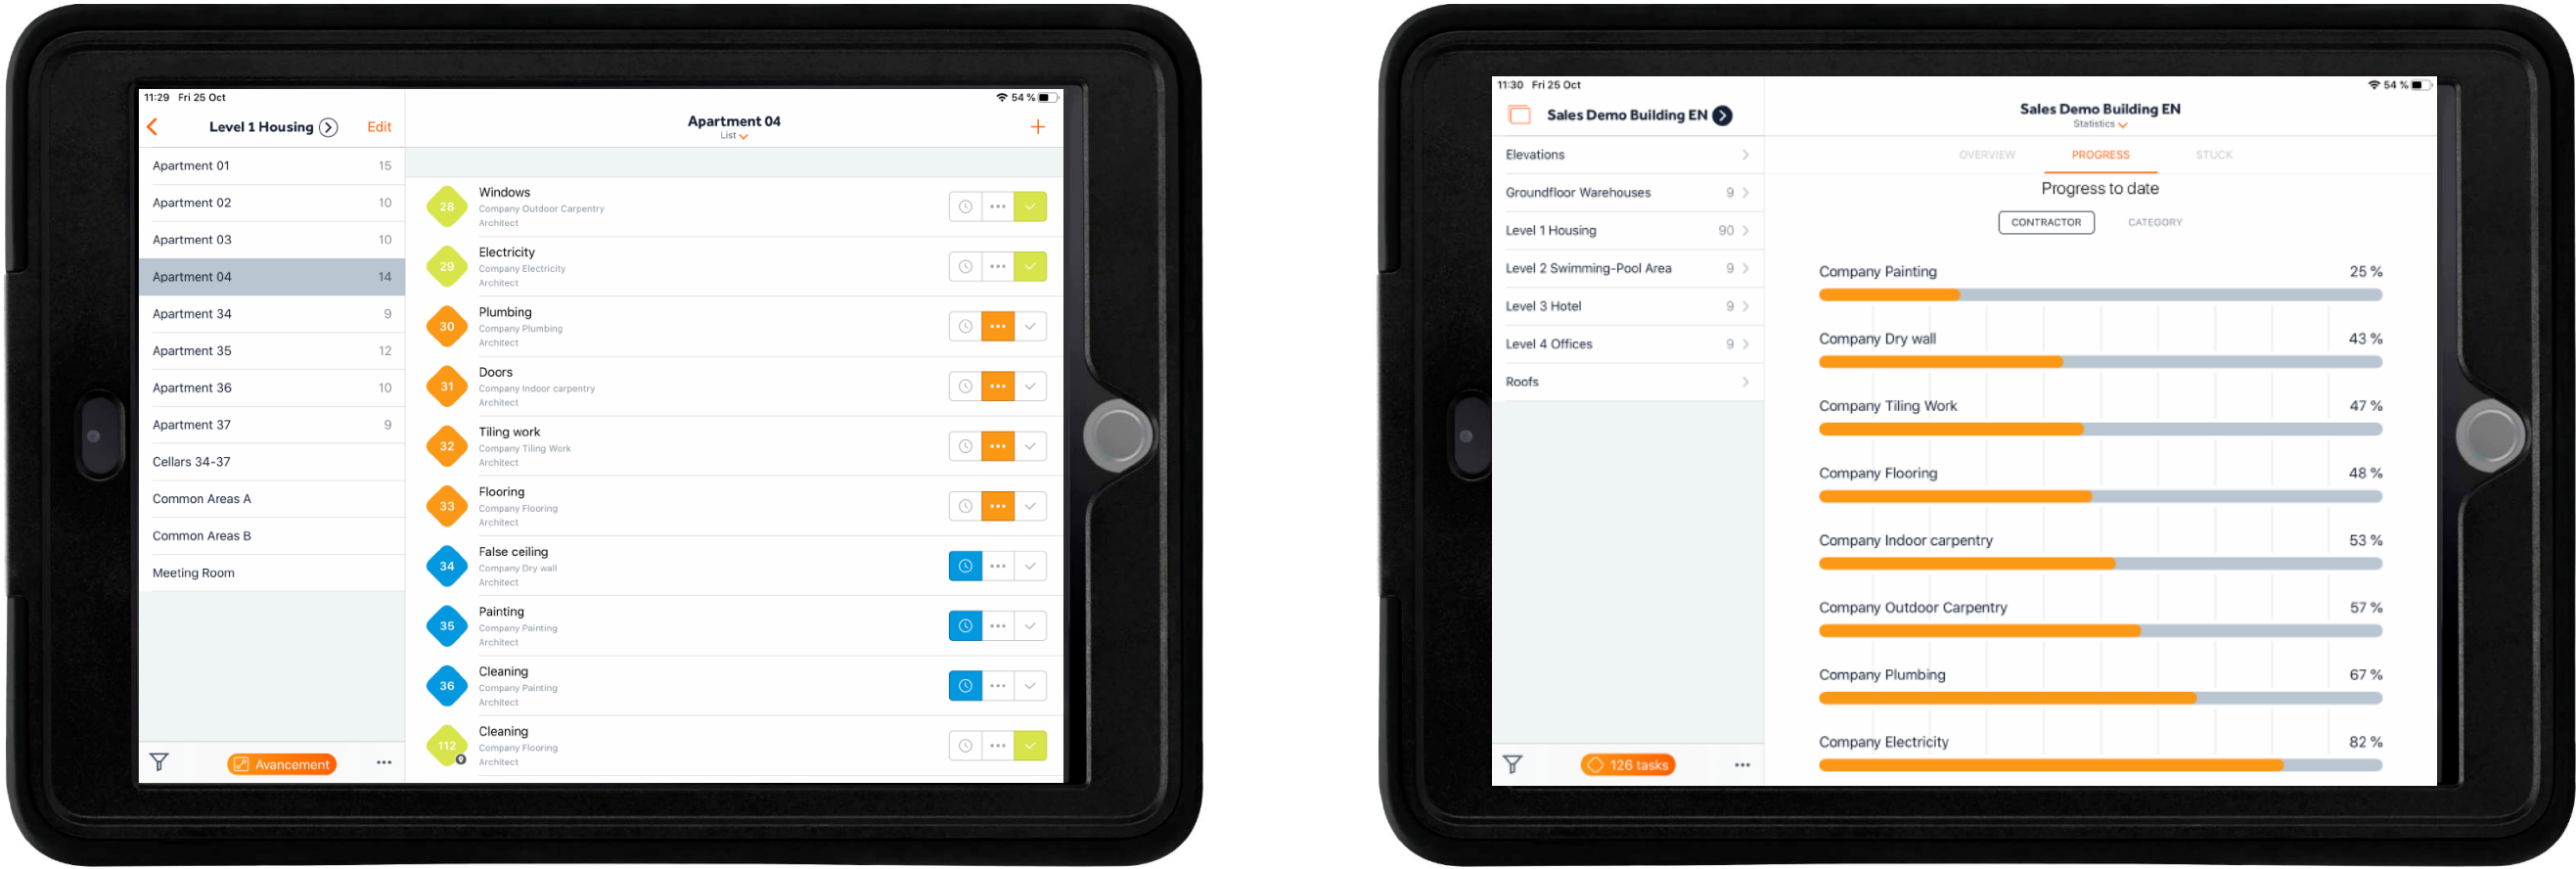

Establezca el listado de tareas para cada zona y defina fecha de inicio y fin prevista

Asígnelas a las empresas adecuadas

En la obra, modifique el porcentaje de progreso de las actividades en cada zona


Añada una foto y un comentario si lo desea

Entre el avance de cada tarea para cada zona

Estadísticas on app

Genere informes para ver el avance por empresa y por zona

Gracias a la estadísticas, visualice de forma muy rápida el avance real de las actividades en su obra y compare con lo previsto

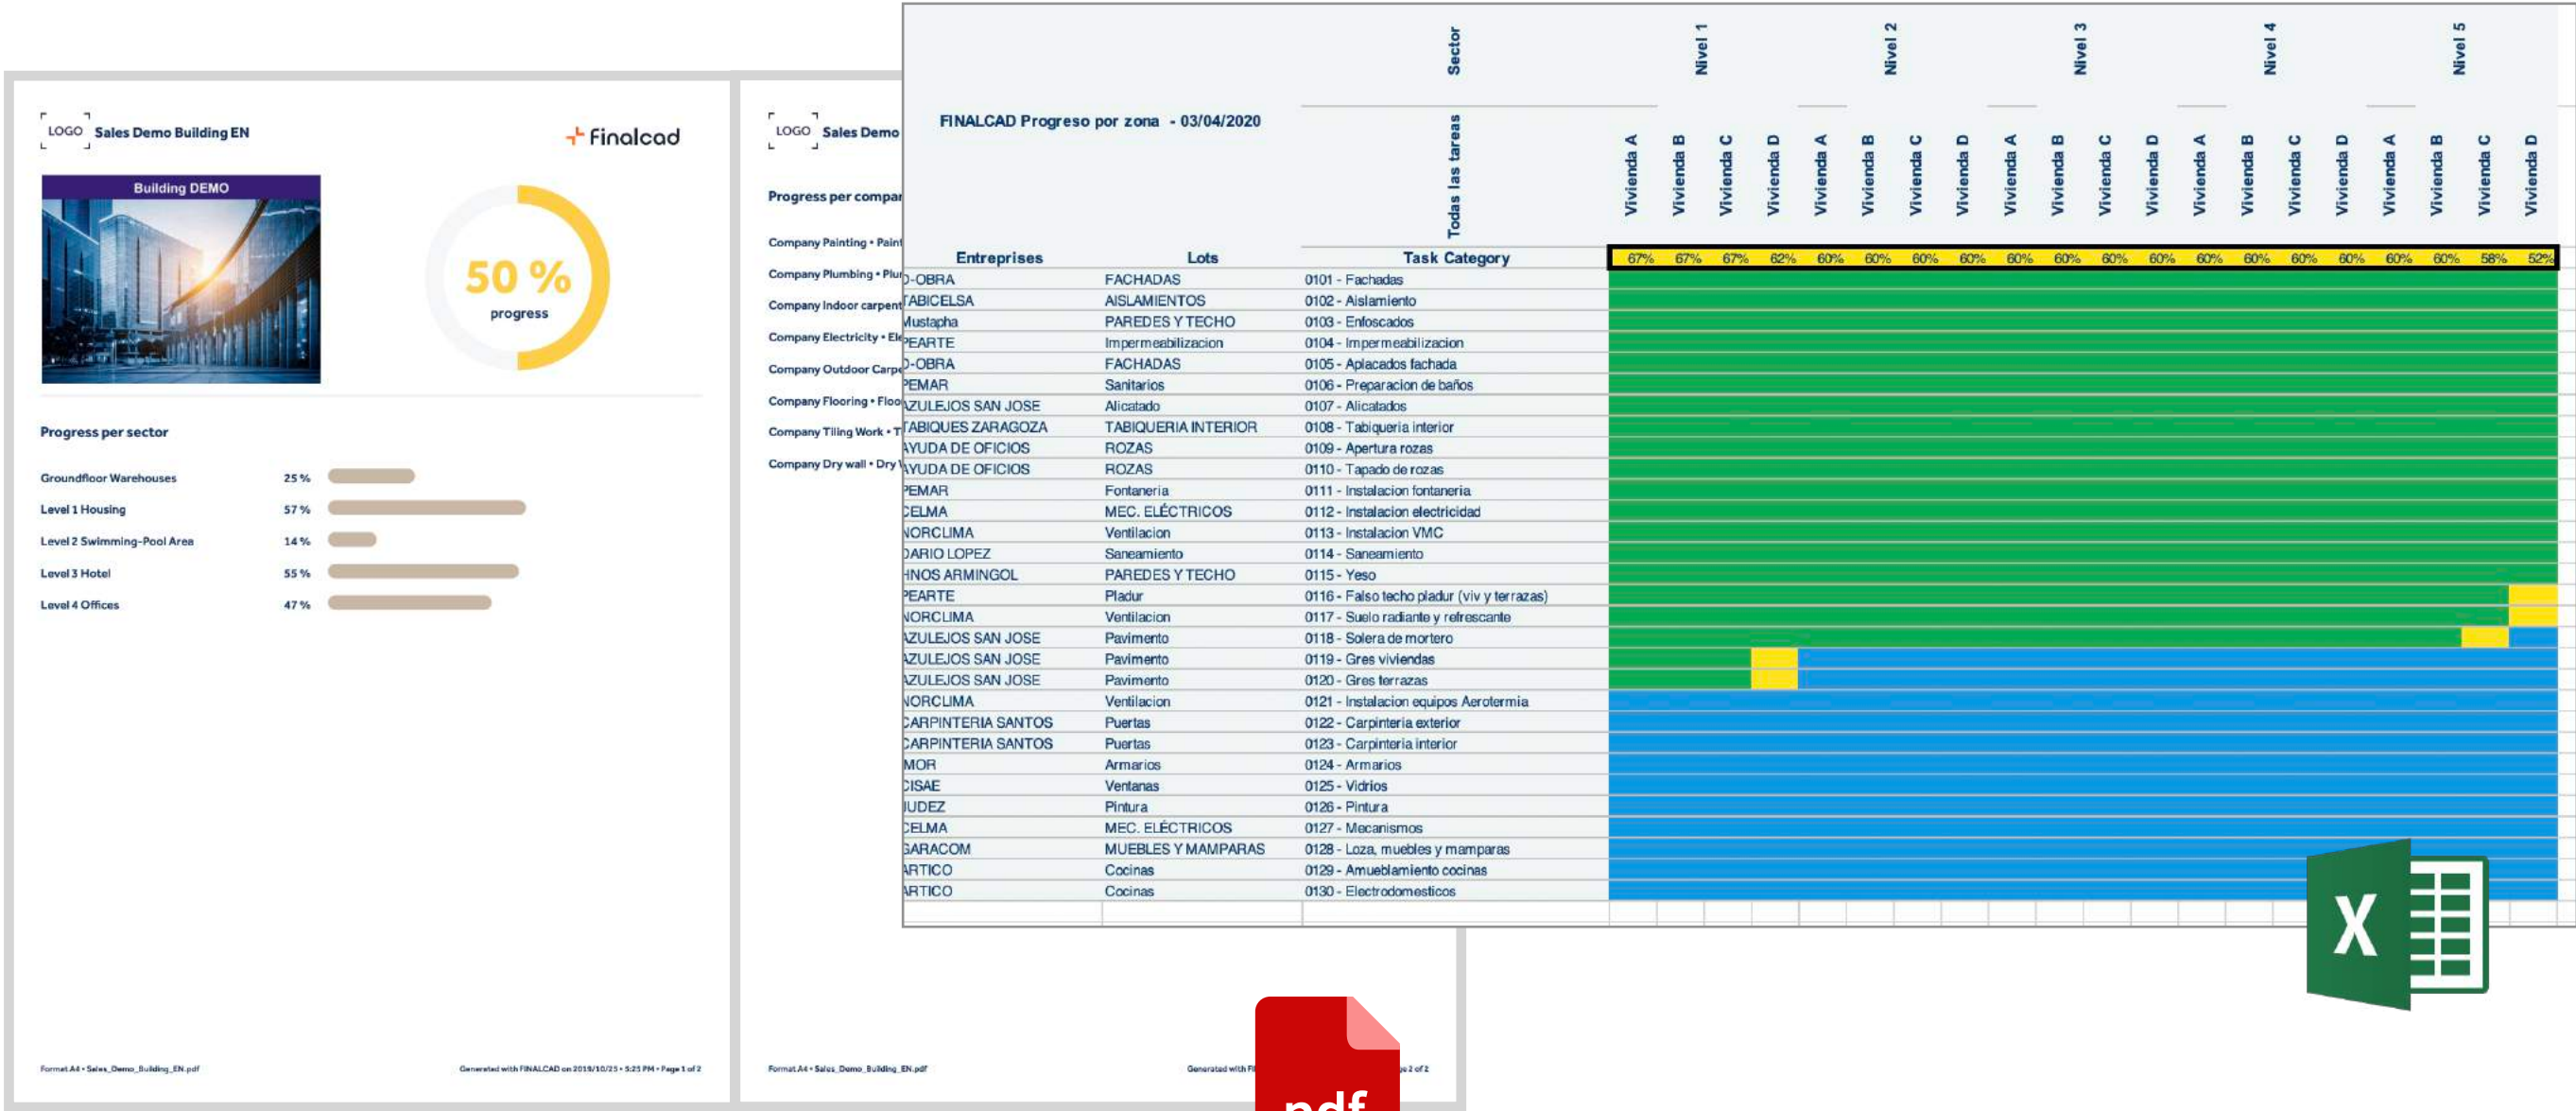

Informes

FINALCAD - Confidencial



Colaboración

Visibilidad

del avance de los trabajos realizados en tiempo real por su equipo de obra

Tiempo

Reducción

del tiempo necesario para hacer un informe de avance

Gestión de proyecto

Compare

con las estimaciones de progreso iniciales

“El informe del avance nos resulta muy útil. Cada vez que vamos a la obra y hacemos controles, podemos capturar cualquier dato y visualizar su avance más fácilmente: gráficamente y con tablas. Sabemos rápidamente en qué vamos retrasados y tomamos medidas correctivas para adelantarnos.”

Kim Hun, Ing. Arquitecto

B. Casos de uso

Finalcad en todas las fases de sus obras





1. Cimentación y Estructura



Seguir el avance



Historial de órdenes de los DEOS

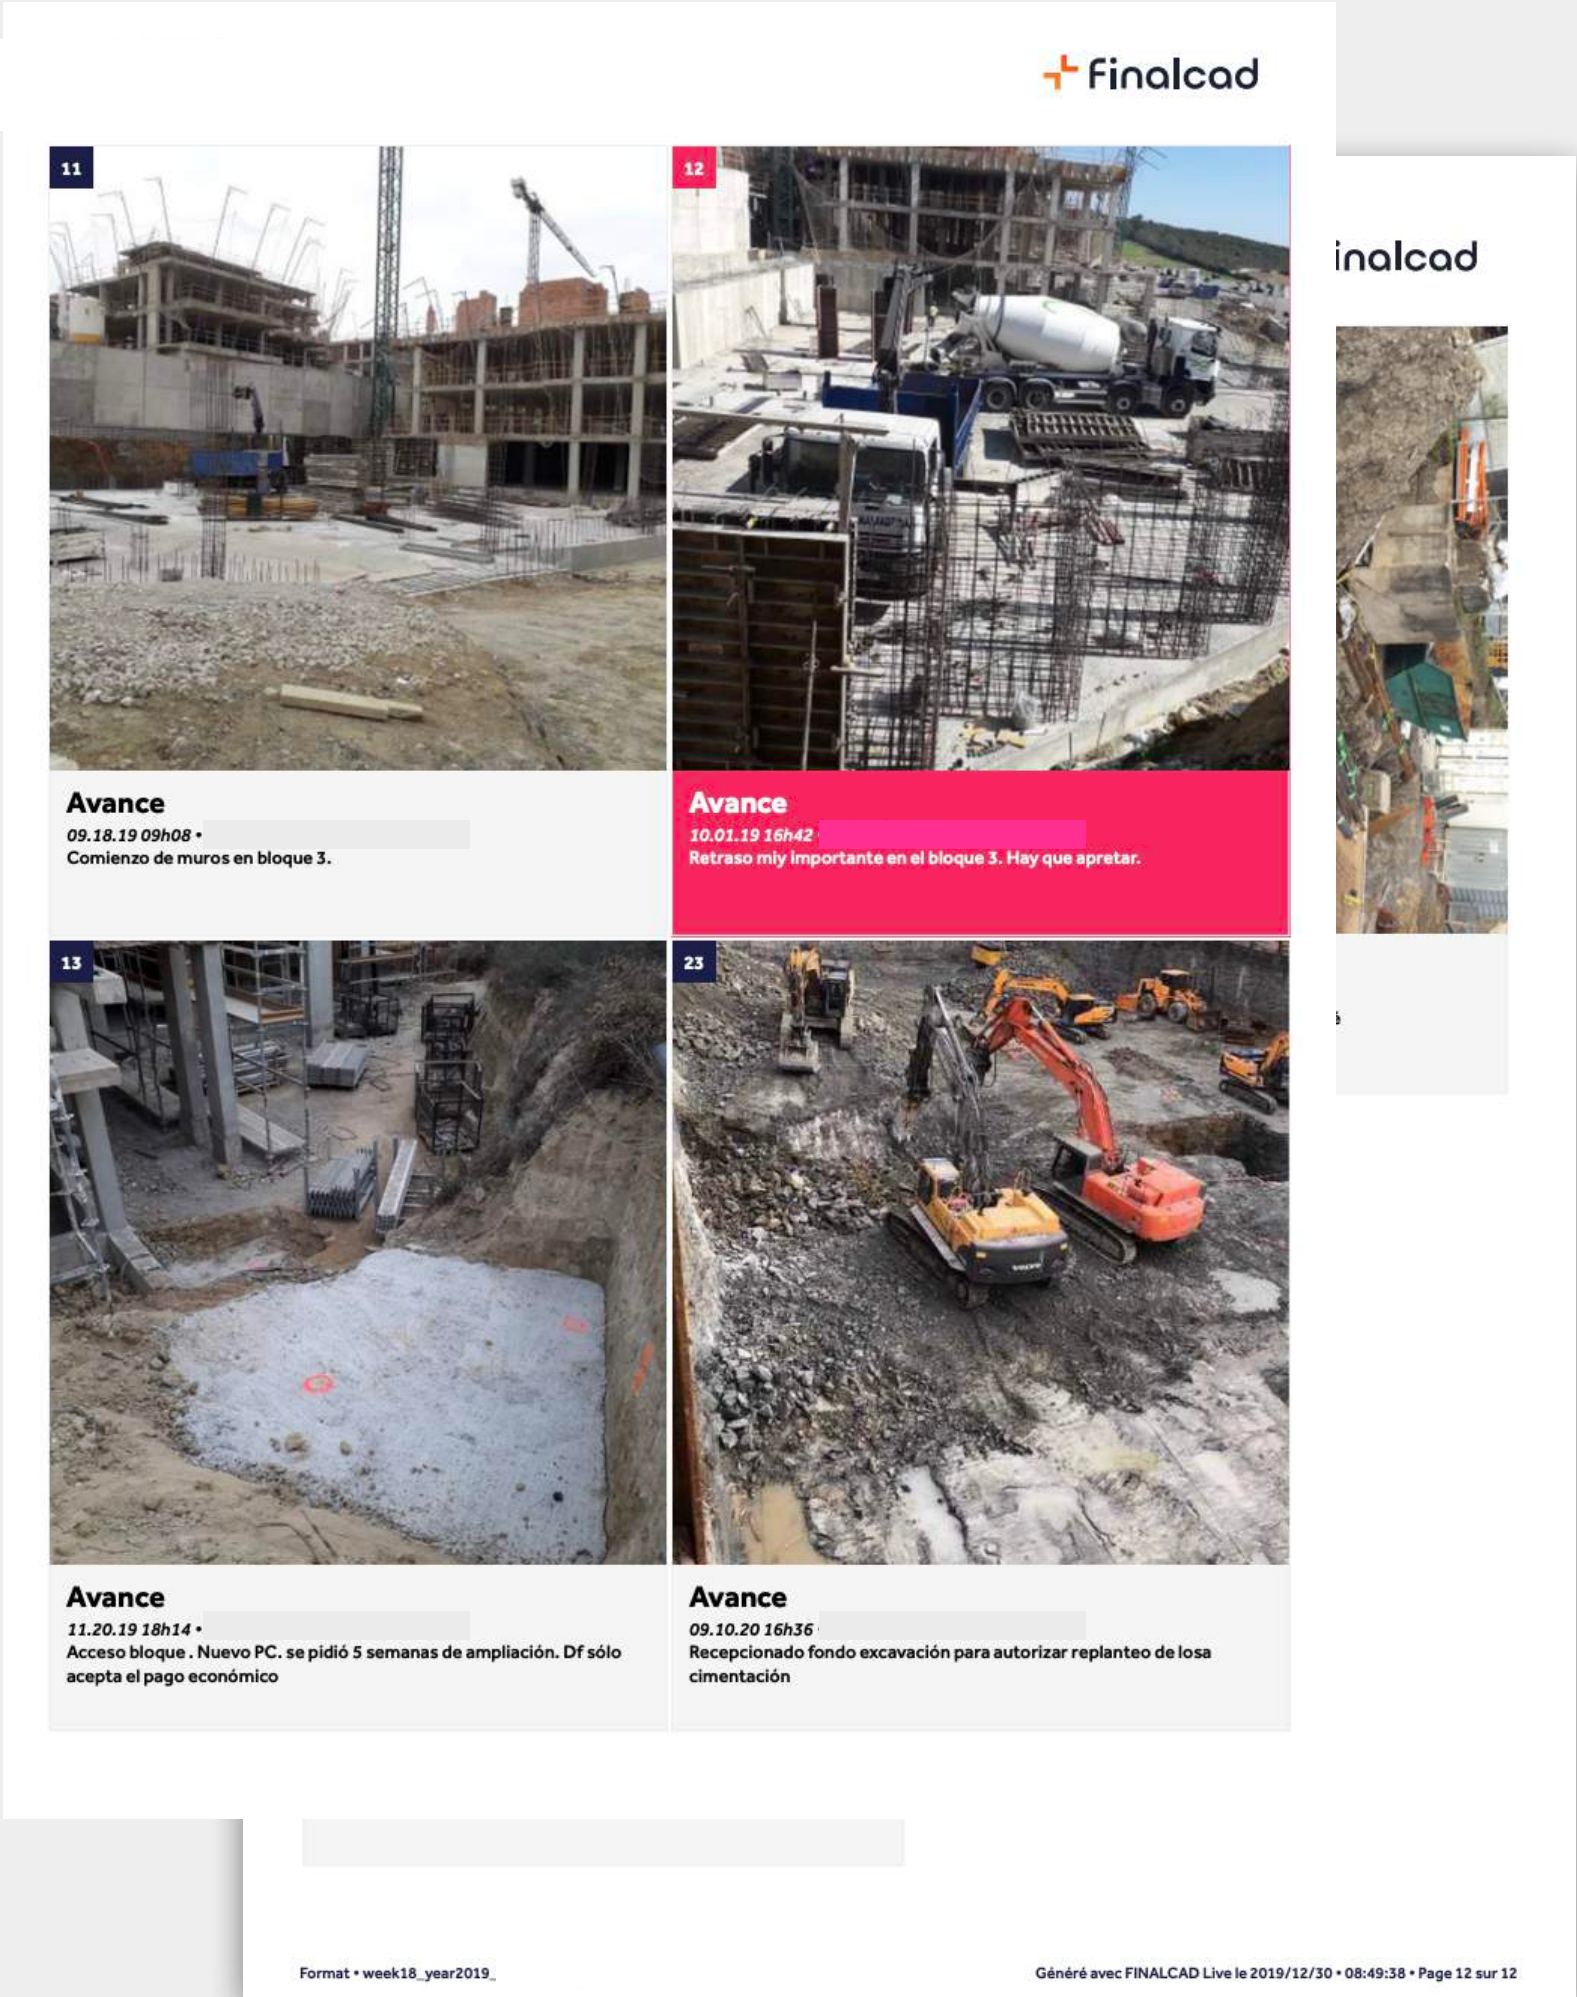


Informes categorizados

CONTRATISTA | DF

CONTEXTO CLIENTE

Obra estructuras
Avance fotográfico
Trabajos formalizados




BENEFICIOS


- Diario de obra digital en tiempo real
- Reporte del avance semanal
- Archivado en la nube y accesible

100%
Transparencia en el avance y comunicación

Justificar trabajos adicionales

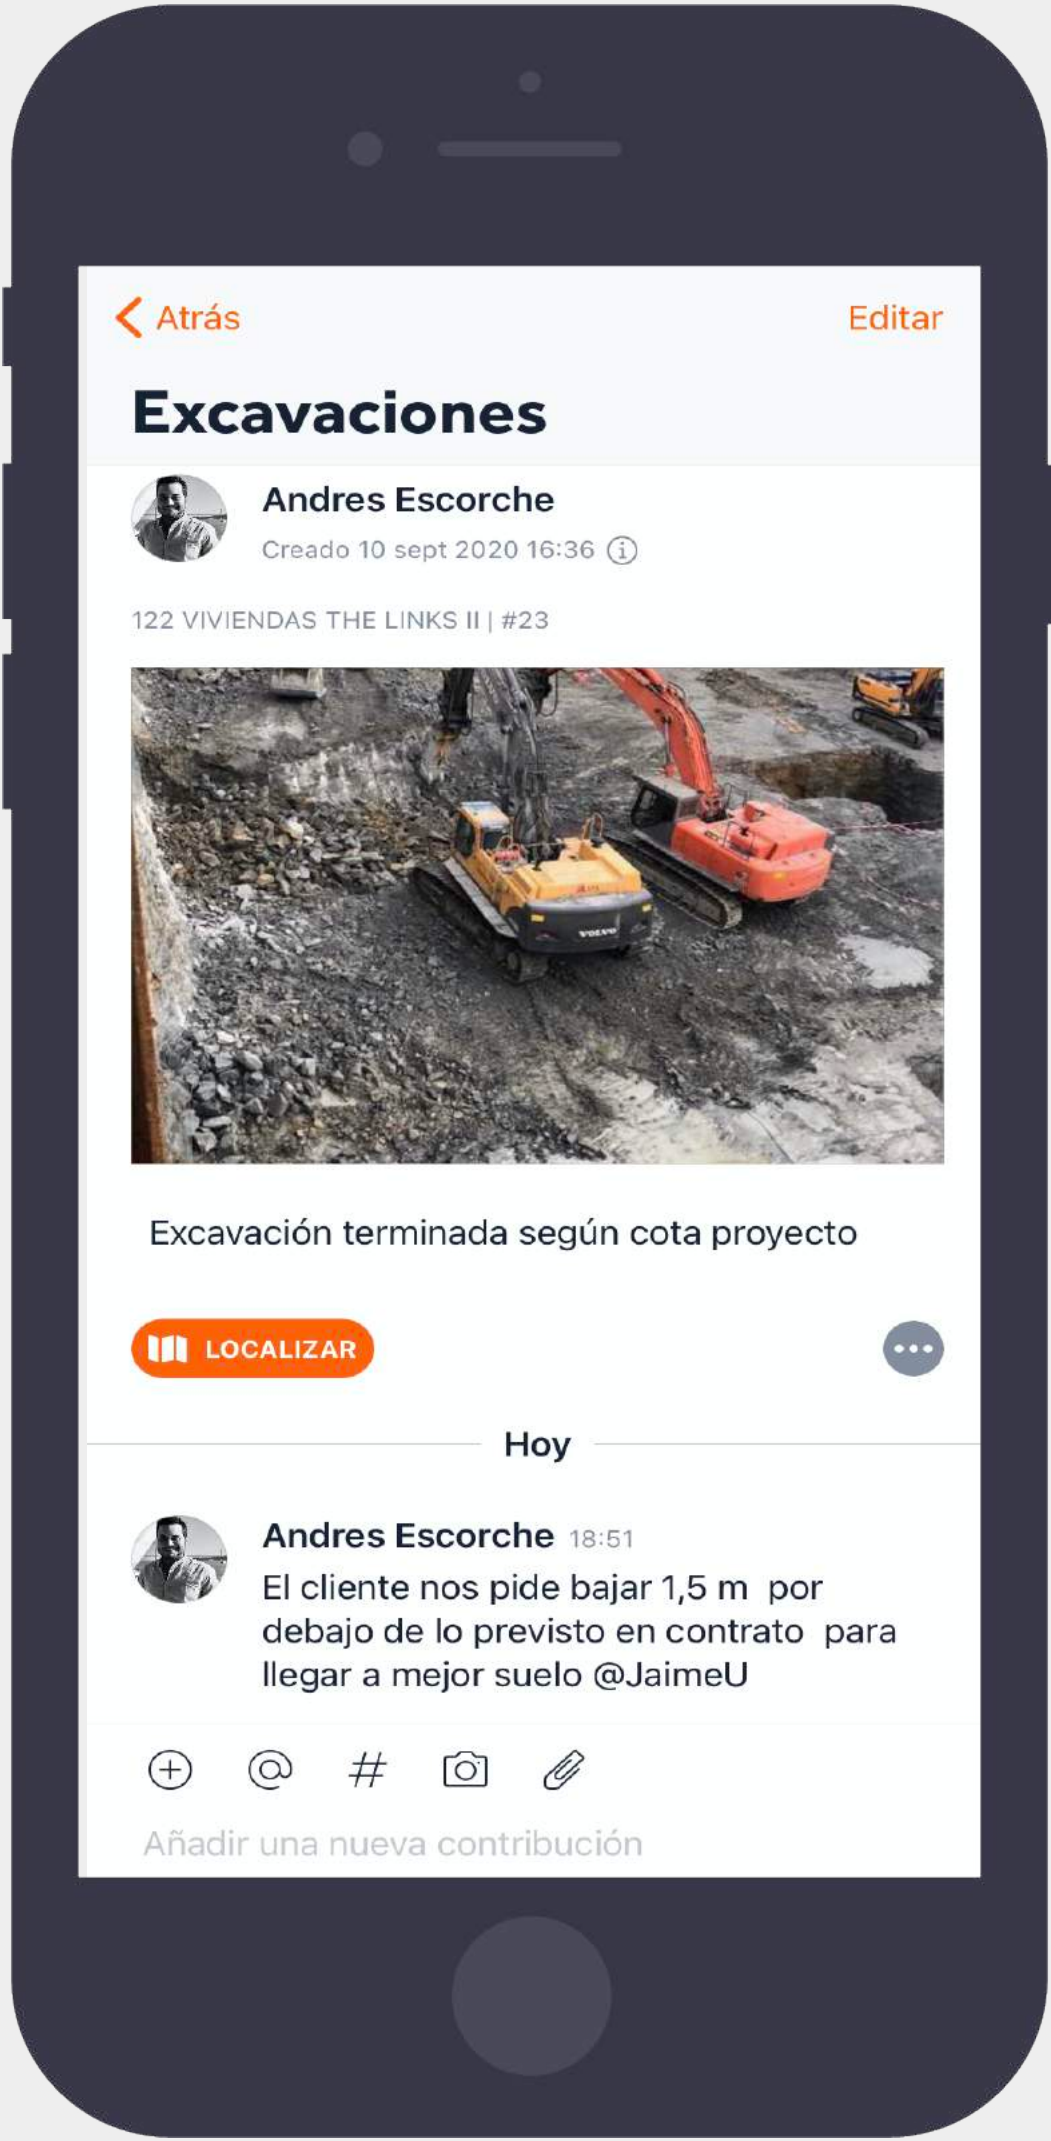

Encargado

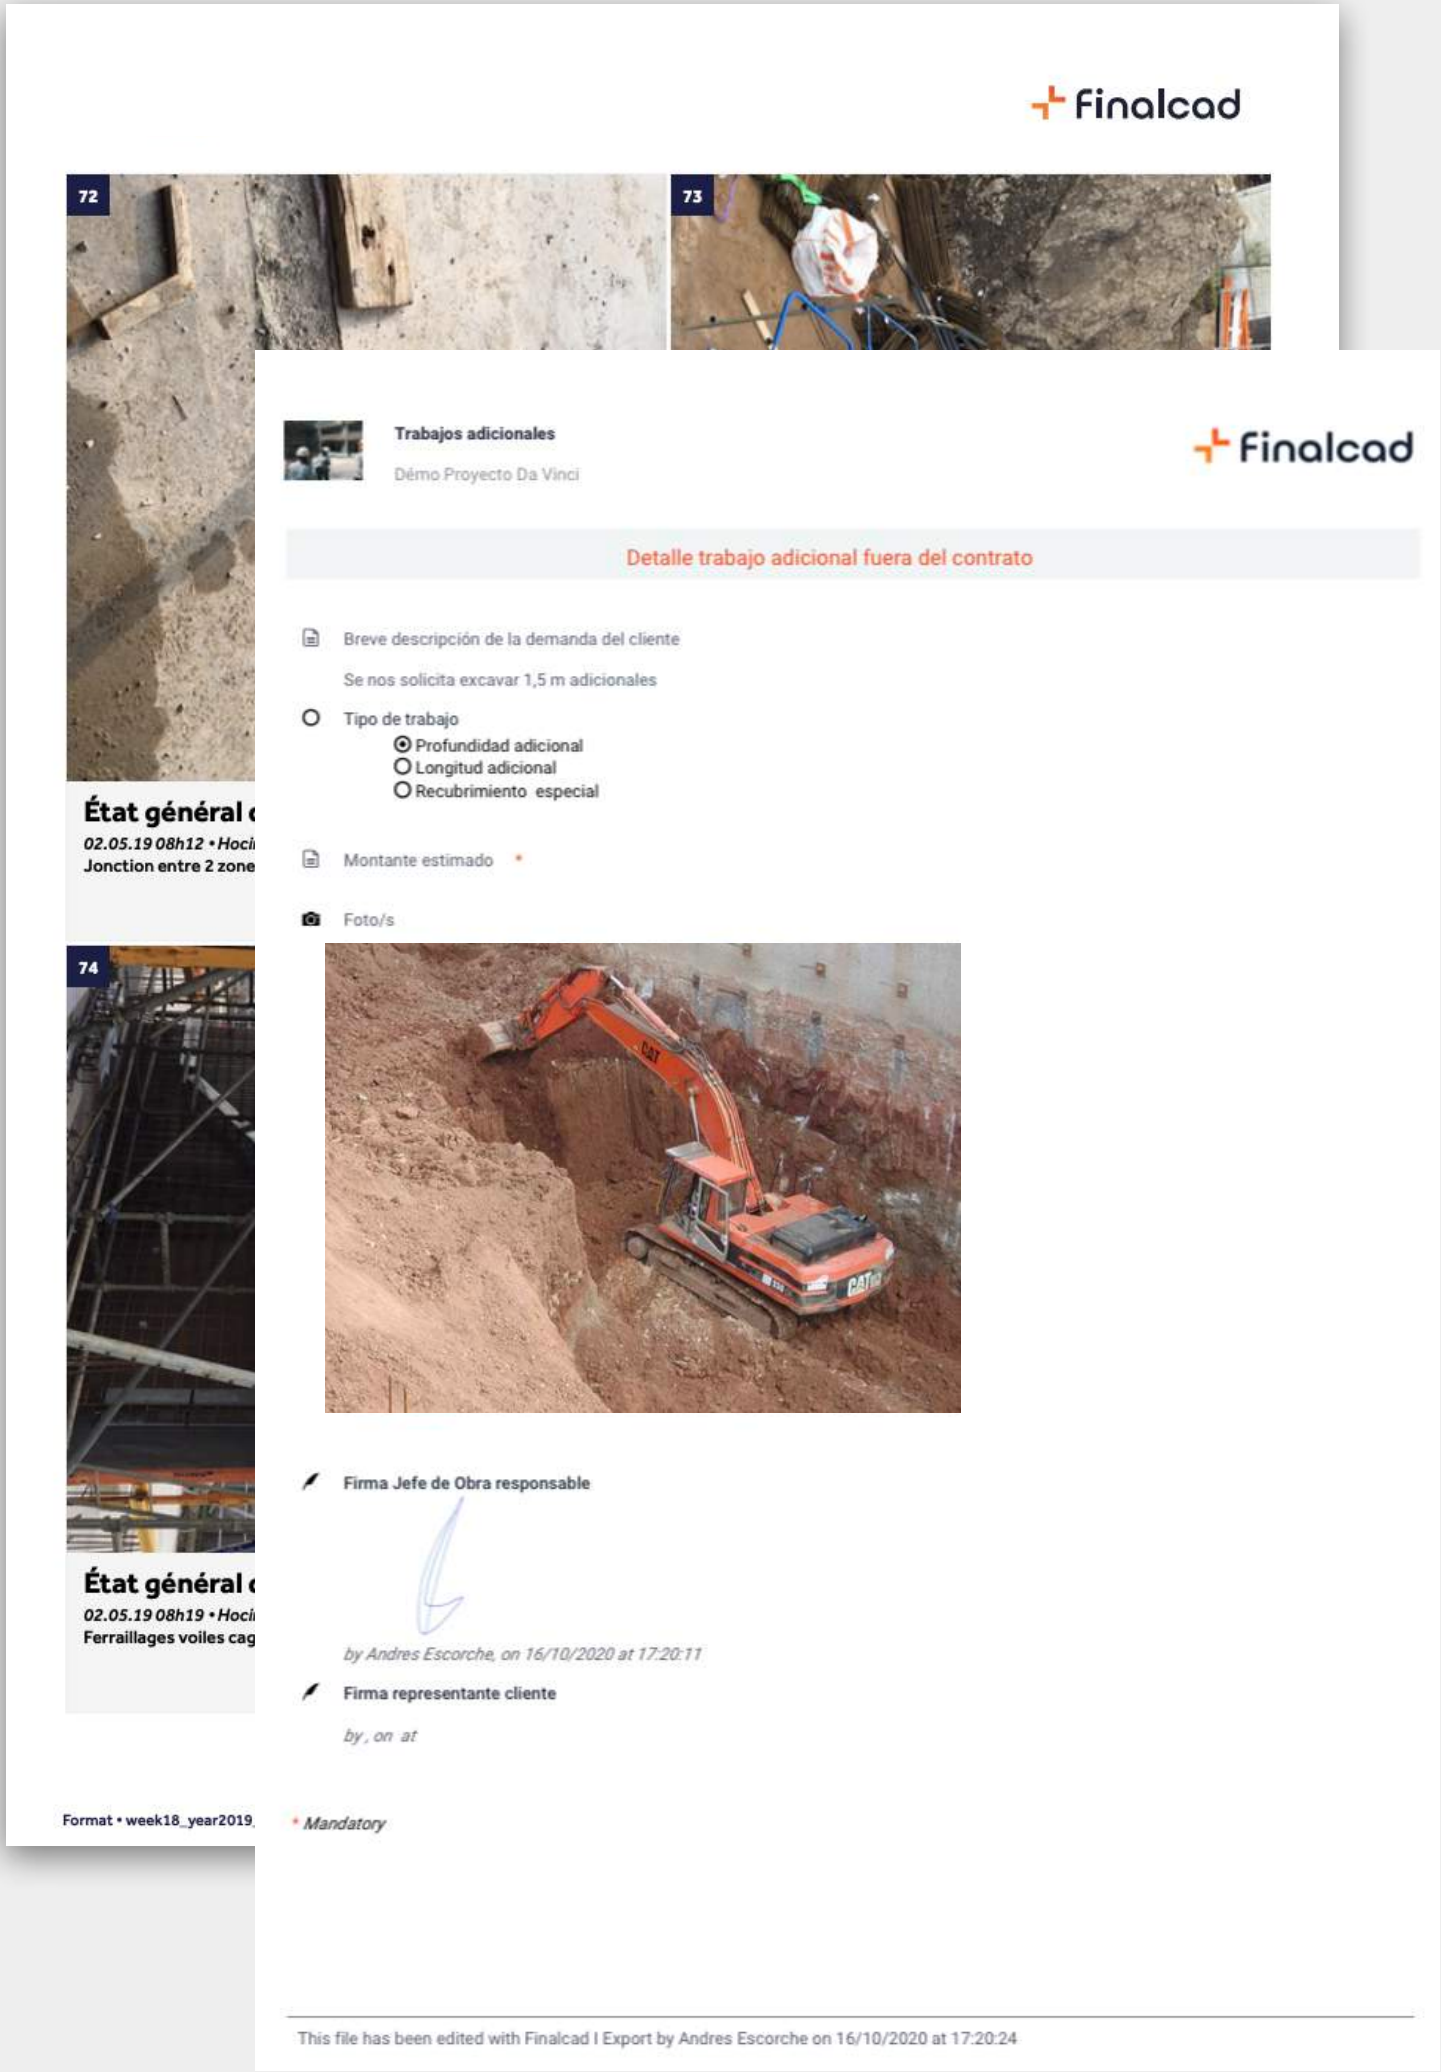

Jefe de Obra

CONTRATISTA | CLIENTE

CONTEXTO CLIENTE

Obra estructuras
Trabajos formalizados



EDIFICACION
INFRASTRUCTURAS



BENEFICIOS

- Reporte del avance semanal
- Archivado en la nube y accesible
- Diario de obra digital en tiempo real

+20%
Trabajos adicionales facturados al cliente

Realizar auditoría de PRL a pie de Obra

<

Guardar

Visita de Prevención Segurid...

Estado general de la obra

Vías de circulación (internas y externas)

Limpieza de la zona de trabajo


Desechos a evacuar

Equipos de protección individual

Botas de seguridad

Casco

Protección en la obra



Constatación de visita obra - PRL

Obra Da Vinci Seguridad

Finalcad

Obra Da Vinci Seguridad

Export Date: 19/10/2020 at 14:52:12 by Andres Escorche
Created by Andres Escorche on 19/10/2020 at 14:51:30
Last modify by Andres Escorche on 19/10/2020 at 14:51:30

Constatación de visita obra - PRL

Visita de obra

Situación en el momento de la visita

Tipo de revisión

☐ Estado general de obra

☒ Equipos de protección individual - EPI

☐ Herramientas

☐ Anclaje de Andamios

☐ Maquinaria, gruas y equipos

☐ Electricidad/Gas

Foto/s

Descripción

Utilización de arnés de seguridad y bloque retráctil de cinta para aproximación al batache abierto

Conformidad

Firma inspector

by Andres Escorche, on 19/10/2020 at 14:51:47

Mandatory

This file has been edited with Finalcad | Exported by Andres Escorche on 19/10/2020 at 14:52:12


Informe enviado a la
Propiedad

Auditor QSE

DF | PROPIEDAD | CONTRATISTA

CONTEXTO CLIENTE

Auditor HSE interno
Puesta en marcha de estrategia de revisión protocolos PRL




BENEFICIOS

- Integración de control digital
- Información en la nube y accesible
- Ponderación de riesgos y cálculo de índices de riesgo


+25%
en número de auditorías realizadas

-10%
Tasa de incidentes que conllevan retrasos en obra

Formalizar órdenes y registrar No Conformidades en la ejecución

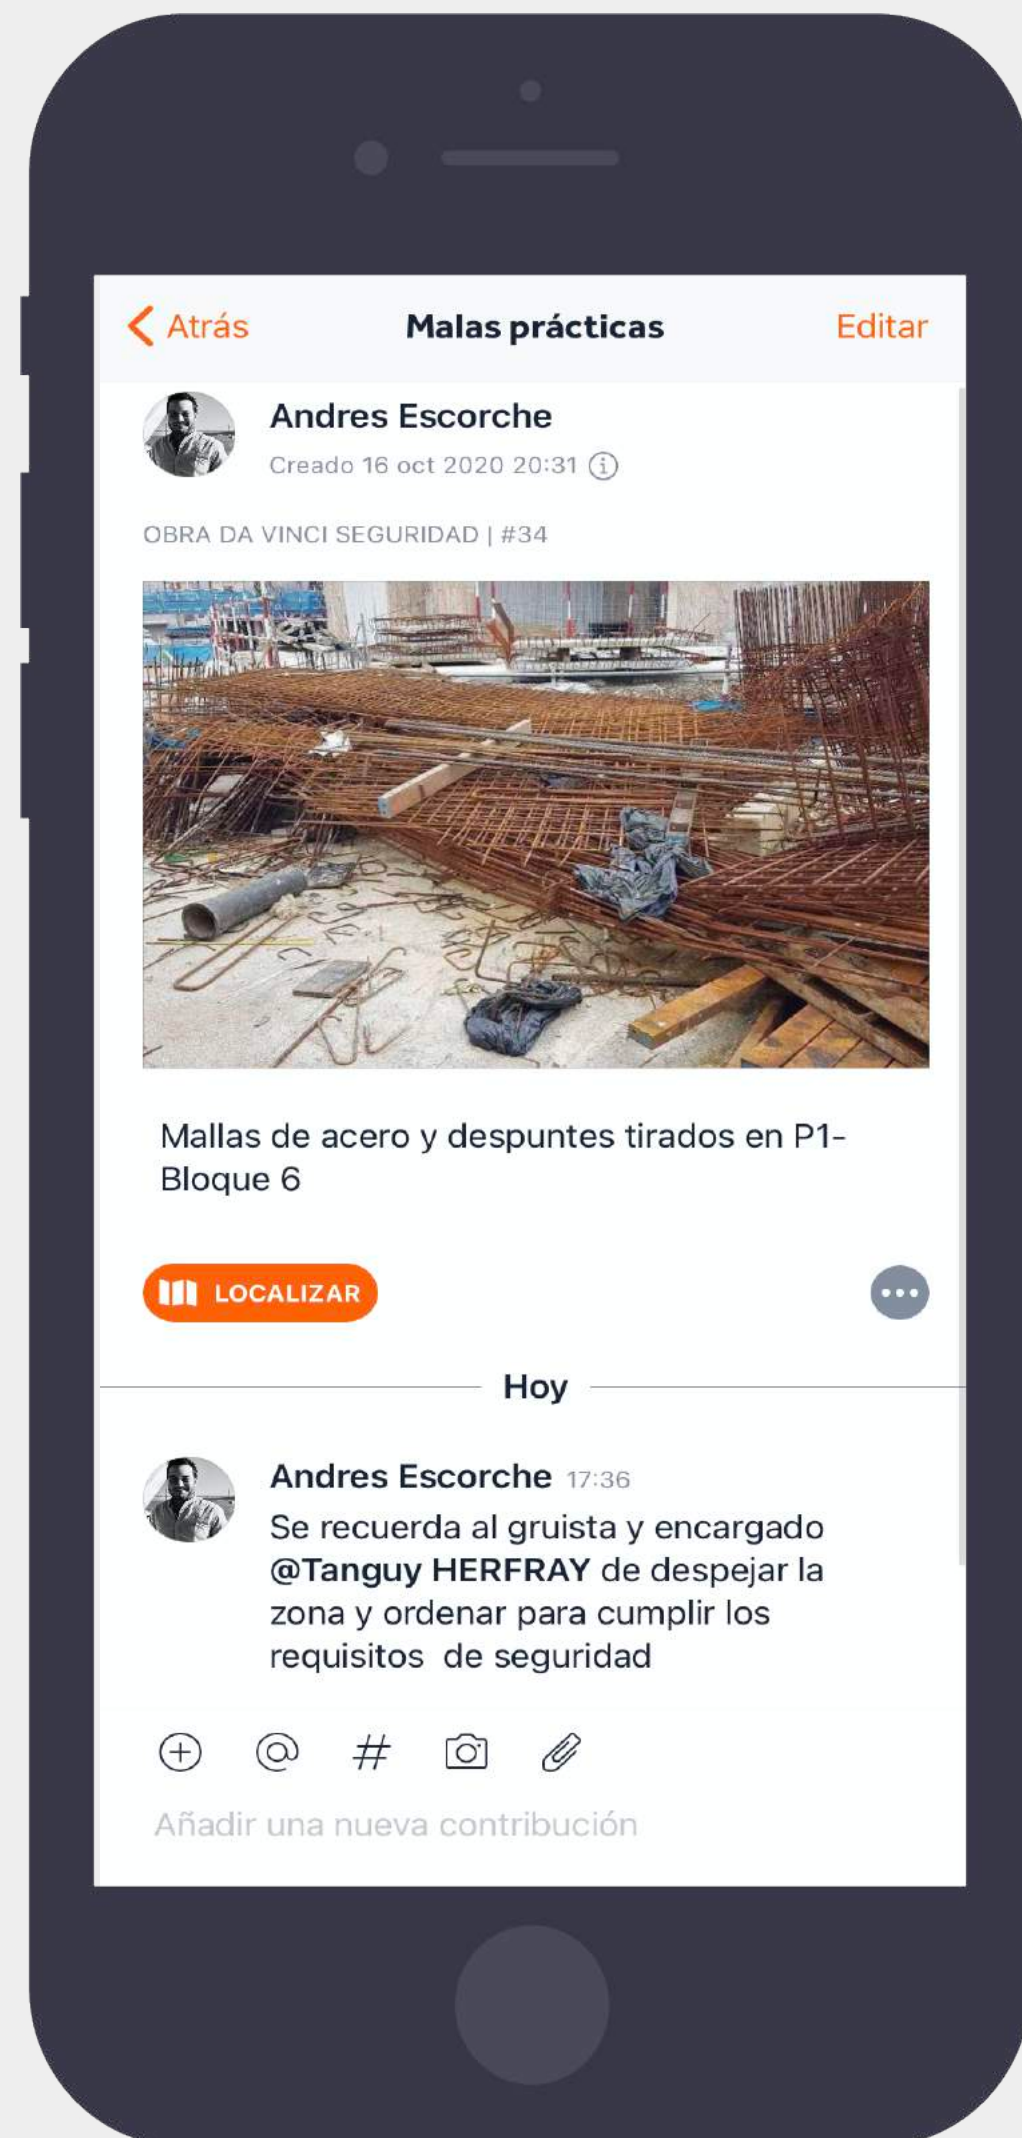

Técnico QSE



Informe de No Conformidad
Obra Da Vinci Seguridad

Finalcad

Export Date: 19/10/2020 at 15:17:17 by Andres Escorche
Created by Andres Escorche on 19/10/2020 at 15:12:49
Last modify by Andres Escorche on 19/10/2020 at 15:12:49

Informe de No Conformidad

FASE: EJECUCIÓN DE OBRA

Descripción de NC

Fecha emisión

Descripción

Coqueras al desencostrar alzado cara exterior de muro M2.45

Foto/s

Causas

Vibración incorrecta

Firma del responsable

by Andres Escorche, on 19/10/2020 at 15:15:19

Clasificación

X

* Mandatory

This file has been edited with Finalcad | Exported by Andres Escorche on 19/10/2020 at 15:17:17

Utilización de arnés de seguridad y bloque retráctil de cinta para aproximación al batache abierto y medición de la profundidad de la pantalla

Barandilla en la excavación con líneas de vida. Barandilla en murete guía tras el hormigonado


Acta de visita a las partes interesadas

DF | PROPIEDAD | CONTRATISTA

CONTEXTO CLIENTE

Infraestructura/ Estructuras

Formalizar informes



EDIFICACION INFRASTRUCTURAS



BENEFICIOS

Implicar en tiempo real a los operarios

Trazabilidad y visibilidad de N/C

Implementar acciones correctivas

-15%

prevención del riesgo accidentes


4 horas

**ahorradas en el reporting
semanal**

Gestionar las buenas y malas prácticas en Seguridad



Prevención

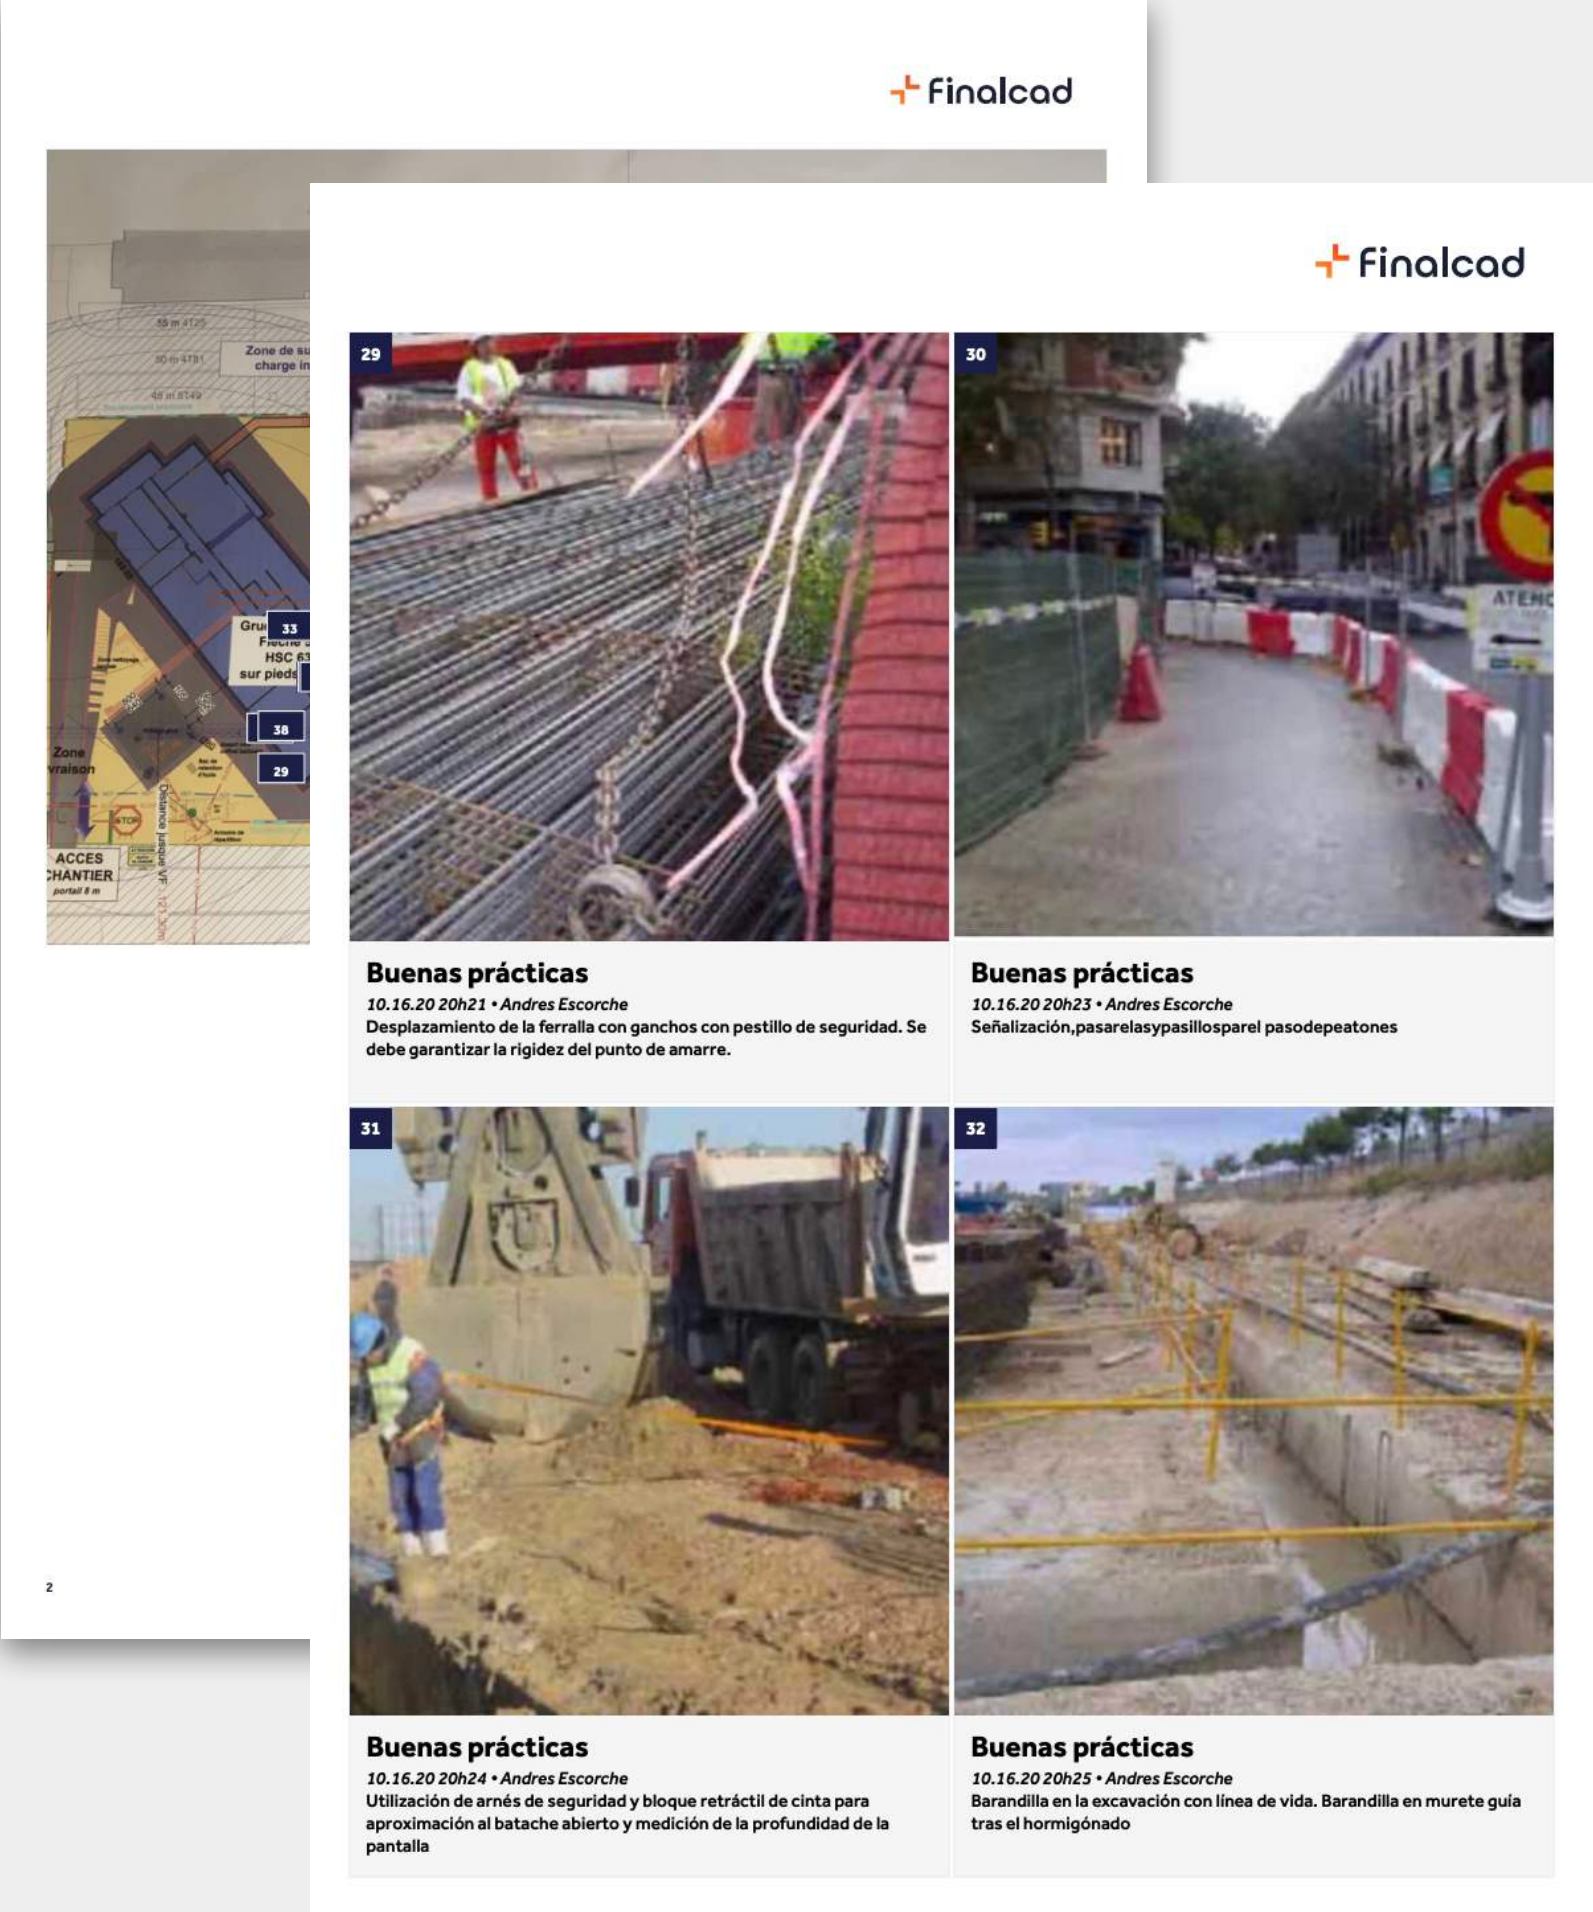


Jefe de Obra


CONTRATISTA | PROPIEDAD

CONTEXTO CLIENTE

Infraestructura/
Estructuras
Formalizar informes



EDIFICACION
INFRAESTRUCTURAS



BENEFICIOS

- Implementar acciones correctivas
- Implicar en tiempo real a los operarios
- Trazabilidad y visibilidad de N/C

-15%
prevención del riesgo
accidentes

4 horas
ahorradas en el reporting
semanal

Visita contradictoria en la Inspección de Calidad y generación de reporte in-situ

Cerrar

02 - CIMENTACIONES SUPERFIC...

7

5/12 campos obligatorios

Encofrado

Albañilería, Instalaciones y Acabados

Andres Escorche

16 oct 2020

11. CONDICIONES GENERALES

HORMIGONADO : Según especificaciones de Proyecto. *

FECHA

16 oct 2020

RESPONSABLE

JO

JP

ENC


DESPLEGABLE PLANOS DIGITALIZADOS

FOTO

FOTO : En el caso de cierre N/C

OBSERVACIONES

Hormigonado HA30, cono medio 13 cm



Finalcad

02 - CIMENTACIONES SUPERFICIALES #7

CATEGORÍA:: PPI Calidad

CONFORMIDAD:: EN PROGRESO

INSPECTOR: Andres Escorche

FECHA: 16/10/20

DEFINICIÓN PUNTOS DE CONTROL

1. VERTIDO y horizonte. HORMIGÓN LIMPIEZA : según proyecto *

Conforme

No conforme

Irrelevante

FECHA

16/10/20

RESPONSABLE

JP

DESPLEGABLE PLANOS DIGITALIZADOS

FOTO

FOTO : En el caso de cierre N/C

OBSERVACIONES

2. FORMA Y DIMENSIONES EN PLANTA Y CANTOS : según proyecto *

Conforme

No conforme

Irrelevante

FECHA

16/10/20

RESPONSABLE

JP

DESPLEGABLE PLANOS DIGITALIZADOS

FOTO

FOTO : En el caso de cierre N/C

OBSERVACIONES

3. UBICACIÓN DE CONDUCTAS Y ARQUETAS : según proyecto *

Conforme

No conforme

Irrelevante

FECHA

16/10/20

FINALCAD Proiet Residence Euroopa Espanol 02 - CIMENTACIONES SUPERFICIALES 10-16-2020 18-10-51-249.pdf

1 of 4

Acta de conformidad

Dirección Obra/ Contratista

CONTRATISTA | DF

CONTEXTO CLIENTE

Estructuras
Informes estructurados
Aplicación Plan Calidad



EDIFICACION
INFRAESTRUCTURAS



BENEFICIOS

Formalización de los PPI
Registro y archivo digital
Seguimiento de no conformidades
Mejora continua


4h

en preparación informes
menos por semana


-30%

en retrabajos por controles
preventivos de calidad

Control Calidad ejecutado in-situ

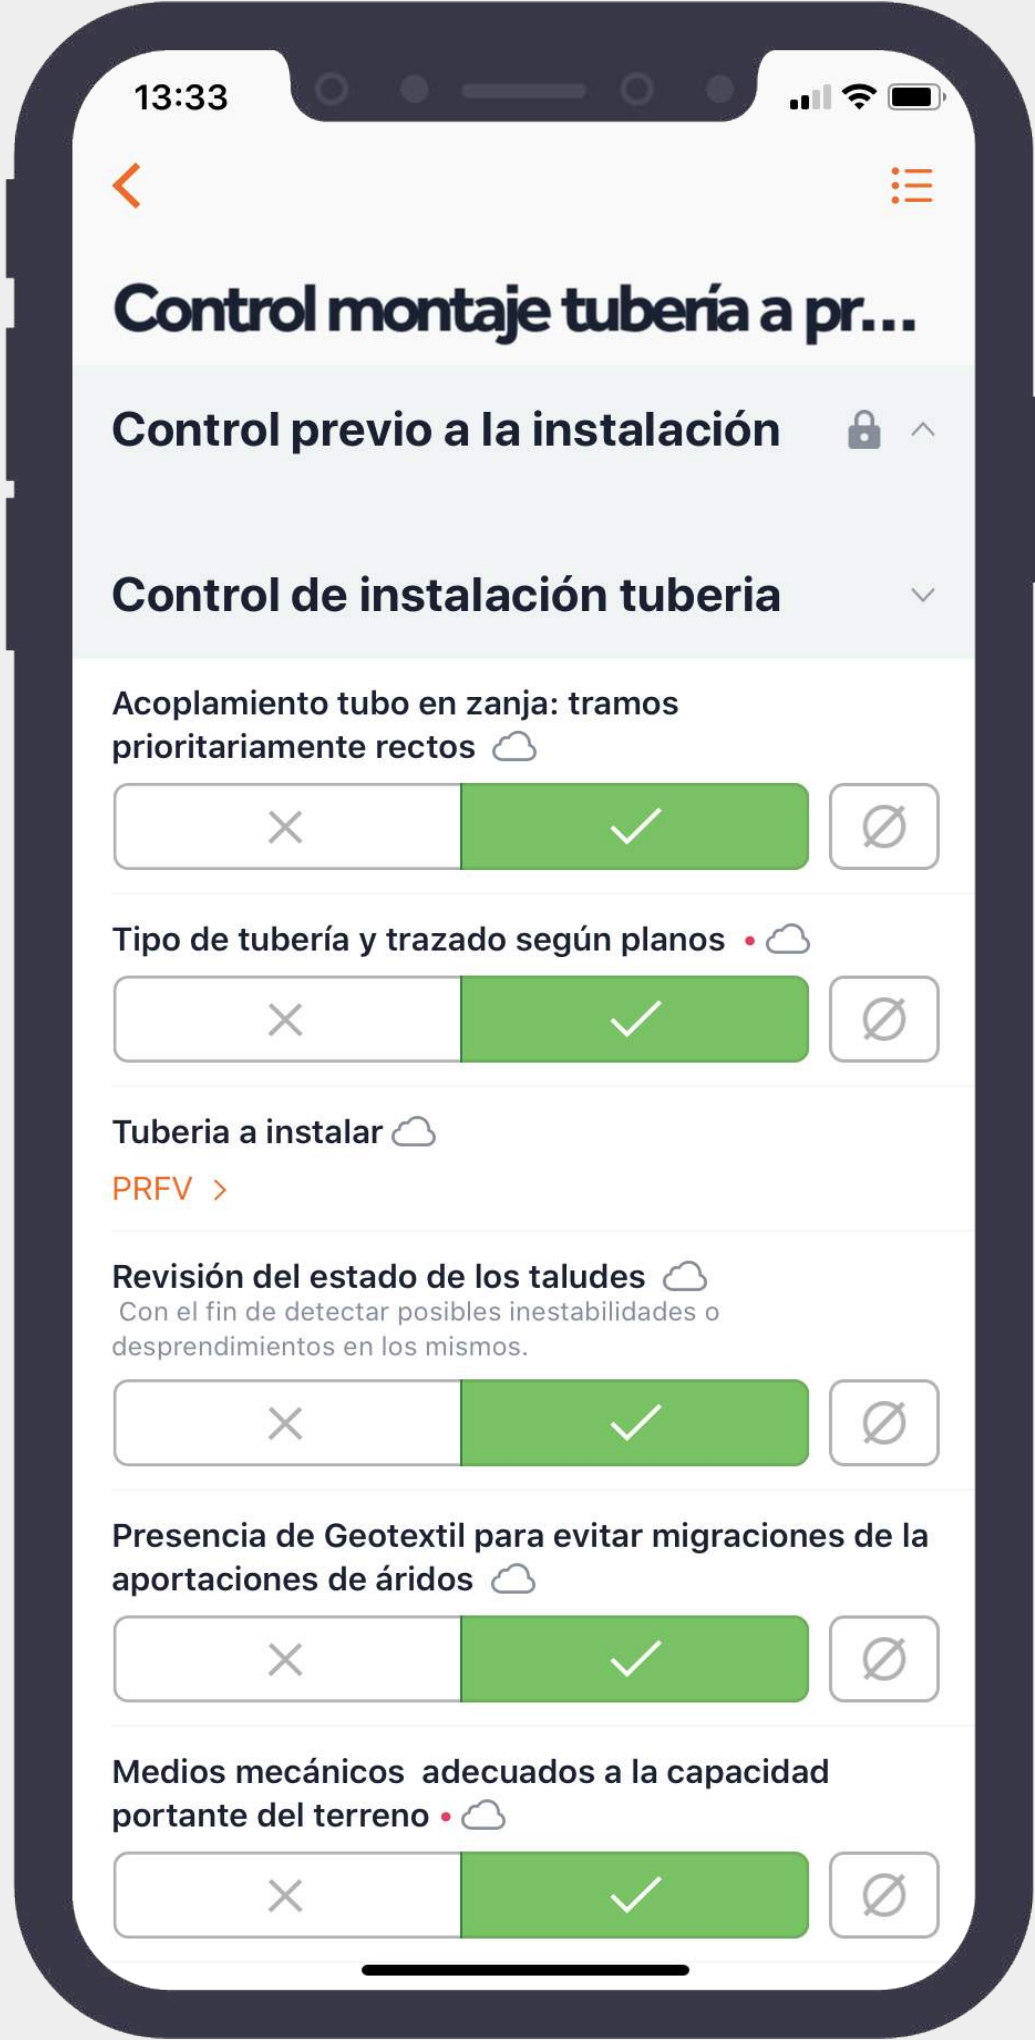

J. Producción/ J.Obra:
Visita de obra

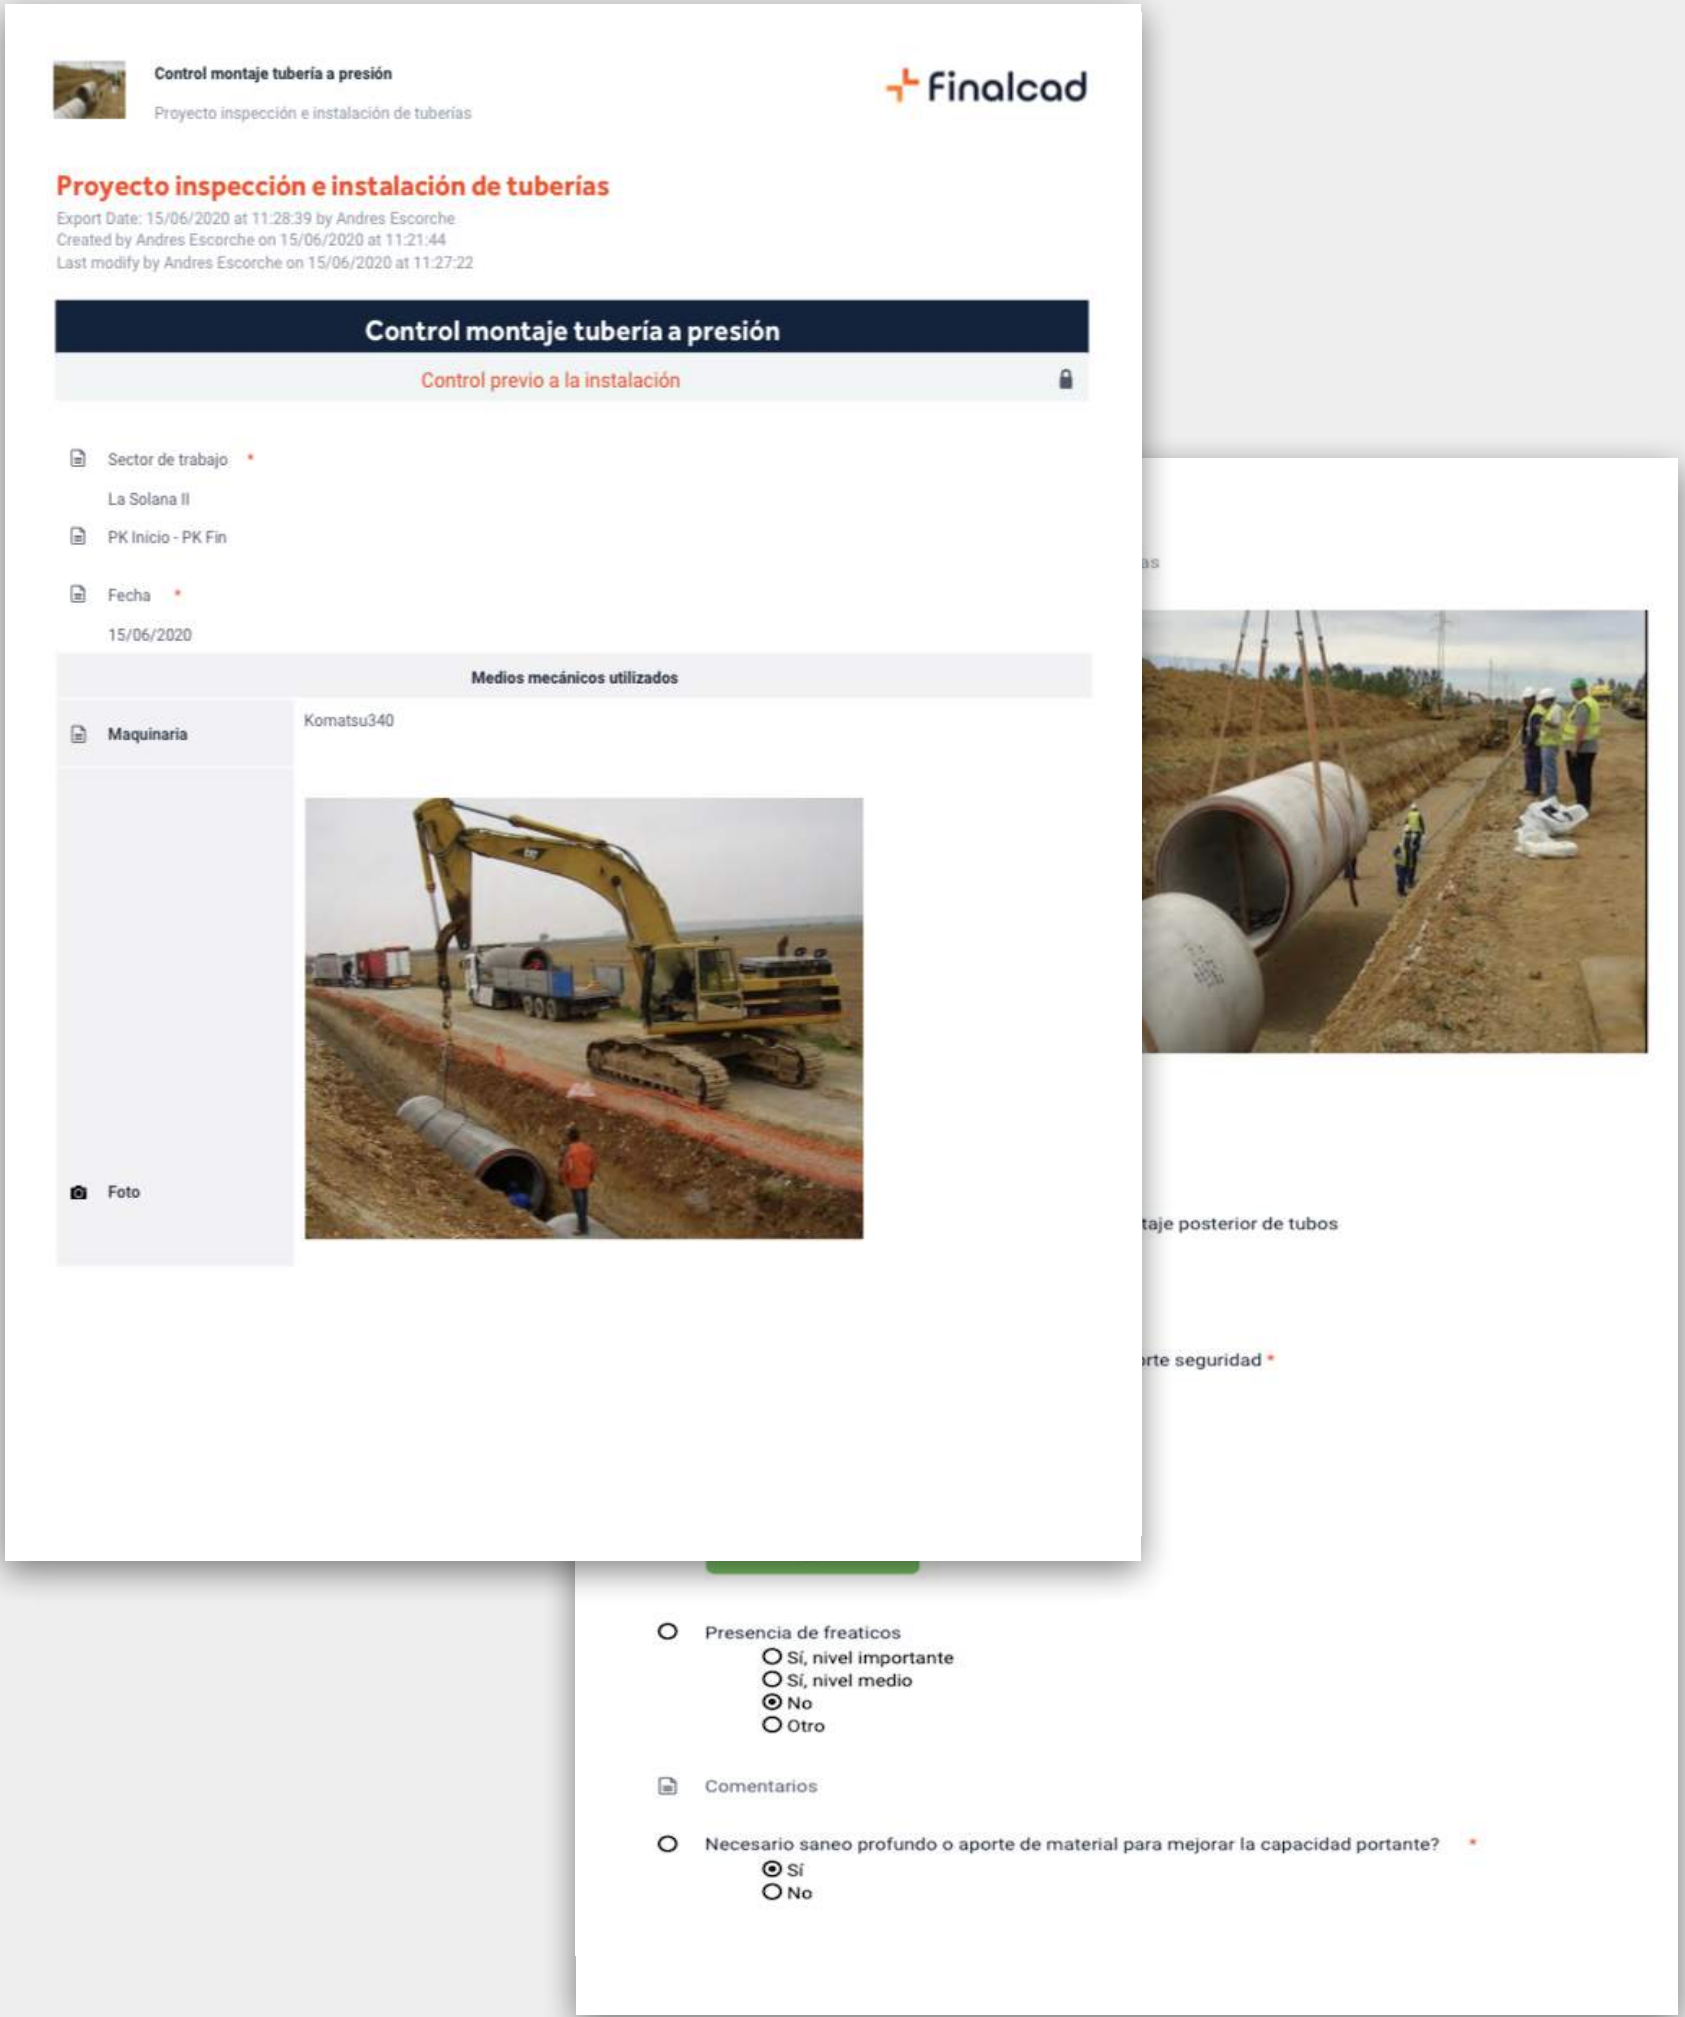


Jefe de Obra: Oficina


CONSTRATISTA | OBRA PUBLICA

CONTEXTO CLIENTE

Plan de prevención
Seguimiento diario
Plan de Calidad



EDIFICACION
INFRAESTRUCTURAS




BENEFICIOS

Despliegue instantáneo del P.Calidad
Trazabilidad de los controles realizados
Archivo digital, accesible en Auditorías
Mejora continua y reducción de N/C


-4h
por semana
en reporting

-20%
retrabajos
por proyecto

Puntos de parada durante controles externos

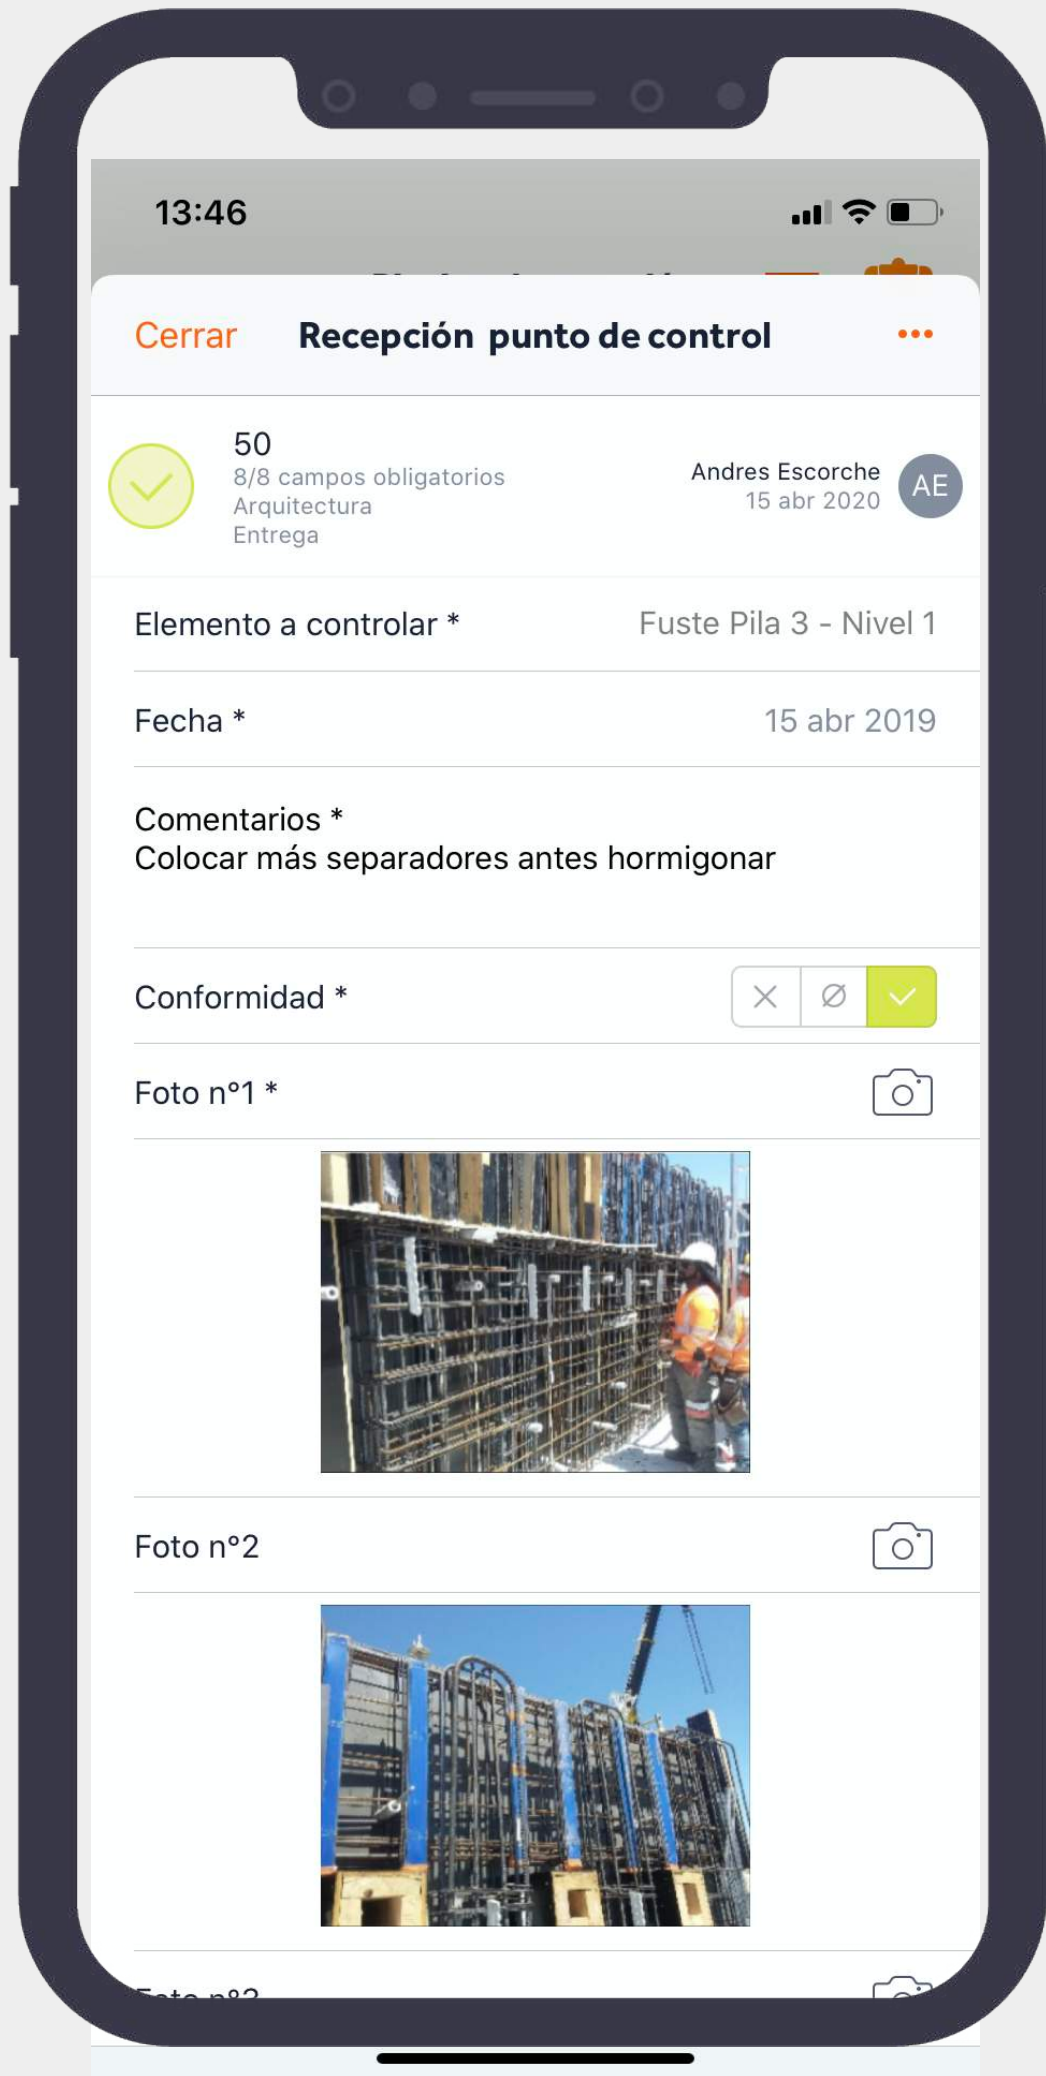

Jefe de Obra
& DF

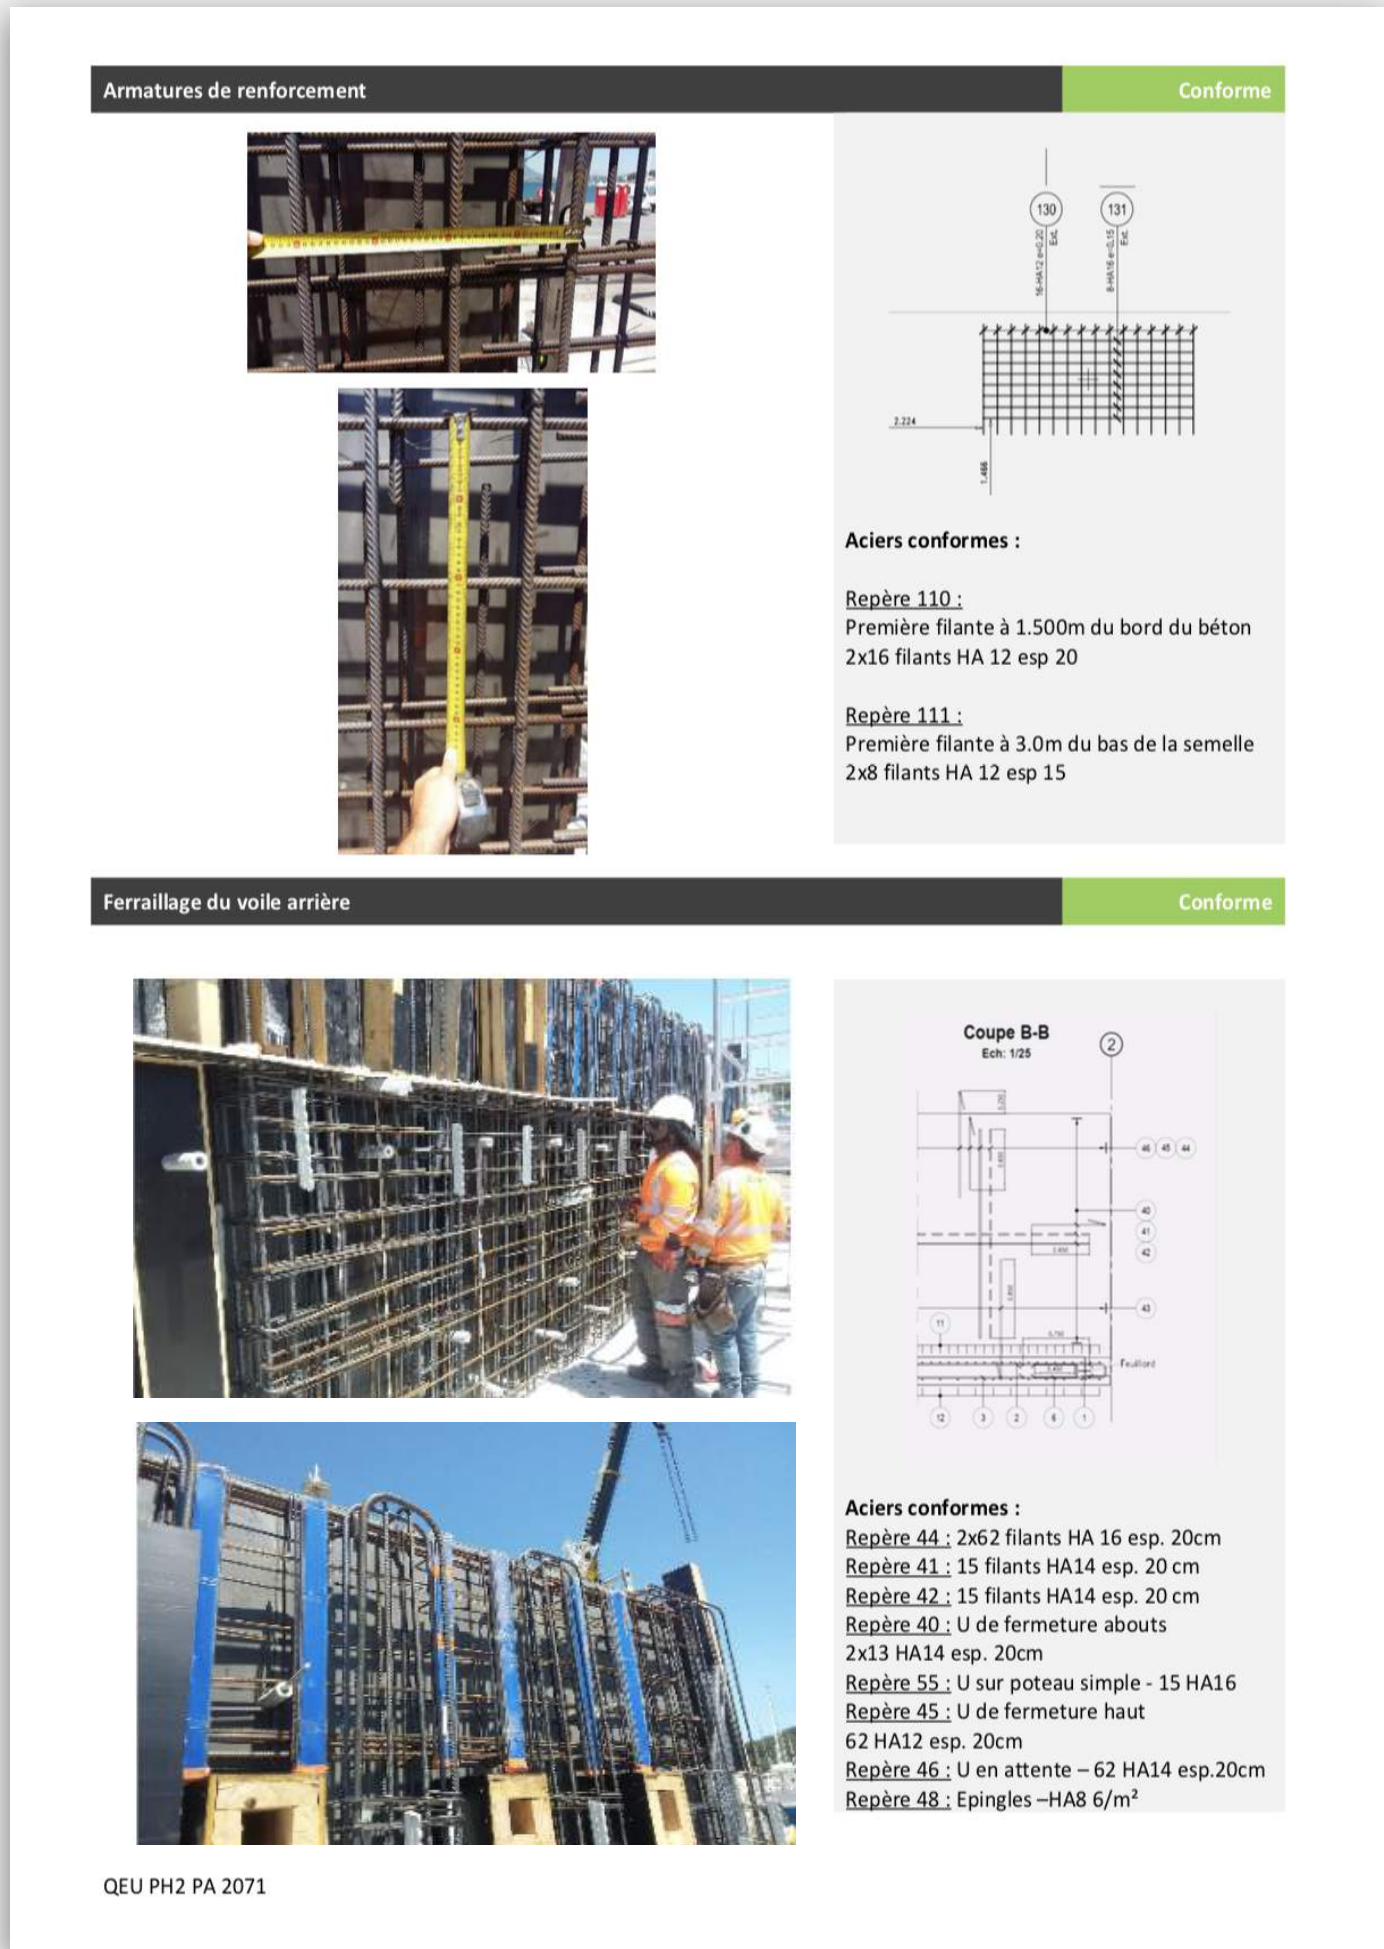

Propiedad


DF | CONTRATISTA PRINCIPAL

CONTEXTO CLIENTE

Obra Civil
Control calidad
Seguridad ejecución



INFRAESTRUCTURAS



BENEFICIOS

Minimizar tiempo
en la liberación de puntos parada
Acelerar la certificación
Transparencia
en compartir la información

+50%
en la liberación de puntos
de parada reduciendo
plazo

+0,5%
de margen operacional

Gestión de incidentes y no conformidades



Jefe de Obra



Project Manager/
Jefe de grupo


CONTRATISTA | OBRA PUBLICA

CONTEXTO CLIENTE

Supervision trabajos subcontratista
Situación real obra
Reclamaciones



EDIFICACION
INFRAESTRUCTURAS




BENEFICIOS

Control de facturación a través de informes detallados
Transmisión óptima obra-oficina
Reducción en el tiempo de correcciones


-20%
en el tiempo de corrección

Seguimiento de planificación de hitos de obra

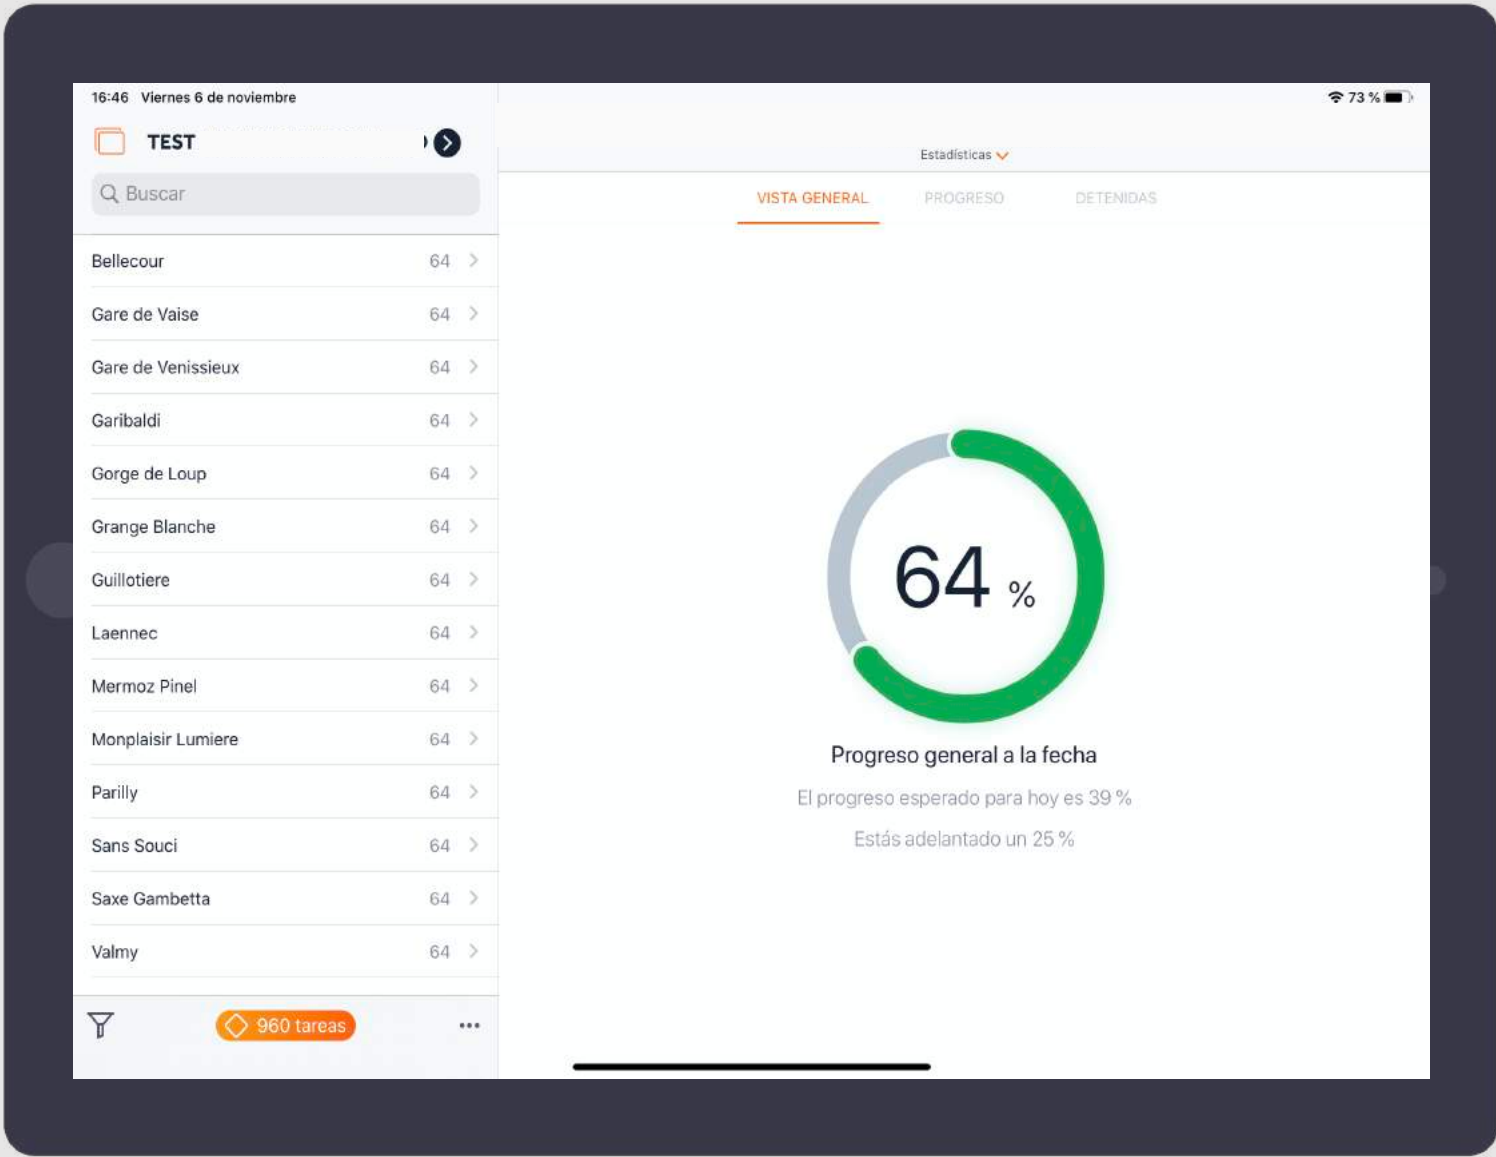

Progreso global

Jefe de Obra/Producción

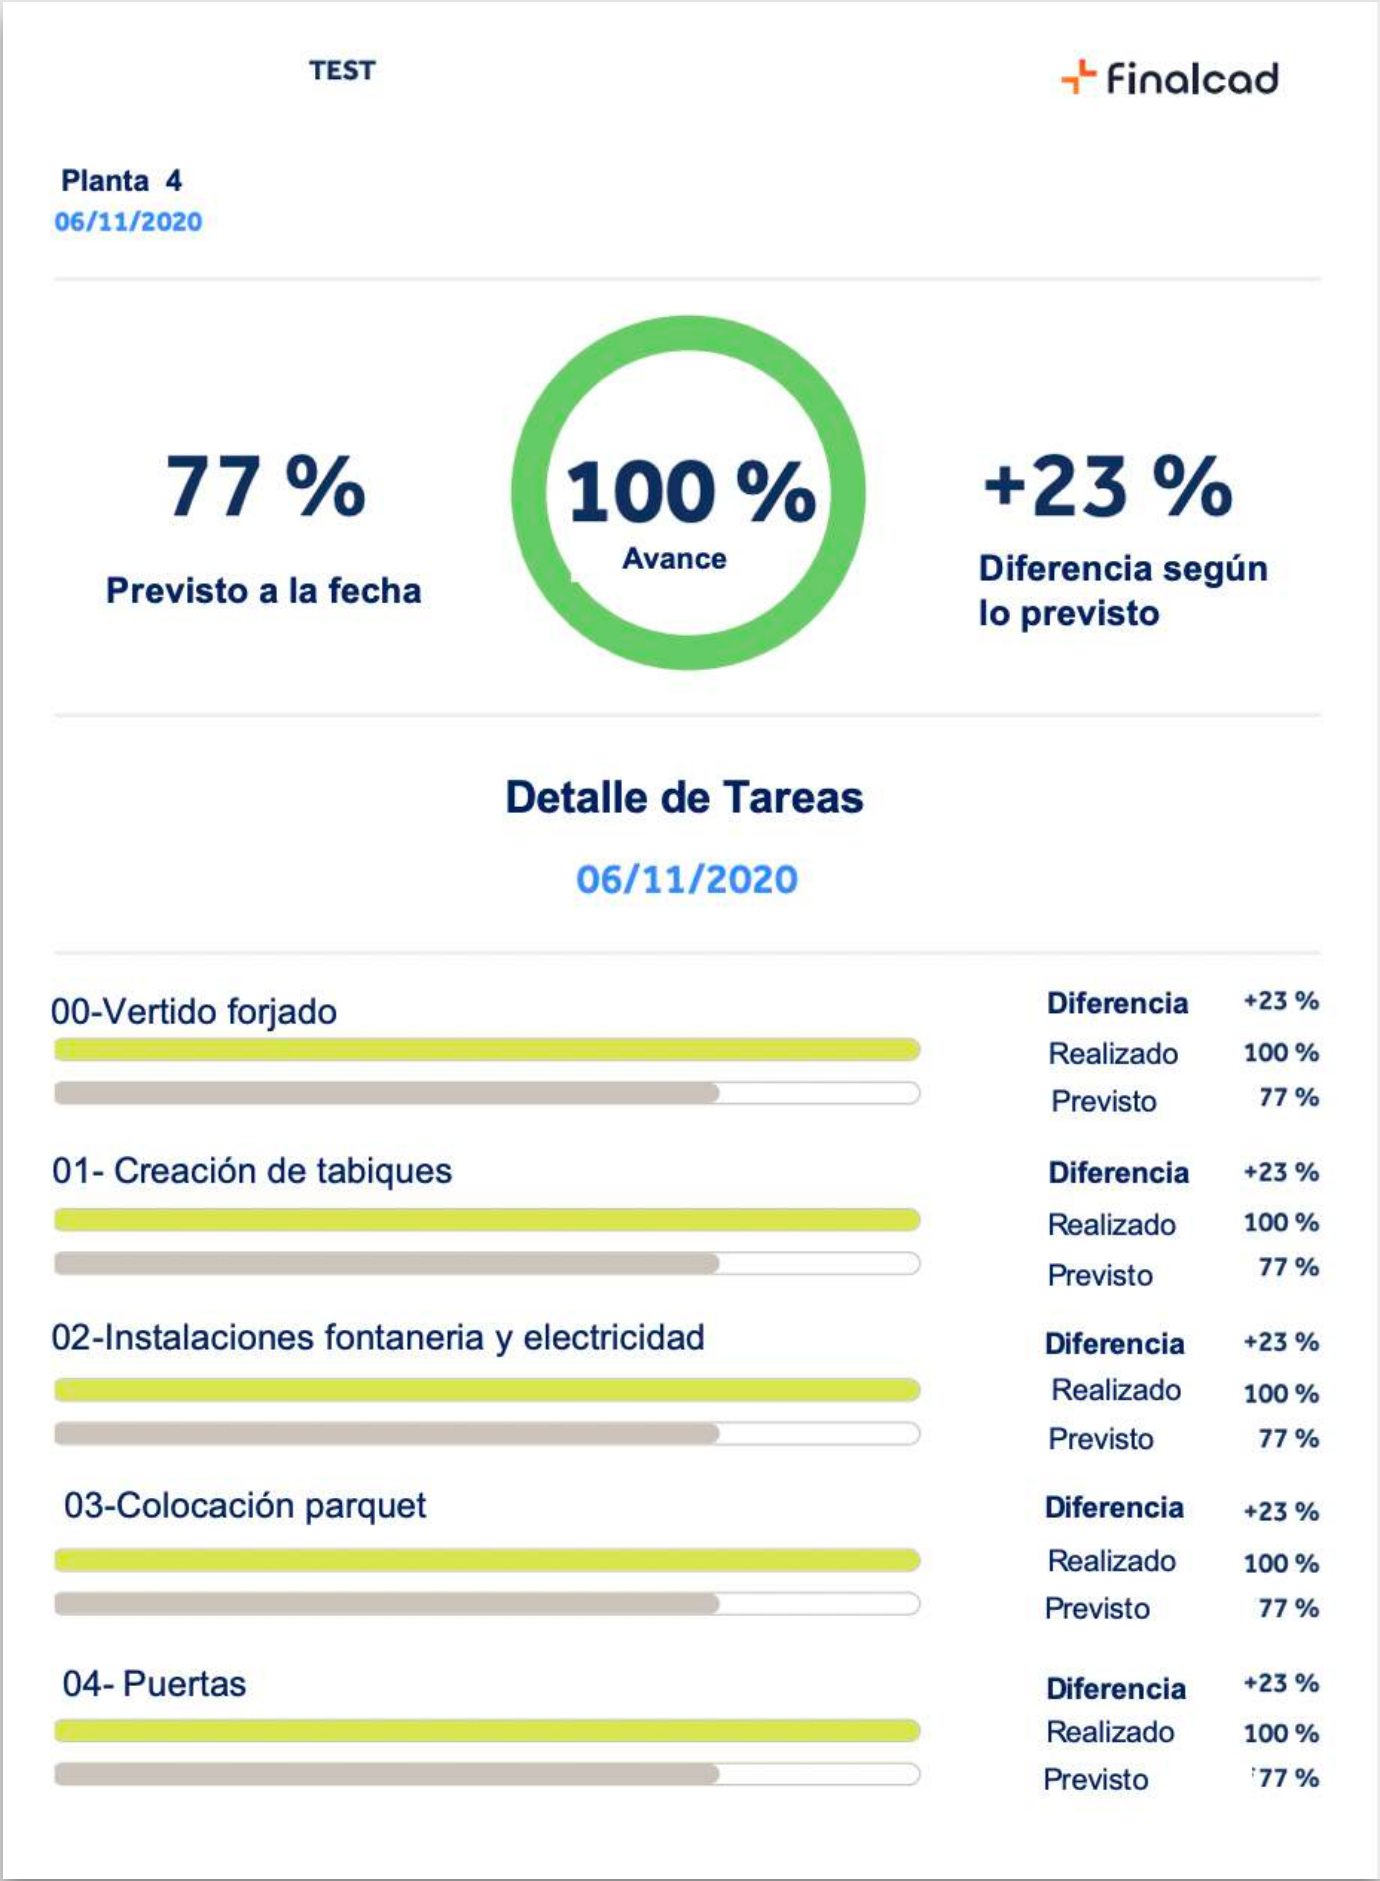

Progreso por sector

Director de proyecto/zona

PROPIEDAD | CONTRATISTA

CONTEXTO CLIENTE

Informes estandarizados.
Control avance real.
Identificar retrasos por sectores.



BENEFICIOS

Mejora comunicación entre el cliente y el equipo de obra

Seguimiento en tiempo real de macro hitos del proyecto

Justificar el avance e identificar bloqueos

-20%

de retrasos en obra, gracias a una mejor vigilancia


100%

visibilidad progreso real por Directores de Zona


2. Instalaciones y Acabados




Liberación de espacios : Permiso para cerrar falsos techos

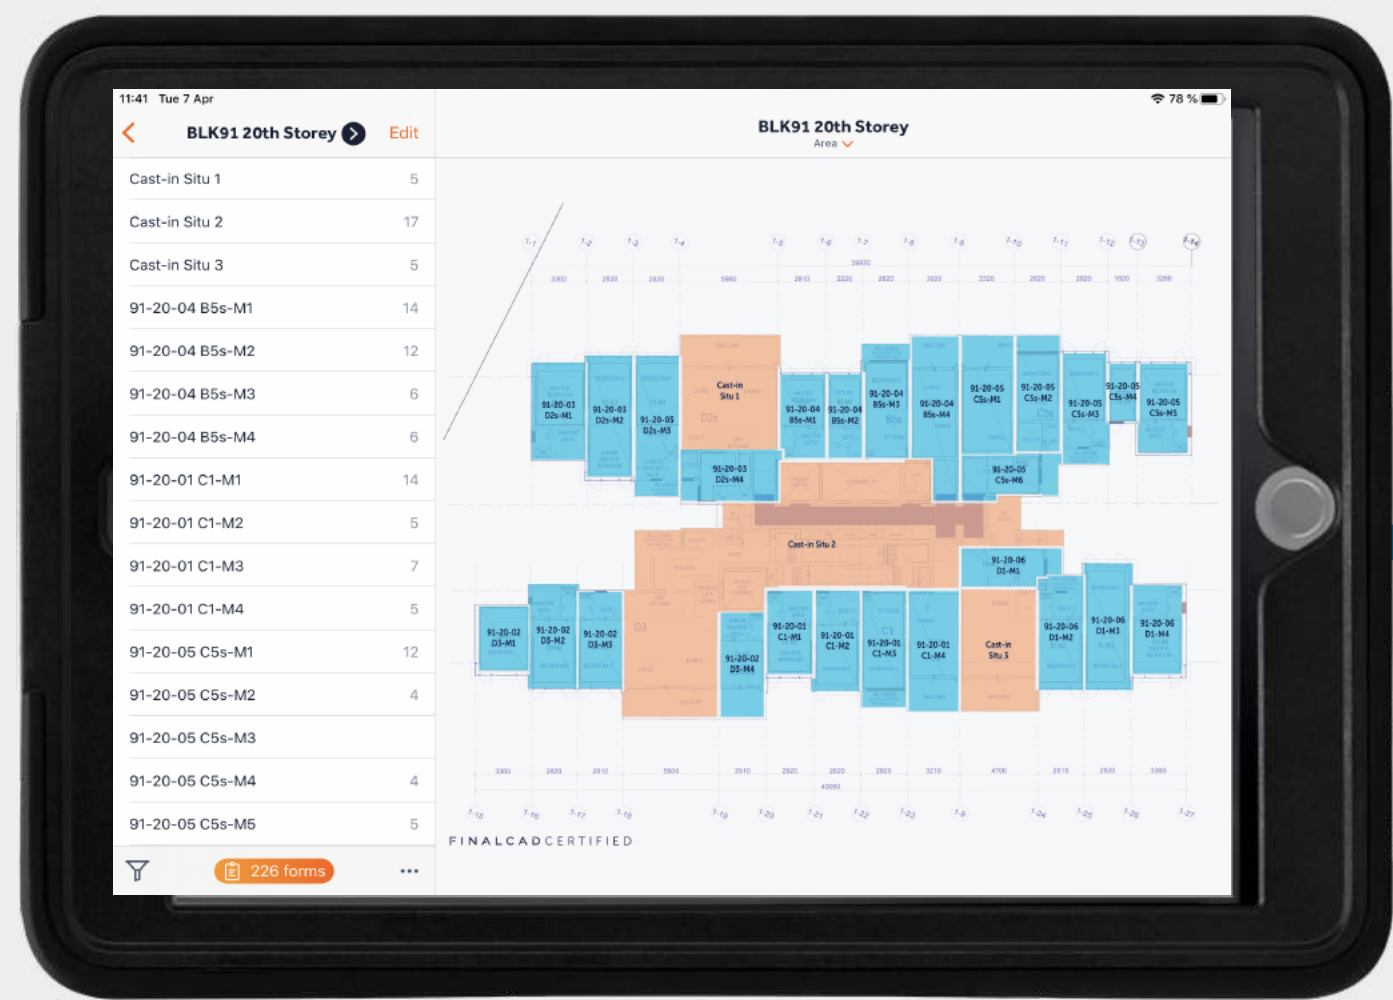

Identificar la zona

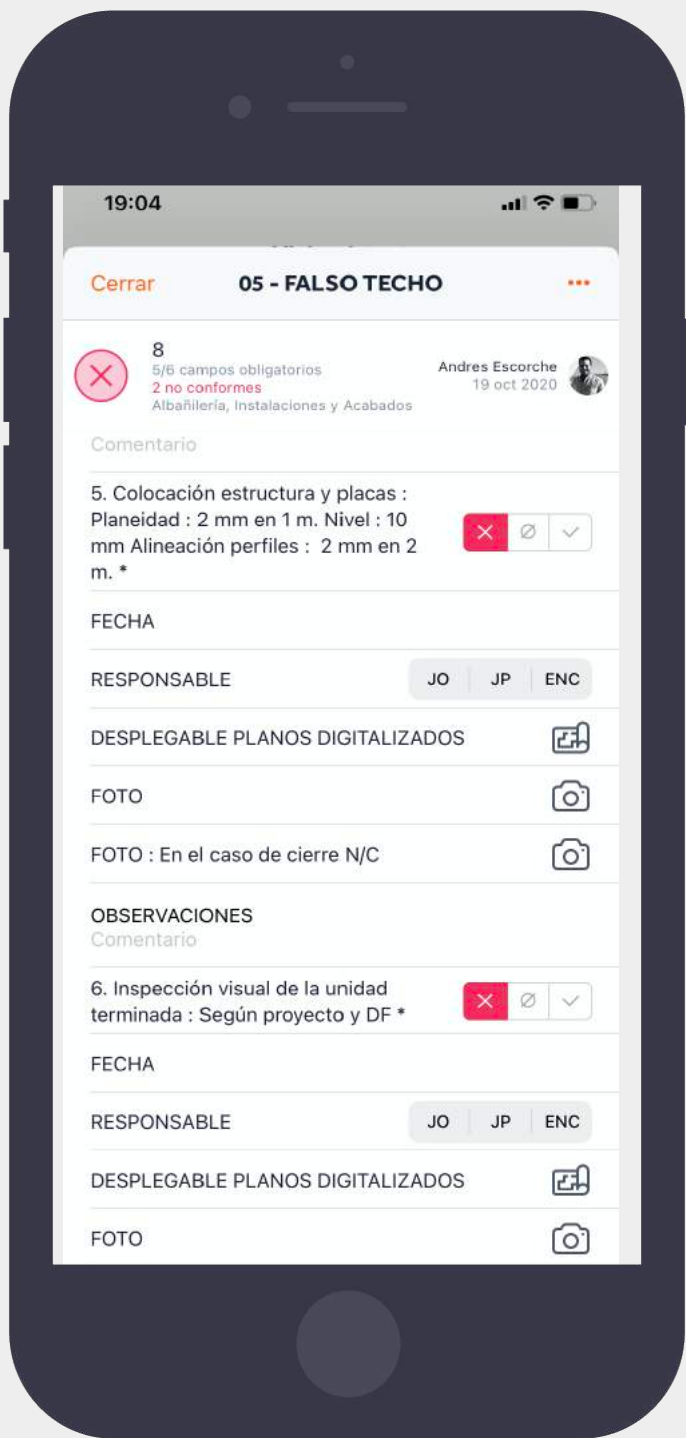


Establecer conformidad y
prevenir al equipo responsable

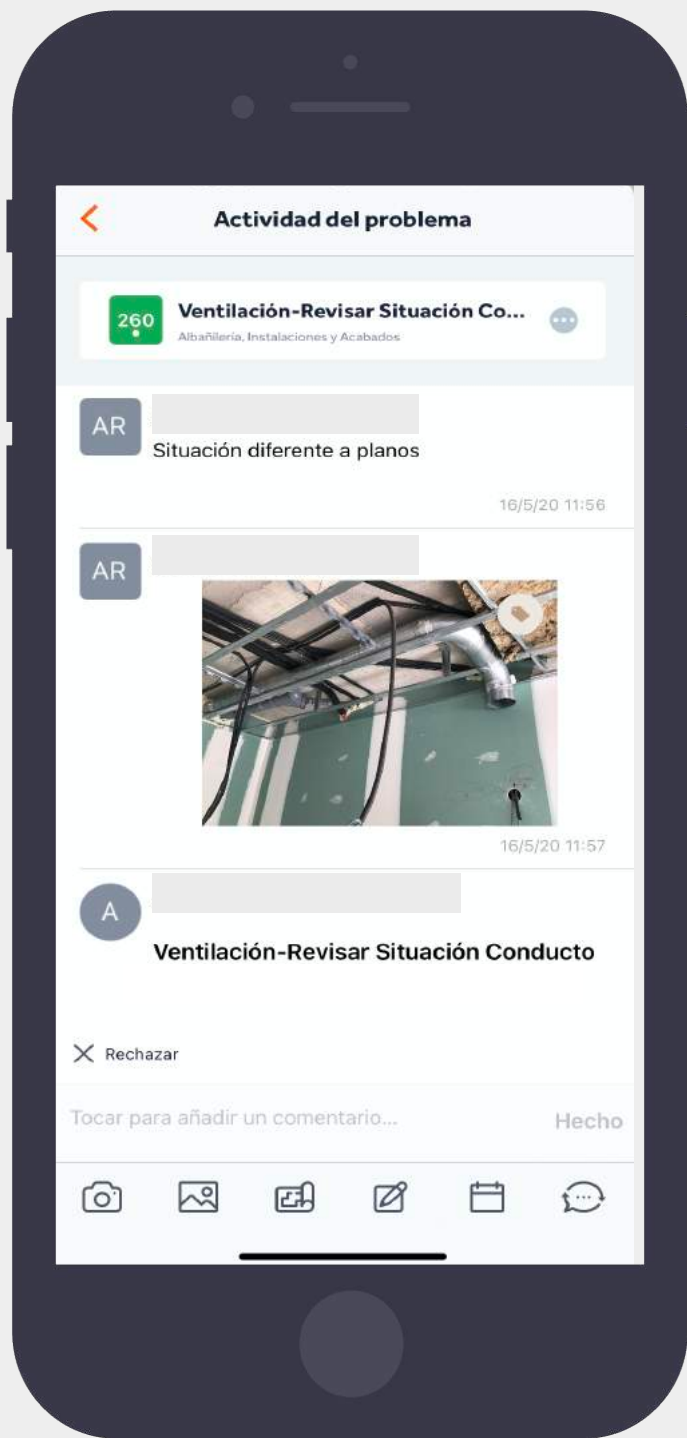

CONTRATISTA | DF

CONTEXTO CLIENTE

- Obra residencial
- Liberación zonas DF
- Optimización de tareas
- Coordinación equipos



EDIFICACION




BENEFICIOS

- Transparencia & colaboración entre las partes implicadas
- Evitar retrasos en planning + retrabajos
- Recepción parcial



2h
ahorradas por día en reporting
de equipos

-30%
en retrasos de entrega

Optimizar la gestión de repasos gracias a una visión consolidada

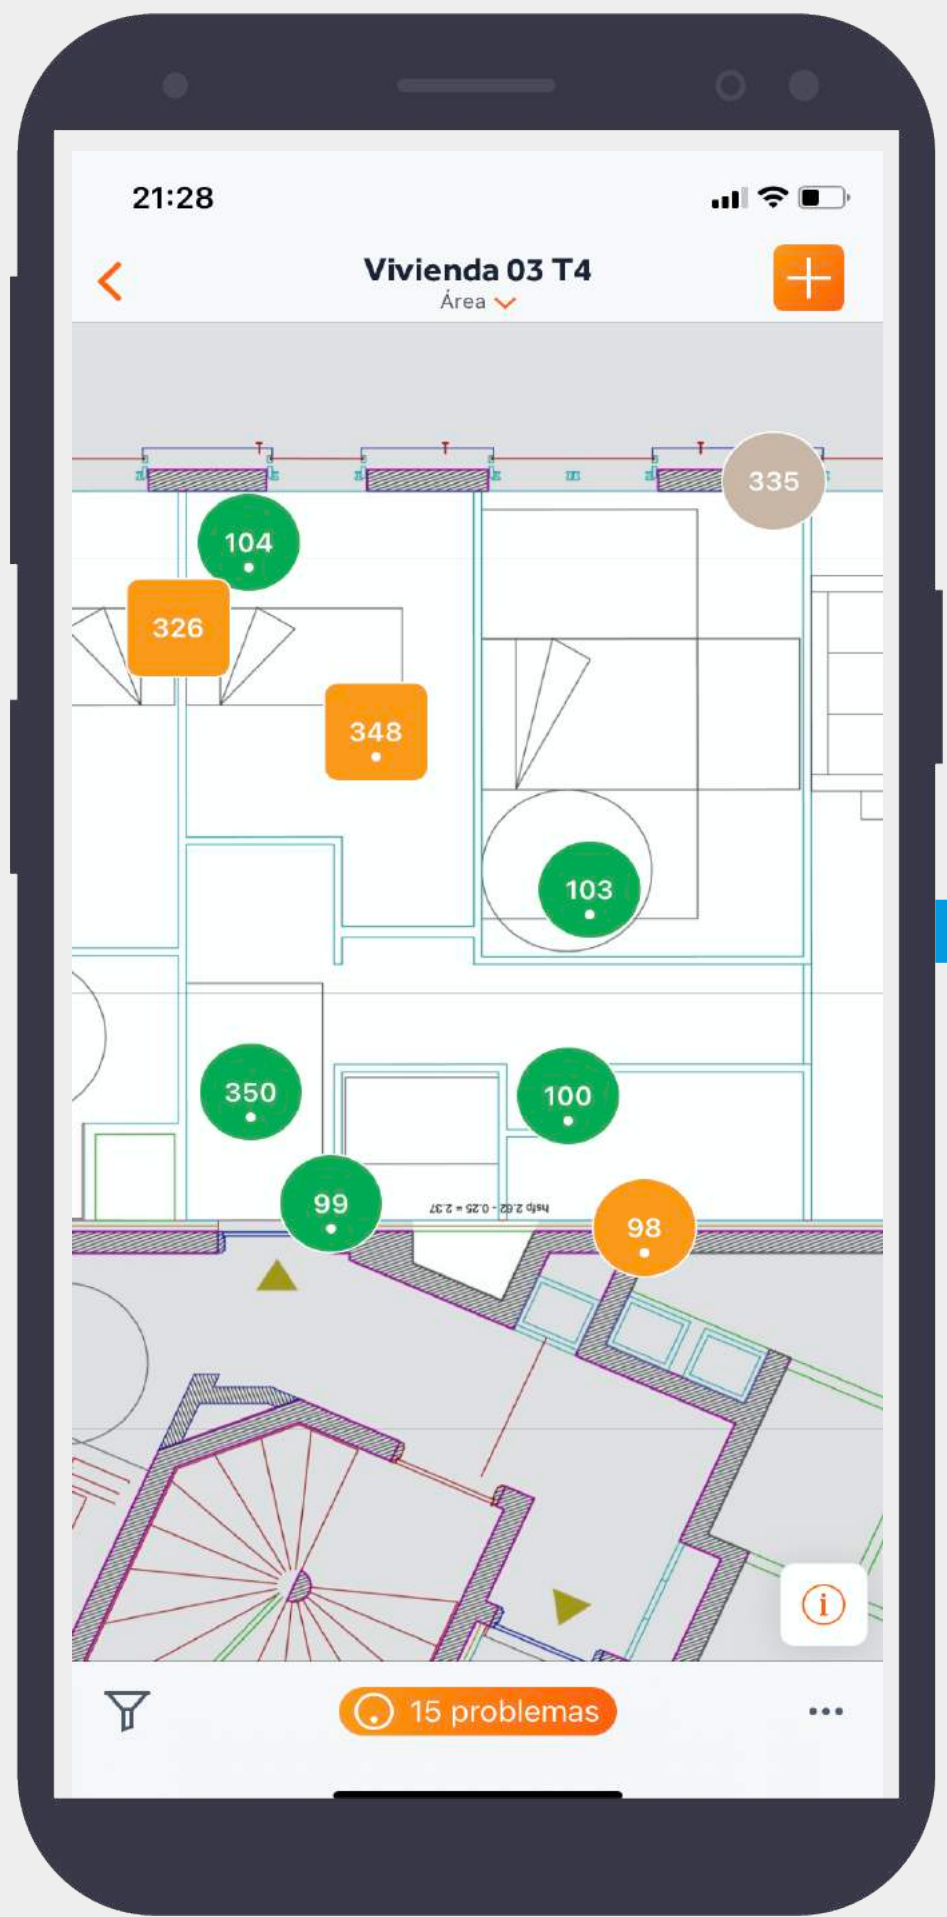

DF /Obra

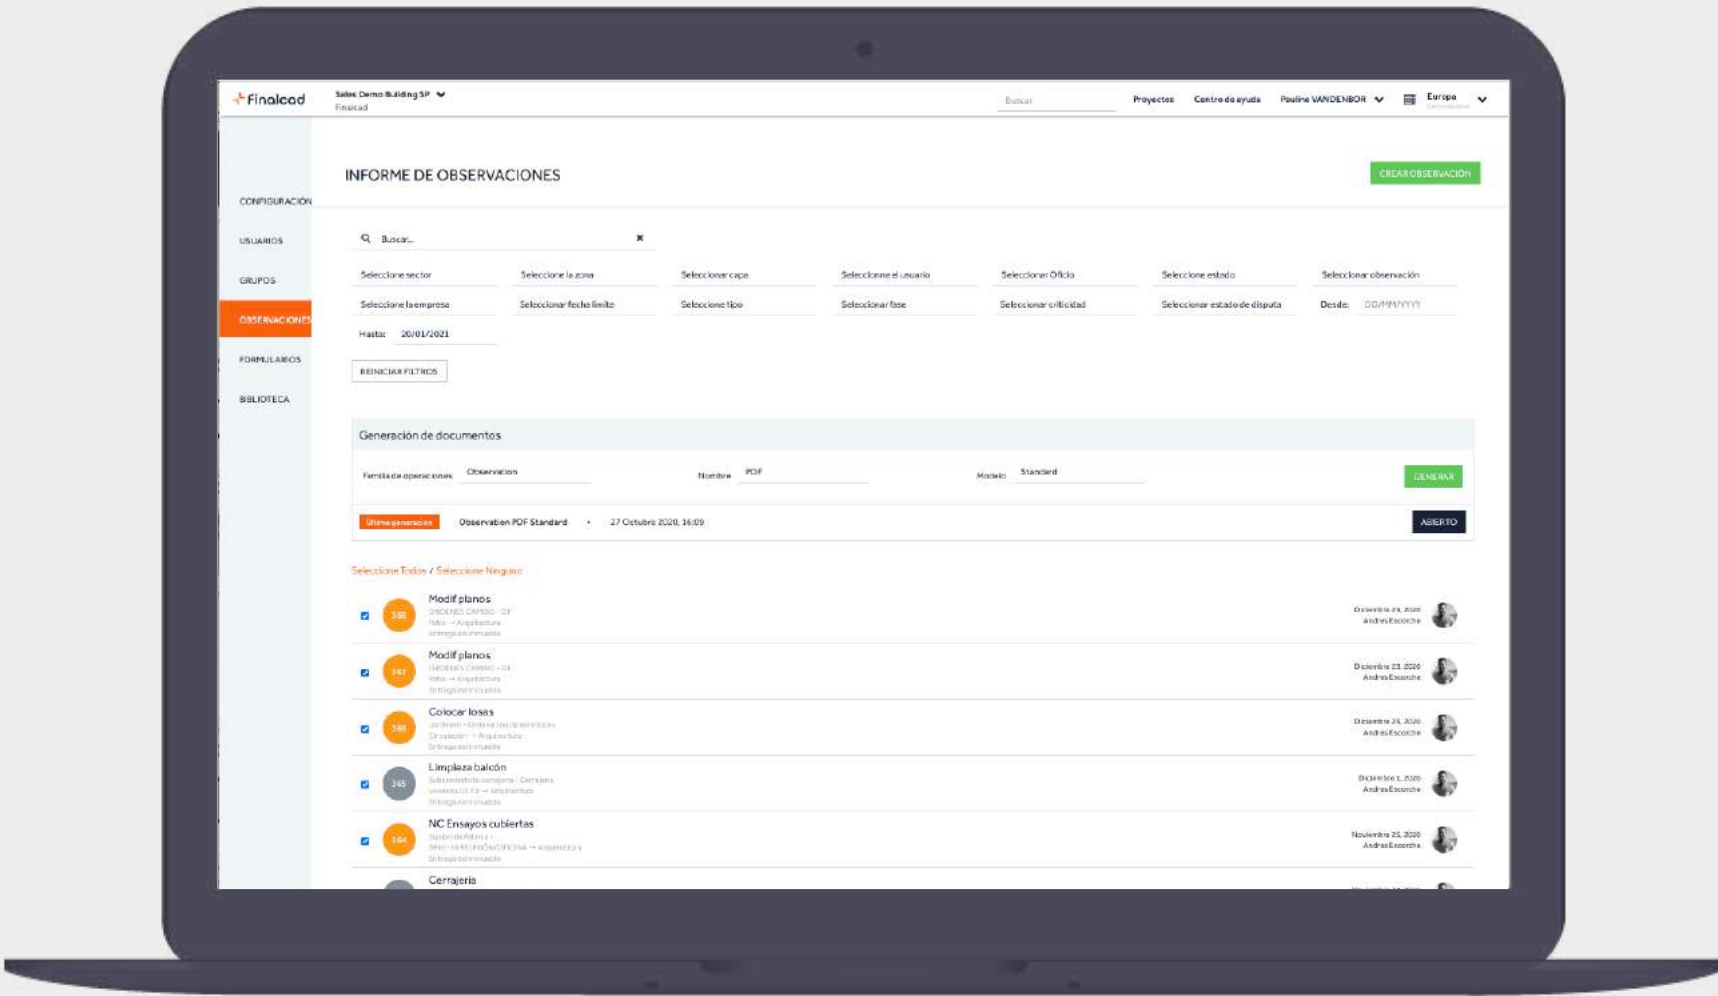


Informes automáticos por oficio


DF | CONTRATISTA

CONTEXTO CLIENTE

Gestión de repasos
Subcontratistas
DF/Propiedad



EDIFICACION



BENEFICIOS

Transparencia & colaboración
entre las partes implicadas
Anticipación en la entrega
Histórico de correcciones obra


-20%
de tiempo en
correcciones

-50%
en defectos
recurrentes

3. Mantenimiento y Garantía



Conformidad en la recepción y seguimiento en periodo de Garantía

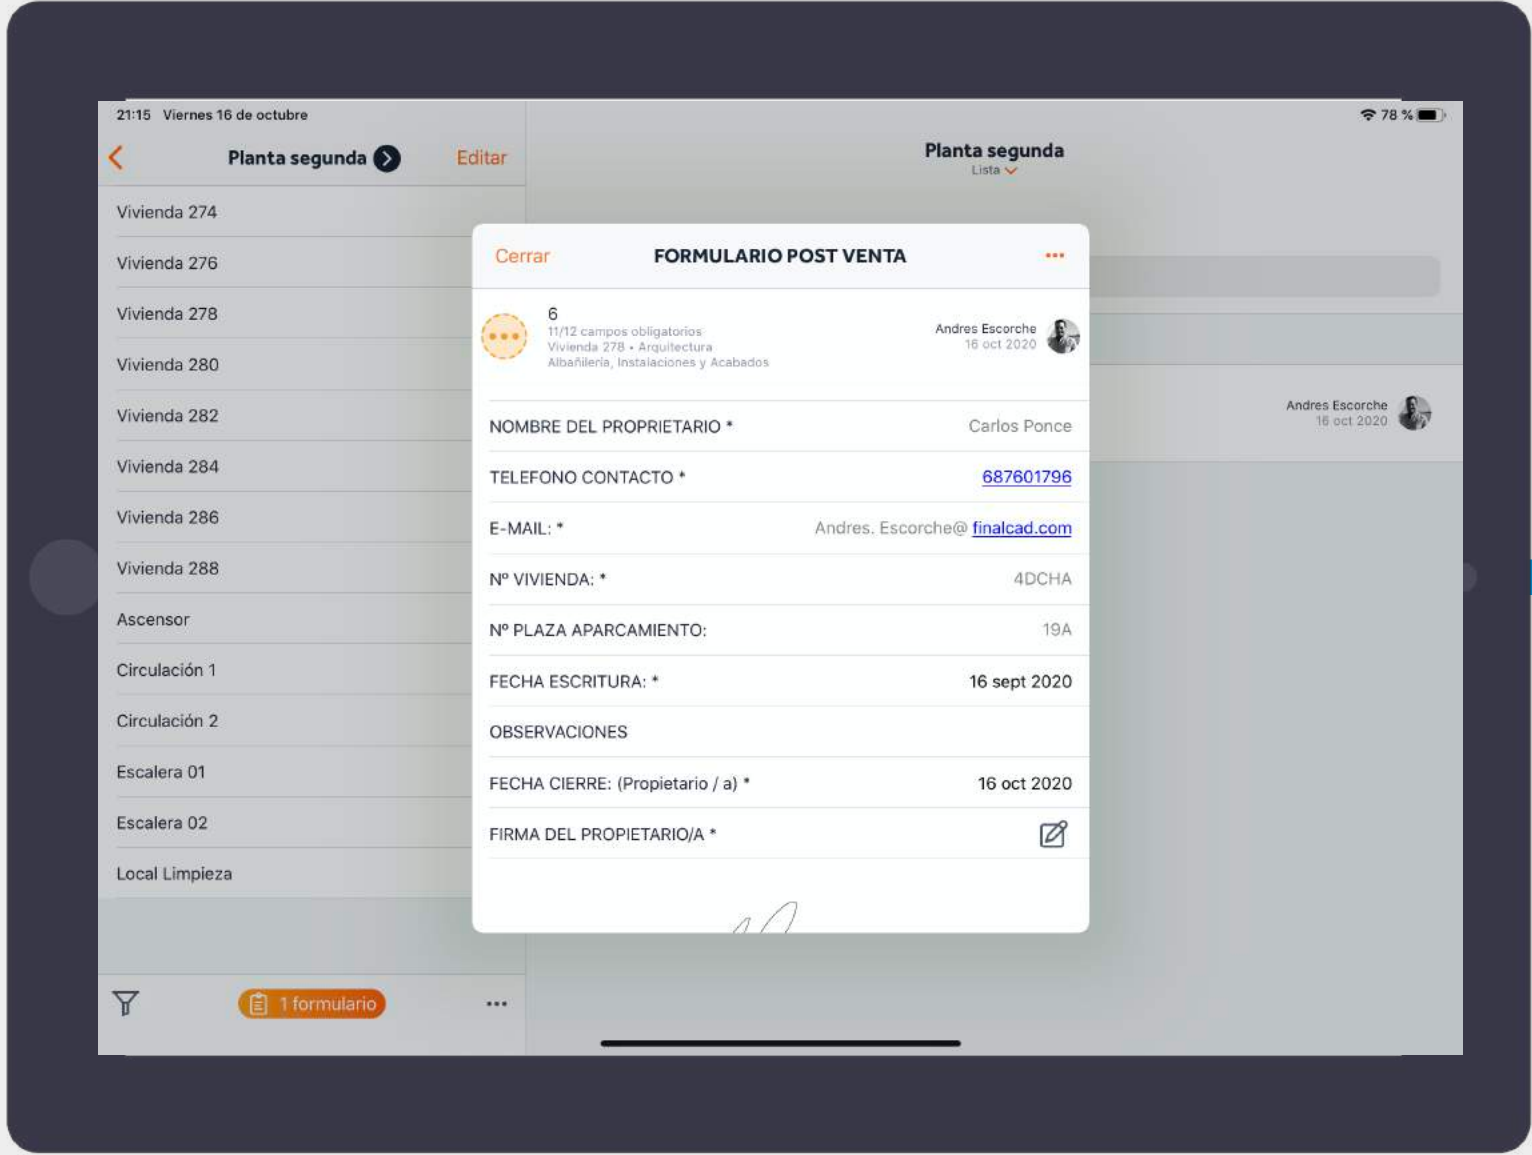

Técnico de Posventa

LOGO Sales Demo Building SP Finalcad

PARTES DE TRABAJO #10

CATEGORÍA: 15.PDT.00 - Parte de trabajo CONFORMIDAD: HECHO

INSPECTOR: Lea Dalton FECHA: 16/3/20

DATOS GENERALES

Promoción *	Promoción A
Residencial *	None
Domicilio *	Gran vía 4
Vivienda	
Portal	2
Planta	5
Letra	d
Propietario	Nombre usuario
Teléfono	000000000

CONFORMIDAD PROPIETARIO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS

Presencia propietario * SI

DNI * 11111112

Fecha * 13/3/20

Firma Propietario *

Conformidad * Confirma No conforme Irrelevante

Nota: La firma del responsable técnico verifica la revisión de los trabajos realizados en este documento según los requisitos y criterios de aceptación incluidos en el sistema de gestión interno de calidad de la organización.

CONFORMIDAD TÉCNICO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS

Fecha * 14/3/20

Firma del Técnico *

Conformidad * Confirma No conforme Irrelevante

FINALCAD_Sales Demo Building SP_Part de trabajo_03-16-2020_18-23-33-615.pdf 1 of 1

Informe recepción
Propietarios

PROPIEDAD | PROMOTOR

CONTEXTO CLIENTEE

Visa de recepción
Entrega a propietarios



EDIFICACION



BENEFICIOS

Acta de recepción en obra listo para imprimir

Respeto de formalidades contractuales

Firma electrónica

2h
ahorradas por vivienda

-20%
de defectos en GDO



Gracias



Replay del webinar de DEMO de Finalcad: acceder [aquí](#)

Resultados de una reciente encuesta que ha llevado Finalcad sobre la transformación digital en la construcción, en la que han participado empresas y responsables del sector en España. Subraya entre otros que este tema tiene aún más importancia después de una crisis como la del Covid-19

- Parte 1, Explorando la transformación digital en la construcción mundial, descargable [aquí](#)
- Parte 2, Un futuro digital para la construcción mundial, descargable [aquí](#)

« The Voice of our Users » Varios casos de uso en el mundo, Edificación & infraestructuras.

« Me ahorra dos horas al día en promedio. »

« El porcentaje de problemas frecuentes se ha reducido en un 60% o 50%. »

« Con una solución inteligente como Finalcad, podemos centralizar nuestros datos y compartirlos entre todos nuestros proyectos, luego obtenemos valor del análisis de big data. »

« Grupo Avintia digitaliza los procesos de obra con Finalcad » Promoción residencial.

« Nos ha permitido agregar valor en todo el ciclo de vida de la obra, a todos los implicados. »

« El tener la información en tiempo real ayuda a corregir las desviaciones y a tomar medidas en un menor periodo de tiempo. »

« En fase de posventa hemos reducido los plazos de una forma considerable. Finalcad permite generar y compartir informes de la situación de las incidencias en tiempo real. »

Articuló Testimonio Grup Heracles. Obra pública y Construcción.

“Anteriormente, los responsables tenían que recopilar cada mes todo el material almacenado en diferentes lugares y formatos, era muy tedioso y lento. Ahora todo está ordenado, lo que simplifica y acelera los controles de rendimiento, la gestión de reclamaciones, la respuesta con garantías a las inspecciones de seguridad, calidad y medio ambiente, etc.”

« Fayat Construction captura la experiencia de sus obras con Finalcad » Centro hospitalario (Subtítulos disponibles en español & inglés).

« Gracias a los archivos que recibimos, tras la sincronización de datos, sabemos quién y cuándo, ha dado su validación, prácticamente al instante. Todas las personas involucradas quedan también informadas. »

« En general, descubrimos la herramienta en fase de pre-recepción, luego nos dimos cuenta de que también podíamos haberle sacado mas provecho al inicio, para el seguimiento de la obra, el control de calidad y fichas de control. Entonces allí se encuentra el interés, cuando se pasa de un proyecto a otro. »

« Nos permite ahorrar tiempo, cada mes diría que un 25%. »

« JARNIAS mejora la satisfacción de sus clientes con Finalcad - Obra Panthéon Paris Rehabilitación de edificios históricos, trabajos en altura.

« Con el uso de Finalcad hemos observado un ahorro de tiempo, que se puede cuantificar: 2 horas para 2 o 3 personas, que no pasan tiempo rehaciendo informes, reprocesando imágenes. »

« Ganamos tiempo, somos más eficientes, y los clientes están más satisfechos porque proporcionamos informes de muy alta calidad »

« Realmente ayuda a mejorar la comunicación tanto dentro de nuestra empresa como con nuestros clientes ya que tenemos información en tiempo real sobre el progreso del proyecto y las no conformidades encontradas. »

« ETF optimiza el cambio de vías ferroviarias con Finalcad » Obra Ferroviaria.

« En esta obra hemos querido utilizar Finalcad porque necesitábamos que, desde el principio, la calidad con nuestro cliente sea óptima. »

« Utilizamos Finalcad en los cambios de turno, para cualquier gestión de los acabados, para que en dirección sepan en tiempo real todo lo se ha hecho en la obra, y también para señalar reservas, algo que resulta fundamental en el ámbito ferroviario, dado que no podrán producirse retrasos adicionales para hacer ajustes. »

« El poder editar y generar automáticamente informes de obra nos ahorra muchísimo tiempo. »

« De inmediato se aprecia que las aplicaciones Finalcad son fáciles de utilizar. »

« La ventaja de contar con una plataforma única como Finalcad, es que permite, de una obra a otra, por medio de nuestro análisis retrospectivo, disponer con base de datos, por obra, de fácil acceso, que podremos analizar en equipo, para evidentemente, mejorar en el largo plazo. »

"Eiffage Carreteras se digitaliza con FINALCAD" Obra civil y carreteras. (Subtítulos disponibles en español & inglés).

« Antes no existían muchas opciones para hacer controles, había que introducir las coordenadas de la obra y la dirección. Ahora con la geolocalización, ese proceso forma parte del pasado, y toda la información que introducíamos antes, ahora se introduce automáticamente. »

« Ahorramos tiempo, utilizamos mucho menos papel. »

« Tenemos la información enseguida y eso nos permite recuperarnos de inmediato. »

« Incluso los trabajadores más mayores la utilizan en las obras, la aplicación es simple y muy intuitiva. »

"La autopista Trans-Sumatera toma la vía de la digitalización con FINALCAD". Obra civil y carreteras. (Subtítulos disponibles en inglés).

« With FINALCAD, we can simplify the planning and controlling and how to take action based on that reporting. »

« This system will connect all three parties between general contractor, owner and consultant. »

« Data will be integrated across all stakeholders, hence all reports will be tracked. All data also can be more accountable because all parties are approving in real time. By using FINALCAD, our reporting can be faster and everyone can get the field test result from the field in real time. »

Changi General Hospital - Video 1: Control de la calidad durante la Fase estructural. Centro Hospitalario. (Subtítulos disponibles en inglés).

« This project has a total duration of 33 months. There is an existing building next to it, so we have to take care about the existing hospital, which is under operation. And of course we have to provide the quality within the related schedule »

« With pen and paper, it takes half of the day to make the report! Then Finalcad helps me so much. It's very easy to understand where is the position and to make the record »

« A big benefit for us is that we don't need to redo, we bring the tablet and check the quality onsite and operate the tablet, that's it. We don't have to go back to the office, we can provide the document on site immediately. »

Changi General Hospital - Video 2: Gestión colaborativa de los repasos en fase de recepción, con BIM. Centro Hospitalario. (Subtítulos disponibles en inglés).

« This has become an integral part of our documents, because it has all the information, photo, date and everything. »

« All the parties, such as client, consultant, subcontractors can share the information on time. »

« Our project used BIM, we believe that it was quite successful. »
